

RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.

Objeto do Contrato:

Nº CT Construtora: 007/2024

Construtora: A. SILVA LIMA LTDA

Número da medição: 1

Data da medição: 11/06/2024

Valor no período: R\$ 154.347,86

Período da medição: 02/04/2024 a 29/05/2024

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.

David Ramon Costa de Andrade

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
PORTARIA SEOP Nº 61/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL
JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.

88,01% executado.

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**
Fonte de Recurso: **15000100**
Nº CT Construtora: **007/2024**
Fiscal da obra (Substituto): **ENG. CIVIL DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE - CREA 041786767-0 R/N**
Respons. Técnico: **ENGº CIVIL EDUARDO AMORIM DA SILVA - CREA 20250 D AC**

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: **1ª**
Data da medição: **11/06/24**
Período da medição: **02/04/24 A 29/05/24**
Início da obra: **02/04/24**
Prazo Inicial da Obra: **2 MESES**
Prazo Reprogramado: **2 MESES**
Prazo Decorrido: **2 MESES**
Término da Obra: **02/08/2024**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.027,84	8.013,92	8.013,92	50,00%
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.920,46	-	-	0,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	1.551,18	1.551,18	1.551,18	100,00%
4	COLOCAÇÃO DE ANDAIMES	2.820,30	-	-	0,00%
5	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	9.037,91	8.595,11	8.595,11	95,10%
6	COBERTURA	138.276,80	134.450,00	134.450,00	97,23%
7	SERVIÇOS FINAIS	1.737,65	1.737,65	1.737,65	100,00%
TOTAL		175.372,14	154.347,86	154.347,86	88,01%

O valor da presente medição é:

(Cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

4 - Situação da obra

Execução física: **88,01%**
Situação do Cronograma Inicial: **REPROGRAMADO**
Valor contrato inicial: **175.372,14**
Valor adequado: **-**

Nível Técnico da Empresa
 0,00 a 4,99 5,00 a 6,99 7,00 a 8,99 9,00 a 10,00

Conceito da Empresa
 Ruim Razoável Boa Muito boa

Observações:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.

5 - Documentos anexos:

1 - Boletim de Medição;
2 - Memória de Cálculo;
3 - Planta iluminada;

5 - Relatório Fotográfico;
6 - Avaliação;
7 - Gráfico - Previsto x Realizado.

4 - Resumo do Cronograma;

David Ramon Costa de Andrade
DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
PORTARIA SEOP Nº 61/2024

Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**
 Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
 Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**
 Fonte: **15000100**
 Nº Contrato: **007/2024**
 Fiscal: **ENG. CIVIL DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE - CREA 041786767-0 R/N**
 R.Técnico: **ENGº CIVIL EDUARDO AMORIM DA SILVA - CREA 20250 D AC**

Data-base Orçamento: **09/2023**
 Data da Medição: **11/06/2024**
 Período da Medição: **02/04/2024 A 29/05/2024**
 Prazo Inicial Obra: **2 MESES**
 Início da Obra: **02/04/2024**
 Término da Obra: **02/08/2024**
 Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO				
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%		
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	136,64	8.744,96	32,00	4.372,48	32,00	4.372,48	50,00%	32,00	4.372,00	50,00%		
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	41,38	7.282,88	88,00	3.641,44	88,00	3.641,44	50,00%	88,00	3.641,00	50,00%		
2,0	TAXAS E EMOLUMENTOS														
2.1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) Nº 1.096/16	UND	1,00	194,37	194,37			-	-		1,00	194,00	100,00%		
2.2	PCMSO, PGR e LTCAT ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART.	MÊS	1,00	4.580,87	4.580,87			-	-		1,00	4.580,00	100,00%		
2.3	Elaboração do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART.	MÊS	1,00	1.145,22	1.145,22			-	-		1,00	1.145,00	100,00%		
3,0	CANTEIRO DE OBRAS														
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	258,53	1.551,18	6,00	1.551,18	6,00	1.551,18	100,00%	-	-			
4,0	COLOCAÇÃO DE ANDAIMES														
4.1	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m²	90,00	6,94	624,60			-	-		90,00	624,00	100,00%		
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	48,00	20,17	968,16			-	-		48,00	968,00	100,00%		
4.3	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	2,00	613,77	1.227,54			-	-		2,00	1.227,00	100,00%		
5,0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS														
5.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.449,30	3,69	9.037,91	2.329,30	8.595,11	2.329,30	8.595,11	95,10%	120,00	442,00	4,90%		
6,0	COBERTURA														
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.329,30	55,70	129.742,01	2.329,30	129.742,01	2.329,30	129.742,01	100,00%	-	-			
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	120,00	31,89	3.826,80			-	-		120,00	3.826,00	100,00%		
6.3	CUMEIRA EM ZINCO, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM	M	189,00	24,91	4.707,99	189,00	4.707,99	189,00	4.707,99	100,00%	-	-			
7,0	SERVIÇOS FINAIS														
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF: SINAPI ANTIGO 9537)	m²	465,86	3,73	1.737,65	465,86	1.737,65	465,86	1.737,65	100,00%	-	-			
TOTAL SIMPLES					175.372,14			88,01%	154.347,86		154.347,86	88,01%		21.024,28	11,99%
TOTAL ACUMULADO								88,01%	154.347,86						
SALDO								11,99%	21.024,28						

O Valor da presente medição é:
(Cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

David Ramon Costa de Andrade
DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
 PORTARIA SEOP Nº 61/2024

Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**
 Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
 Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**

Nº CT Construtora: **007/2024**
 Fiscal da obra: **ENG. CIVIL DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE - CREA 041786767-0 R/N**
 Respons. Técnico: **ENGº CIVIL EDUARDO AMORIM DA SILVA - CREA 20250 D AC**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Quant.	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
					COE1	COE2	COMP.	LARG.	ALT.					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00			4,00	8,00			32,00		ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA	32,00	32,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00			4,00	22,00			88,00		ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA	88,00	88,00
3	CANTEIRO DE OBRAS													
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00					3,00	2,00	6,00		PLACA DA OBRA	6,00	6,00
5	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS													
5.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.329,30							2.329,30		DE ACORDO COM PROJETO	2.329,30	2.329,30
6	COBERTURA													
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.329,30							2.329,30		DE ACORDO COM PROJETO	2.329,30	2.329,30
6.3	CUMEEIRA EM ZINCO, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM	M	189,00				189,00			189,00		DE ACORDO COM PROJETO	189,00	189,00
7	SERVIÇOS FINAIS													
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF: SINAPI ANTIGO 9537)	m²	465,86					22,20	20,98	465,86		LIMPEZA DE OBRA	465,86	465,86

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO
 COE1: COEFICIENTE
 COE2: COEFICIENTE
 DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO
 LARG: LARGURA OU DIÂMETRO
 ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESURA

Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024




DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
 PORTARIA SEOP Nº 61/2024

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**

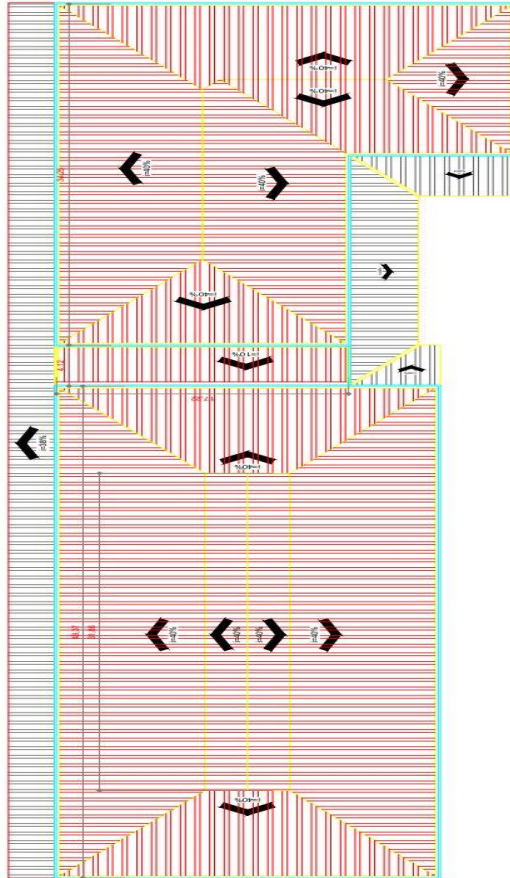

SERVIÇOS EXECUTADOS: ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, COBERTURA E SERVIÇOS FINAIS

Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024

David Ramon Costa de Andrade
DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
PORTARIA SEOP Nº 61/2024

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**
 Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
 Construtora: **CONSÓRCIO RM E BOMFIM**

02/04/2024
02/08/2024
EXECUÇÃO VIGENTE

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO				TOTAL ACUMULADO		SALDO	
		VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS				%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.027,84	9,14%	7.924,16	49,44%	8.103,68	50,56%	4,57%	8.013,92	4,57%	8.013,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.920,46	3,38%	5.920,46	100,00%			0,00%	-	3,38%	5.920,46
3	CLIMATIZAÇÃO	1.551,18	0,88%	1.551,18	100,00%			0,88%	1.551,18	0,00%	-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.820,30	1,61%	1.410,15	50,00%	1.410,15	50,00%	0,00%	-	1,61%	2.820,30
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.037,91	5,15%	9.037,91	100,00%			4,90%	8.595,11	0,25%	442,80
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	138.276,80	78,85%	69.138,40	50,00%	69.138,40	50,00%	76,67%	134.450,00	2,18%	3.826,80
7	SISTEMA DE CHAMADA ENFERMAGEM	1.737,65	0,99%			1.737,65	100,00%	0,99%	1.737,65	0,00%	-
TOTAL NO PERÍODO				94.982,26	54,16%	80.389,88	45,84%	88,01%	154.347,86	11,99%	21.024,28
TOTAL ACUMULADO		175.372,14	100,00%	94.982,26	54,16%	175.372,14	100,00%				

Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024

David Ramon Costa de Andrade
DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
 PORTARIA SEOP Nº 61/2024

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 1

FACHADA DA OBRA

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 2

FOTO DA COBERTURA ANTIGA

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo

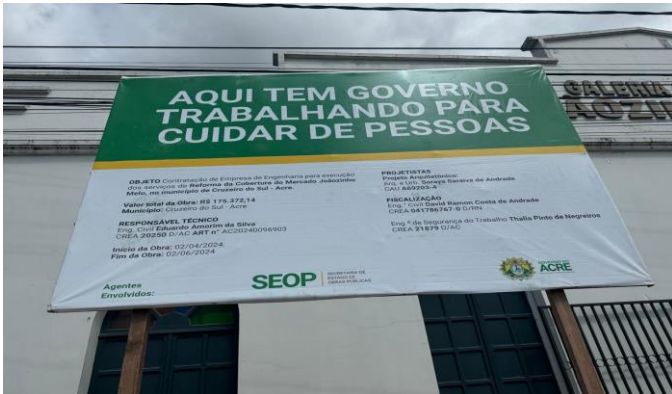


Imagem 3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 4

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 5

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 6

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**



Imagem 7
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 8
LIMPEZA DAS CALHAS

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 9
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 10
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Local: Mercado Municipal Joãozinho Melo



Imagem 11
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

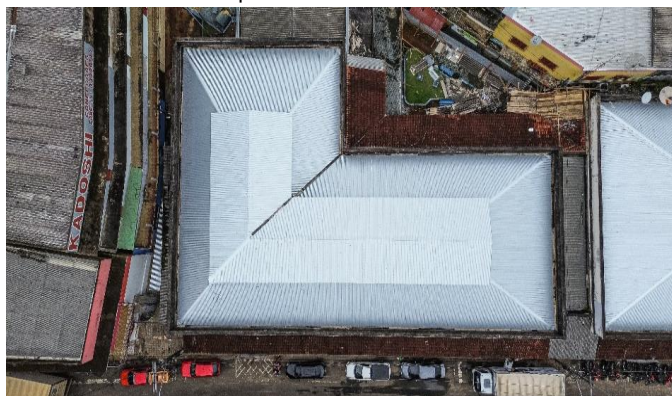


Imagem 12
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ANEXO 6 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Segurança	Admin. Obra	Nota
1ª Medição	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,29
2ª Medição								
3ª Medição								
4ª Medição								
5ª Medição								
6ª Medição								
7ª Medição								
8ª Medição								
9ª Medição								
10ª Medição								
11ª Medição								
12ª Medição								
13ª Medição								
14ª Medição								
15ª Medição								
16ª Medição								
17ª Medição								
18ª Medição								
19ª Medição								
20ª Medição								
21ª Medição								
22ª Medição								
23ª Medição								
24ª Medição								
25ª Medição								
26ª Medição								
							Média Final:	9,29
							Conceito:	Muito boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	2	1	0
2.0 Atendimento a fiscalização	2	1	0
3.0 Qualidade dos serviços	2	1	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	2	1	0
5.0 Equipe técnica	2	1	0
6.0 Segurança do trabalho	2	1	0
7.0 Administração e instalação da obra	2	1	0

Conceito	
Ruim - 0,00 a 4,99	Boa - 7,00 a 8,99
Razoável - 5,00 a 6,99	Muito Boa - 9,00 a 10,00

David Ramon Costa de Andrade

DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
PORTARIA SEOP Nº 61/2024


Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024

ANEXO 7 - AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL JOÃOZINHO MELO, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL - ACRE.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **A. SILVA LIMA LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado

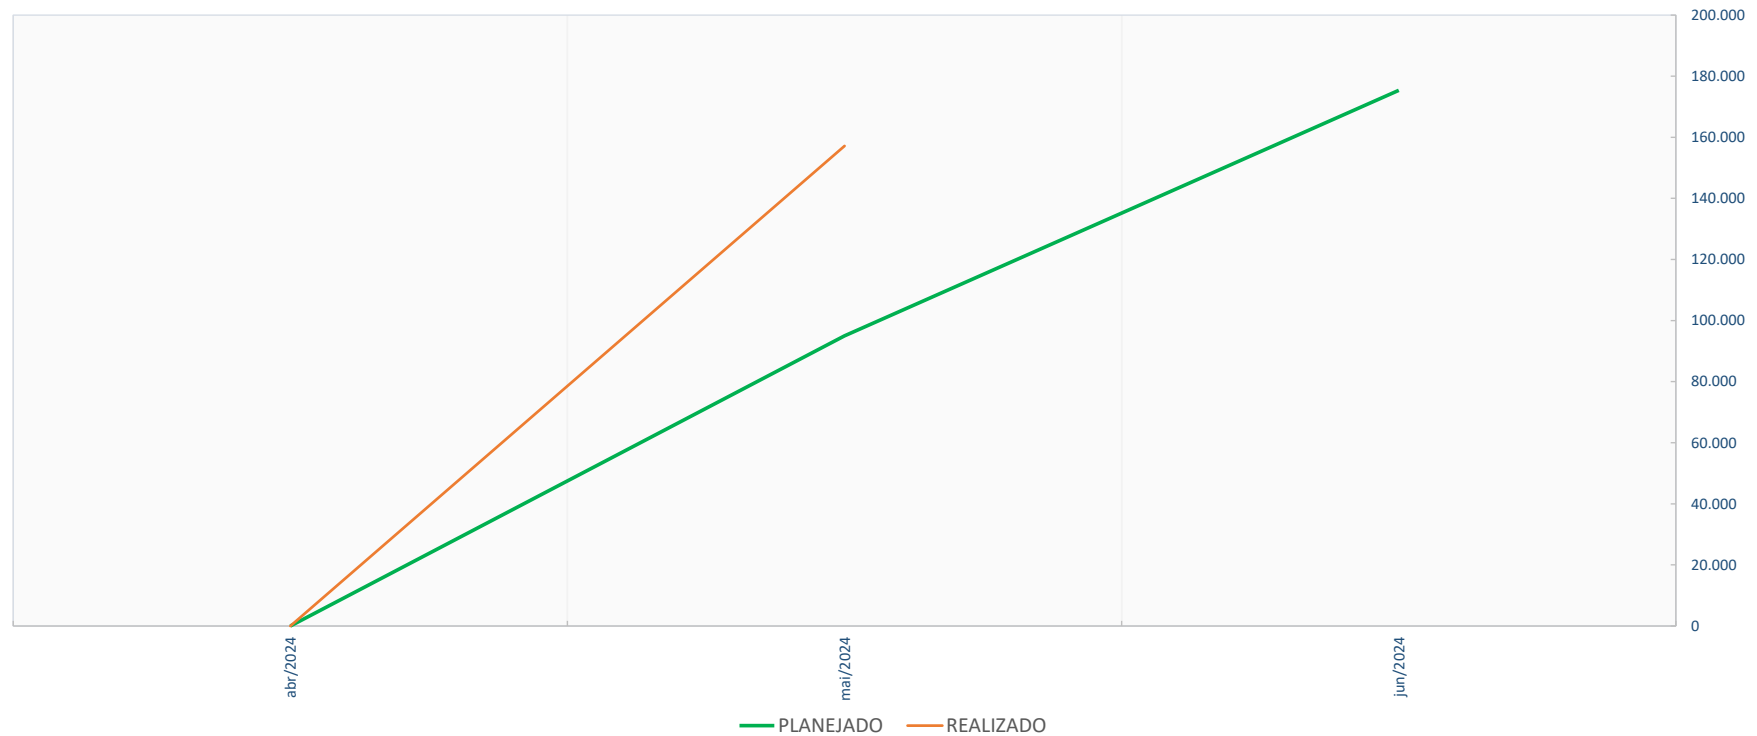

Rio Branco - Acre, 11 de junho de 2024

David Ramon Costa de Andrade
DAVID RAMON COSTA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041786767-0 R/N
PORTARIA SEOP Nº 61/2024
