



# ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

## RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

**Objeto do Contrato:** Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC

**Nº CT Construtora:** 050/2025

**Construtora:** JURUÁ CONSTRUTORA LTDA

**Número da medição:** 1

**Data da medição:** 12/12/2025

**Valor no período:** R\$ 33.716,49

**Período da medição:** 20/08/2025 a 05/12/2025

### PARECER:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.

-  
-

Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC

Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC

10,76% executado.



**ESTADO DO ACRE**  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP  
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

**1 - Dados do Contrato**

Objeto do Contrato: Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC  
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  
Construtora: JURUÁ CONSTRUTORA LTDA  
Fontes de Recurso: 100  
Nº CT Construtora: 050/2025  
Fiscal da obra: Eng.ª Civil Raissa Raiele Santos da Silva, CREA 21675 D/AC, Matrícula 9551450; Eng.ª de Segurança no Trabalho: Thalia Pinto de Negreiros, CREA 21879-D/AC, Matrícula 9661220-1.  
Respons. Técnico: Engenheiro Civil Boanerges da Silva Mesquita - CREA 1587 D/AC - ART AC20250121481

**2 - Temporalidade da Medição**

Número da medição: 1ª  
Data da medição: 12/12/25  
Período da medição: 20/08/25 A 05/12/25  
Início da obra: 20/08/25  
Prazo Inicial da Obra: 2 MESES  
Prazo Reprogramado: 4 MESES  
Prazo Decorrido: 4 MESES  
Término da Obra: 20/12/2025  
Situação da Obra: EXECUÇÃO VIGENTE

**3 - Resumo da Medição**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA	13.175,00	1.152,81	1.152,81	8,8%
2	SERVIÇOS INICIAIS	22.237,15	12.549,95	12.549,95	56,4%
3	ESQUADRIAS METÁLICAS	277.485,73	20.013,73	20.013,73	7,2%
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	577,89	-	-	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>313.475,77</b>	<b>33.716,49</b>	<b>33.716,49</b>	<b>10,76%</b>

O valor da presente medição é:  
TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

**4 - Situação da obra**

Execução física: <b>10,76%</b>	Valor contrato inicial: <b>249.504,99</b>
Situação do Cronograma Inicial: <b>REPROGRAMADO</b>	Valor adequado: <b>313.475,77</b>
<b>Nível Técnico da Empresa</b>	
<input type="checkbox"/> 0,00 a 4,99 <input type="checkbox"/> 5,00 a 6,99 <input checked="" type="checkbox"/> 7,00 a 8,99 <input type="checkbox"/> 9,00 a 10,00	
<b>Conceito da Empresa</b>	
<input type="checkbox"/> Ruim <input type="checkbox"/> Razoável <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Muito boa	
<b>Observações:</b> Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.	

**5 - Documentos anexos:**

- 1 - Boletim de Medição;
- 2 - Memória de Cálculo;
- 3 - Resumo do Cronograma;
- 4 - Relatório Fotográfico;
- 5 - Justificativa de atraso;
- 6 - Gráfico - Previsto x Realizado.
- 8 - Planta Iluminada.

  
Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC

Rio Branco - Acre, 12 de dezembro de 2025

**ESTADO DO ACRE**

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora: JURUÁ CONSTRUTORA LTDA

Fonte: 100

Nº Contrato: 050/2025

Fiscal: Eng.ª Civil Raissa Raiele Santos da Silva, CREA 21675 D/AC, Matrícula 9551450; Eng.ª de Segurança no Trabalho: Thalia Pinto de Negreiros, CREA 21879-D/AC, Matrícula 9661220-1.

R.Técnico: Engenheiro Civil Boanerges da Silva Mesquita - CREA 1587 D/AC - ART AC20250121481

Data-base Orçamento: 11/2024

Data da Medição: 12/12/2025

Período da Medição: 20/08/2025 A 05/12/2025

Prazo Inicial Obra: 2 MESES

Início da Obra: 20/08/2025

Término da Obra: 20/12/2025

Situação da Obra: EXECUÇÃO VIGENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA</b>												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	131,75	13.175,00	8,75	1.152,81	8,75	1.152,81	8,75%	91,25	12.022,19	91,25%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>												
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	6,00	380,80	2.284,80			-	-		6,00	2.284,80	100,00%
2.2	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)	UND	1,00	1.758,09	1.758,09	1,00	1.758,09	1,00	1.758,09	100,00%	-	-	
2.3	LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO)	UND	1,00	1.440,82	1.440,82	1,00	1.440,82	1,00	1.440,82	100,00%	-	-	
2.4	PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL)	UND	1,00	1.759,23	1.759,23	1,00	1.759,23	1,00	1.759,23	100,00%	-	-	
2.5	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) Nº 1.096/16	UND	1,00	189,41	189,41	1,00	189,41	1,00	189,41	100,00%	-	-	
2.6	REFERÊNCIA - SINAPI (73618 - 10/2017) - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	557,20	26,57	14.804,80	278,60	7.402,40	278,60	7.402,40	50,00%	278,60	7.402,40	50,00%
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>												
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE CHAPA METALICA GALVANIZADA Nº 18, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	557,20	407,14	226.858,40			-	-		557,20	226.858,40	100,00%
3.2	EXECUÇÃO DE CANTONEIRA ABAS IGUAIS L=25,4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 120204_10/2025	M	1.727,32	25,65	44.307,46	648,83	16.643,13	648,83	16.643,13		1.078,49	27.664,33	62,44%
3.3	METALON 20X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 111301_10/2025	M	180,00	35,11	6.319,87	96,00	3.370,60	96,00	3.370,60		84,00	2.949,27	46,67%
<b>4</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>												
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	238,80	2,42	577,89			-	-		238,80	577,89	100,00%
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>313.475,77</b>		<b>33.716,49</b>		<b>33.716,49</b>	<b>10,76%</b>	<b>279.759,28</b>	<b>89,24%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>								<b>10,76%</b>	<b>33.716,49</b>				
<b>SALDO</b>								<b>89,24%</b>	<b>279.759,28</b>				

O Valor da presente medição é:

TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 12 de dezembro de 2025

Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil - CREA 21675 D/AC



**ESTADO DO ACRE**  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP  
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC  
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  
 Construtora: JURUÁ CONSTRUTORA LTDA

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA/ VOLUME	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE <sub>1</sub>	COE <sub>2</sub>	COMP.	LARG.	ALT.					
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA</b>												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00		8,75						TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO	8,75	8,75
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>												
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00										
2.2	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)	UND	1,00		1,00						PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
2.3	LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO)	UND	1,00		1,00						PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
2.4	PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL)	UND	1,00		1,00						PROGRAMAS DE SEGURANÇA	1,00	1,00
2.5	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) N° 1.096/16	UND	1,00		1,00						ART DE EXECUÇÃO	1,00	1,00
2.6	REFERÊNCIA - SINAPI (73618 - 10/2017) - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	557,20	557,20	0,50				278,60		EXECUÇÃO DAS LATERAIS - 50% DO SERVIÇO	278,60	278,60
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>												
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE CHAPA METALICA GALVANIZADA N° 18, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	557,20								TOTAL PREVISTO PARA FINALIZAÇÃO DE 1M² DE BRISE		
3.2	EXECUÇÃO DE CANTONEIRA ABAS IGUAIS L=25,4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 120204_10/2025	M	1.727,32	7,20	209,30				1.506,96		DESCONTO - TOTAL PREVISTO NA COMPOSIÇÃO DO ITEM 3.1	648,83	648,83
				-4,10	209,30				-858,13		COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS BRISES		
									SOMA= 648,83		TOTAL PREVISTO PARA A LATERAL ESQUERDA E DIREITA		
3.3	METALON 20X30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 111301_10/2025	M	180,00		16,00	6,00			96,00			96,00	96,00
<b>4</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>												
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	238,80										

**LEGENDA:**

REP: REPETIÇÃO  
 COE1: COEFICIENTE  
 COE2: COEFICIENTE  
 DESC.: DESCONTO  
 COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO  
 LARG: LARGURA OU DIÂMETRO  
 ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

Rio Branco - Acre, 12 de dezembro de 2025

Raissa Raielo Santos da Silva  
 Fiscal de Obras - SEOP  
 Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC



**ESTADO DO ACRE**  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC**  
Contratante: **Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP**  
Nº Contrato: **050/2025**  
Construtora: **JURUÁ CONSTRUTORA LTDA**

Início: 20/08/2025  
Término: 20/12/2025

**ANEXO 3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	ACUM. ATÉ OUTUBRO		VALOR A EXECUTAR		PERÍODO				
							nov/2025		dez/2025		
1	ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA	13.175,00		0,00%	13.175,00	100,00%	4.223,91	32,06%	8.951,10	67,94%	
2	SERVIÇOS INICIAIS	22.237,15		0,00%	22.237,15	100,00%	17.789,72	80,00%	4.447,43	20,00%	
3	ESQUADRIAS METÁLICAS	277.485,73		0,00%	277.485,73	100,00%	83.245,72	30,00%	194.240,01	70,00%	
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	577,89		0,00%	577,89	100,00%			577,89	100,00%	
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>							<b>105.259,35</b>	33,58%	<b>208.216,43</b>	66,42%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>313.475,77</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>313.475,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.259,35</b>	33,58%	<b>313.475,77</b>	100,00%

**Rio Branco - Acre, 7 de novembro de 2025**  
NTE E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil - CREA 21675 D/AC



# ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

## ANEXO 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC

Objeto do Contrato: **Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **JURUÁ CONSTRUTORA LTDA**

Local: Área externa



Imagem 1

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 2

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 3

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 4

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 5

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 6

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE



# ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

## ANEXO 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC

Objeto do Contrato: **Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **JURUÁ CONSTRUTORA LTDA**

Local: Área externa



Imagem 7

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 8

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa

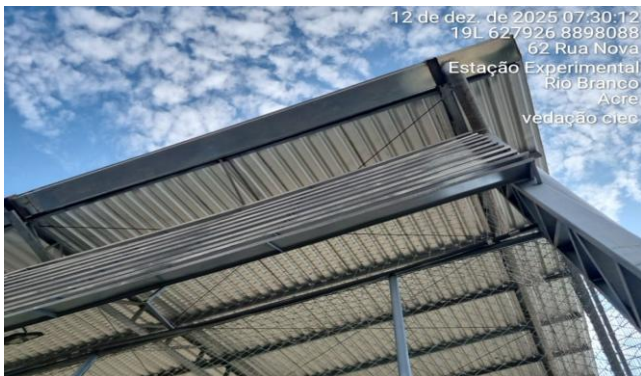


Imagem 9

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 10

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 11

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 12

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE



# ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

## ANEXO 4 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC

Objeto do Contrato: **Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **JURUÁ CONSTRUTORA LTDA**

Local: Área externa



Imagem 13

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 14

EXECUÇÃO DOS BRISES - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 15

PLACA DA OBRA - SEM CHAPA METÁLICA - EM NÃO CONFORMIDADE

Local: Área externa



Imagem 16

ESPESSURA DA CHAPA MENOR QUE DE COMPOSIÇÃO

Local: Área externa



Imagem 17

ESPESSURA DA CHAPA MENOR QUE DE COMPOSIÇÃO



## ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - JUSTIFICATIVA DE ATRASO

### 1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **JURUÁ CONSTRUTORA LTDA**

Fonte de Recurso: **100**

Nº CT Construtora: **050/2025**

Fiscal da obra: **Eng.ª Civil Raissa Raiele Santos da Silva, CREA 21675 D/AC, Matrícula 9551450; Eng.ª de Segurança no Trabalho: Thalia Pinto de Negreiros, CREA 21879-D/AC, Matrícula 9661220-1.**

Respons. Técnico: **Engenheiro Civil Boanerges da Silva Mesquita - CREA 1587 D/AC - ART AC20250121481**

### 2 - Justificativa para atraso de obra

*Devido a ausência de serviços na planilha orçamentária para execução do brise conforme projeto arquitetônico, foi gerado o 1º aditivo de valor da obra. Durante o período de aprovação do aditivo, a obra não avançou conforme cronograma físico financeiro previsto, gerando atrasos.*

*A empresa executou os brises laterais, porém apresentam inconformidade de especificação da espessura da chapa. Logo, a empresa será notificada, a fim de que seja realizada a substituição da chapa.*

### 3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

*Deverá ser realizado prorrogação de prazo do contrato.*

### 4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

*A empresa deverá ser notificada, caso não avance em serviços passíveis de serem liquidados e pelos serviços executados em não conformidade.*


**Raissa Raiele Santos da Silva**  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC



**ESTADO DO ACRE**  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP  
AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC**  
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**  
Construtora: **JURUÁ CONSTRUTORA LTDA**

**Acumulado Planejado x Acumulado Realizado**

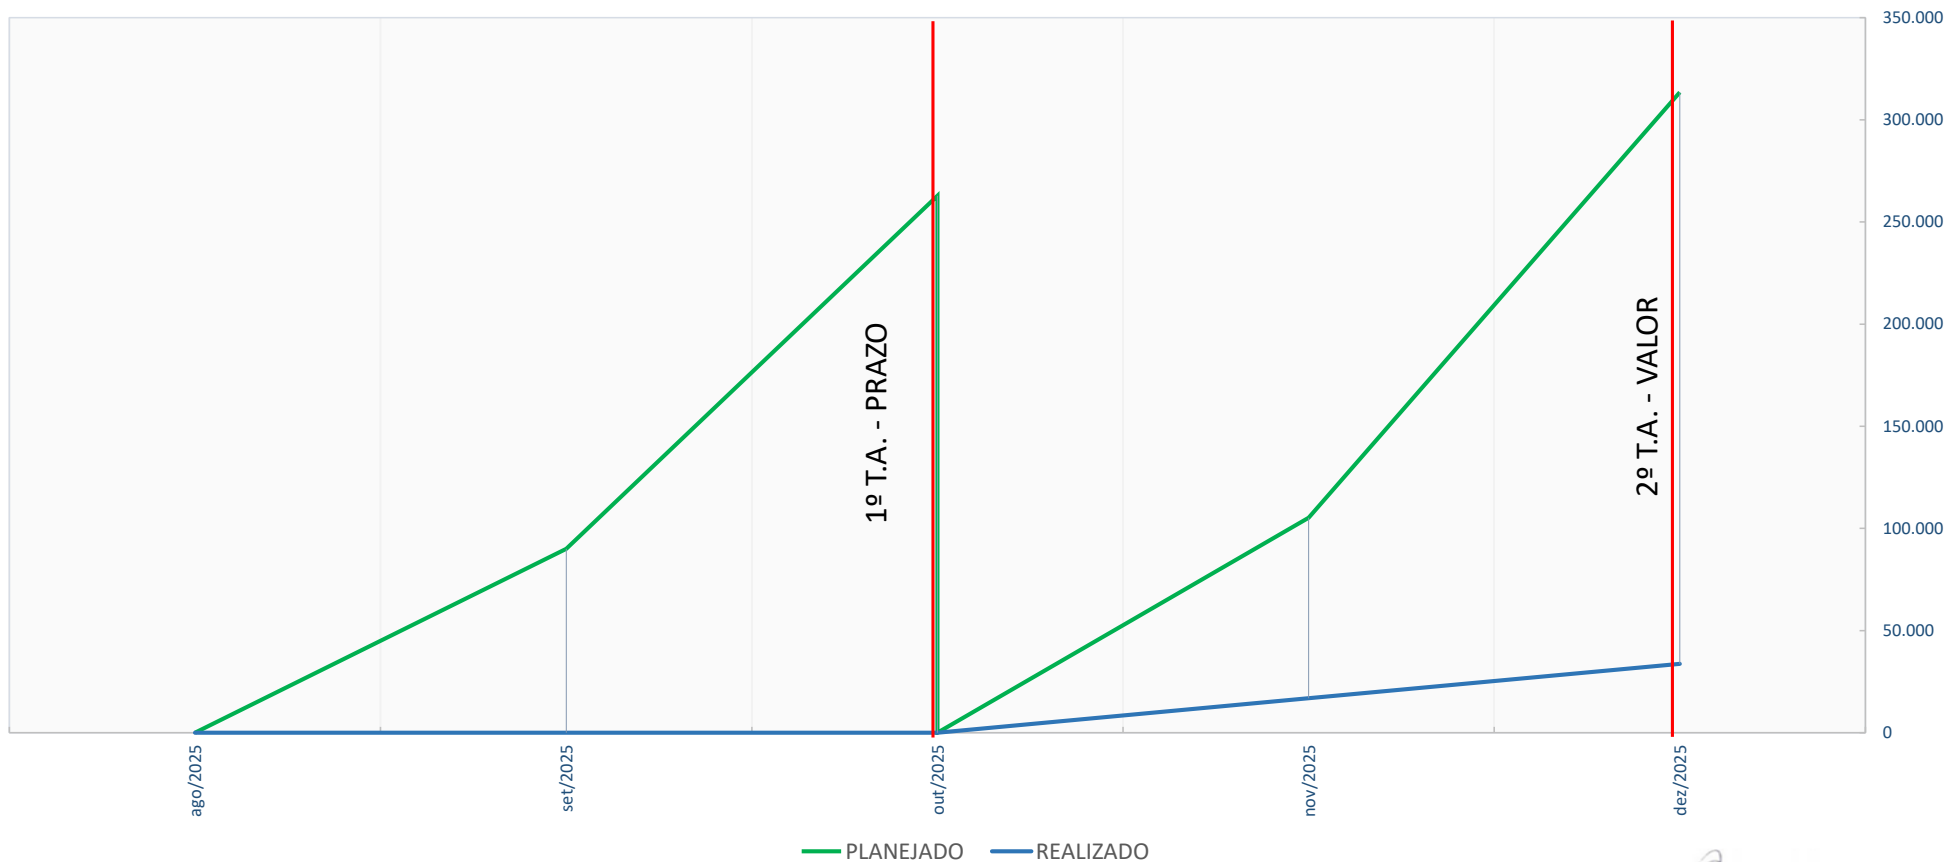

**Raissa Raiele Santos da Silva**  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil – CREA 21675 D/AC




# ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 7 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: Execução de empresa de engenharia para execução dos serviços de Vedação lateral da quadra coberta do Centro Integrado e Esporte e Lazer - CIEC, no município de Rio Branco-AC


Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP  
Construtora: JURUÁ CONSTRUTORA LTDA

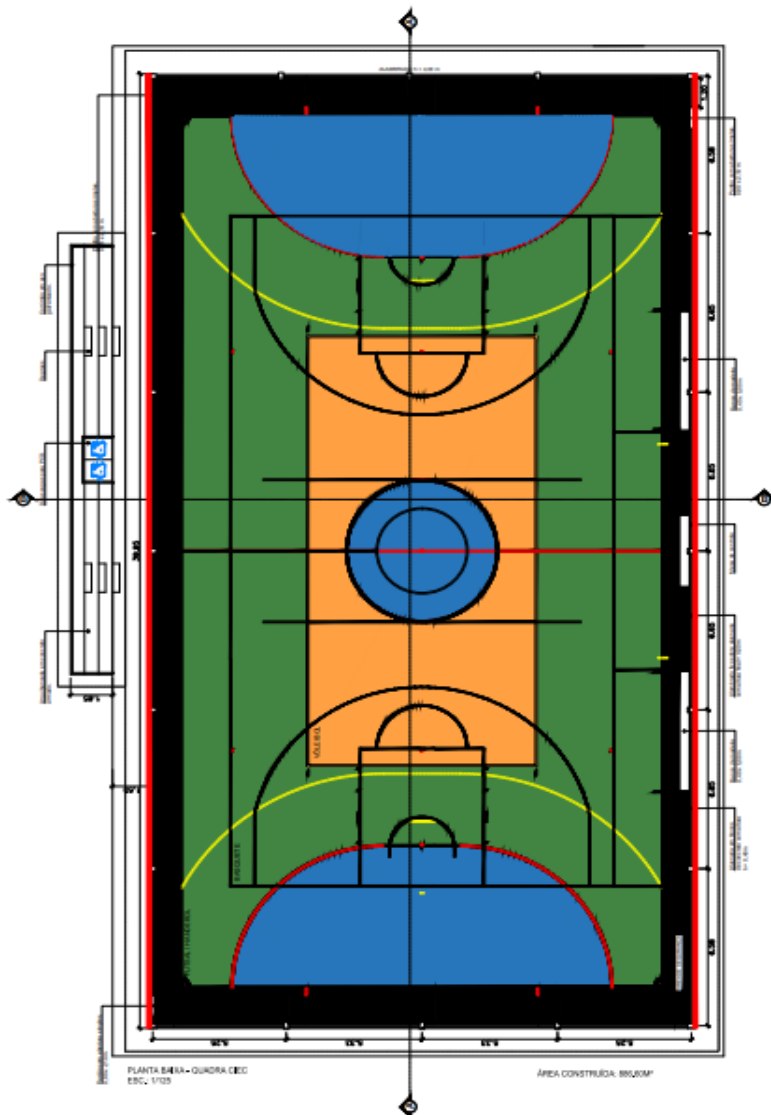

 Trecho executado de brise - 1ª medição

\*\*\*EM NÃO CONFORMIDADE

Rio Branco - Acre, 12 de dezembro de 2025

  
Raissa Raiele Santos da Silva  
Fiscal de Obras - SEOP  
Engenheira Civil - CREA 21675 D/AC
