



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.
Nº CT Construtora: 051/2022
Construtora: COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Número da medição: 1
Data da medição: 15/12/2022
Valor no período: R\$ 185.287,58
Período da medição: 20/09/2022 a 17/10/2022

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.

ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.

39,70% executado.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**
Fonte de Recurso: **100**
Nº CT Construtora: **051/2022**
Fiscal da obra: **ELISSON SILVA ALMEIDA - CREA 5069243559 D/SP**
Respons. Técnico: **FRANCISCO THIAGO ROCHA DE SOUZA ENGº. CIVIL CREA 24454 - AC**

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: **1ª**
Data da medição: **15/12/22**
Período da medição: **20/09/22 A 17/10/22**
Início da obra: **12/07/22**
Prazo Inicial da Obra: **4 MESES**
Prazo Reprogramado: **4 MESES**
Prazo Decorrido: **5 MESES**
Término da Obra: **12/03/2023**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

3 - Resumo da Medição

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | CONTRATADO | NO PERÍODO | ACUMULADO | % |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA | 159.023,67 | 77.520,74 | 77.520,74 | 48,7% |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO | 263.181,11 | 89.228,04 | 89.228,04 | 33,9% |
| 3 | Administração e Gerenciamento da Obra | 44.551,53 | 18.538,80 | 18.538,80 | 41,6% |
| TOTAL | | 466.756,32 | 185.287,58 | 185.287,58 | 39,70% |

O valor da presente medição é:
(Cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

4 - Situação da obra

Em execução

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Execução física: | 39,70% | Valor contrato inicial: | 466.756,32 |
| Situação do Cronograma Inicial: | REPROGRAMADO | Valor adequado: | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Nível Técnico da Empresa | | | | Conceito da Empresa | | | |
| <input type="checkbox"/> 0,00 a 4,99 | <input type="checkbox"/> 5,00 a 6,99 | <input type="checkbox"/> 7,00 a 8,99 | <input checked="" type="checkbox"/> 9,00 a 10,00 | <input type="checkbox"/> Ruim | <input type="checkbox"/> Razoável | <input type="checkbox"/> Boa | <input checked="" type="checkbox"/> Muito boa |

Observações:
Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.

5 - Documentos anexos:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 - Boletim de Medição; | 6 - Relatório Fotográfico; |
| 2 - Memória de Cálculo; | 7 - Mapa de Precipitação; |
| 3 - Planta iluminada; | 8 - Avaliação; |
| 4 - Resumo do Cronograma; | 9 - Justificativa de atraso. |
| 5 - Gráfico - Previsto x Realizado. | |

Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022


ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022

**ESTADO DO ACRE**

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**Fonte: **100**Nº Contrato: **051/2022**Fiscal: **ELISSON SILVA ALMEIDA - CREA 5069243559 D/SP**R.Técnico: **FRANCISCO THIAGO ROCHA DE SOUZA ENGº. CIVIL CREA 24454 - AC**Data-base Orçamento: **03/2022**Data da Medição: **15/12/2022**Período da Medição: **20/09/2022** A **17/10/2022**Prazo Inicial Obra: **4 MESES**Início da Obra: **12/07/2022**Término da Obra: **12/03/2023**Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATADO | | | 1ª MEDIÇÃO | | ACUMULADO | | | SALDO | | | |
|------------------------|--|-------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | QUANT. | PREÇO | TOTAL | QUANT. | VALOR | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | % | |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado 2x2,25m | m² | 4,50 | 399,60 | 1.798,20 | 4,50 | 1.798,20 | 4,50 | 1.798,20 | 100,00% | - | - | | |
| 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 60,00 | 0,41 | 24,60 | 60,00 | 24,60 | 60,00 | 24,60 | 100,00% | - | - | | |
| 1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 23,40 | 11,34 | 265,36 | 23,40 | 265,36 | 23,40 | 265,36 | 100,00% | - | - | | |
| 1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 46,80 | 3,57 | 167,08 | 46,80 | 167,08 | 46,80 | 167,08 | 100,00% | - | - | | |
| 1.5 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 56,00 | 167,74 | 9.393,44 | 56,00 | 9.393,44 | 56,00 | 9.393,44 | 100,00% | - | - | | |
| 1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12,00 | 757,71 | 9.092,52 | 1,20 | 909,25 | 1,20 | 909,25 | 10,00% | 10,80 | 8.183,27 | 90,00% | |
| 1.7 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12,00 | 1.072,56 | 12.870,72 | 1,20 | 1.287,07 | 1,20 | 1.287,07 | 10,00% | 10,80 | 11.583,65 | 90,00% | |
| 1.8 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | m² | 9,00 | 1.310,54 | 11.794,86 | 0,90 | 1.179,49 | 0,90 | 1.179,49 | 10,00% | 8,10 | 10.615,37 | 90,00% | |
| 1.9 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 12,00 | 1.234,66 | 14.815,92 | 1,20 | 1.481,59 | 1,20 | 1.481,59 | 10,00% | 10,80 | 13.334,33 | 90,00% | |
| 1.10 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | und | 1,00 | 7.003,16 | 7.003,16 | - | - | - | - | - | 1,00 | 7.003,16 | 100,00% | |
| 1.11 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | und | 1,00 | 205,78 | 205,78 | - | - | - | - | - | 1,00 | 205,78 | 100,00% | |
| 1.12 | Transporte em via fluvial de insumos | KG | 20.797,40 | 0,69 | 14.350,21 | 10.398,70 | 7.175,10 | 10.398,70 | 7.175,10 | 50,00% | 10.398,70 | 7.175,10 | 50,00% | |
| 1.13 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (Carga e descarga manuais) | t | 20,80 | 55,23 | 1.148,64 | 10,40 | 574,32 | 10,40 | 574,32 | 50,00% | 10,40 | 574,32 | 50,00% | |
| 1.14 | Mobilização e Desmobilização de maquinário | KG | 110.280,00 | 0,69 | 76.093,20 | 77.196,00 | 53.265,24 | 77.196,00 | 53.265,24 | 70,00% | 33.084,00 | 22.827,96 | 30,00% | |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 4.942,96 | 1,95 | 9.638,77 | 2.471,48 | 4.819,39 | 2.471,48 | 4.819,39 | 50,00% | 2.471,48 | 4.819,39 | 50,00% | |
| 2.2 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - ESPESSURA 4 MM | M2 | 577,86 | 48,00 | 27.737,28 | 288,93 | 13.868,64 | 288,93 | 13.868,64 | 50,00% | 288,93 | 13.868,64 | 50,00% | |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 4.365,10 | 32,32 | 141.080,03 | 2.182,55 | 70.540,02 | 2.182,55 | 70.540,02 | 50,00% | 2.182,55 | 70.540,02 | 50,00% | |
| 2.4 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA, L=0,50M, COM SUPORTE DE MADEIRA | und | 151,00 | 273,48 | 41.295,48 | - | - | - | - | - | 151,00 | 41.295,48 | 100,00% | |
| 2.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONAL L=0,25M, COM SUPORTE DE MADEIRA | und | 5,00 | 233,26 | 1.166,30 | - | - | - | - | - | 5,00 | 1.166,30 | 100,00% | |
| 2.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA, QUADRADA L=0,45M, COM SUPORTE DE MADEIRA | und | 185,00 | 228,45 | 42.263,25 | - | - | - | - | - | 185,00 | 42.263,25 | 100,00% | |
| 3 | Administração e Gerenciamento da Obra | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Administração da Obra | % | 100,00 | 329,69 | 32.969,00 | 40,00 | 13.187,60 | 40,00 | 13.187,60 | 40,00% | 60,00 | 19.781,40 | 60,00% | |
| 3.2 | Equipe Topográfica | % | 100,00 | 66,89 | 6.689,00 | 80,00 | 5.351,20 | 80,00 | 5.351,20 | 80,00% | 20,00 | 1.337,80 | 20,00% | |
| 3.3 | As built | % | 4.942,96 | 0,99 | 4.893,53 | - | - | - | - | - | 4.942,96 | 4.893,53 | 100,00% | |
| TOTAL SIMPLES | | | | | 466.756,32 | 39,70% | 185.287,58 | 185.287,58 | | | 39,70% | 281.468,74 | | 60,30% |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | 39,70% | 185.287,58 | | | | | | | |
| SALDO | | | | | | 60,30% | 281.468,74 | | | | | | | |

O Valor da presente medição é:

(Cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022



ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Nº CT Construtora: **051/2022**
Fiscal da obra: **ELISSON SILVA ALMEIDA - CREA 5069243559 D/SP**
Respons. Técnico: **FRANCISCO THIAGO ROCHA DE SOUZA ENGº. CIVIL CREA 24454 -**

ANEXO 2 - MEMORIA DE CALCULO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | REP. | COEFICIENTE | | DIMENSÕES | | | ÁREA | DESC. | DESCRIÇÃO | CÁLCULO PARCIAL | QUANT. TOTAL |
|----------|--|--------------------|------|------------------|------------------|-----------|-------|------|-------|-------|--|-----------------|--------------|
| | | | | COE ₁ | COE ₂ | COMP. | LARG. | ALT. | | | | | |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado 2x2,25m | m ² | 1,00 | | | | 2,25 | 2,00 | | | Larg. Placa x Alt. Placa= 2,25m X 2m | 4,50 | 4,50 |
| 1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m ² | 1,00 | | | | | | 60,00 | | Limpeza do canteiro de obras | 60,00 | 60,00 |
| 1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m ³ | 1,00 | 23,40 | | | | | | | Limpeza do canteiro de obras | 23,40 | 23,40 |
| 1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m ³ xkm | 1,00 | 46,80 | | | | | | | Limpeza do canteiro de obras | 46,80 | 46,80 |
| 1.5 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,00 | 56,00 | | | | | | | Limpeza do canteiro de obras | 56,00 | 56,00 |
| 1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m ² | 1,00 | | | | | | 1,20 | | Unidade de área de refeitório do canteiro de obras | 1,20 | 1,20 |
| 1.7 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m ² | 1,00 | | | | | | 1,20 | | Unidade de administração da obra | 1,20 | 1,20 |
| 1.8 | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos | m ² | 1,00 | | | | | | 0,90 | | Unidade de administração da obra | 0,90 | 0,90 |
| 1.9 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m ² | 1,00 | | | | | | 1,20 | | Execução dos módulos sanitários | 1,20 | 1,20 |
| 1.10 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | und | | | | | | | | | Unidade de ligação de reservatório | | 0,00 |
| 1.11 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | und | | | | | | | | | Unidade de ligação de água | | 0,00 |
| 1.12 | Transporte em via fluvial de insumos | KG | 0,50 | 20.797,40 | | | | | | | Transporte fluvial dos insumos da obra | 10.398,70 | 10.398,70 |
| 1.13 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (Carga e descarga manuais) | t | 0,50 | 20,80 | | | | | | | Carga e descarga dos insumos da obra | 10,40 | 10,40 |
| 1.14 | Mobilização e Desmobilização de maquinário | KG | 0,70 | 110.280,00 | | | | | | | Transporte dos maquinários da obra | 77.196,00 | 77.196,00 |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | REP. | COEFICIENTE | | DIMENSÕES | | | ÁREA | DESC. | DESCRIÇÃO | CÁLCULO PARCIAL | QUANT. TOTAL |
|--|---|-------|------|------------------|------------------|-----------|-------|------|----------|-------|--|-----------------|--------------|
| | | | | COE ₁ | COE ₂ | COMP. | LARG. | ALT. | | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 0,50 | | | | | | 4.942,96 | | Somatório da área de limpeza total da sinalização horizontal | 2.471,48 | 2.471,48 |
| 2.2 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - ESPESSURA 4 MM | M2 | 0,50 | | | | | | 577,86 | | Somatório da pintura da sinalização horizontal da Faixa PARE e Sinalização | 288,93 | 288,93 |
| 2.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 0,50 | | | | | | 4.365,10 | | Somatório da pintura da sinalização horizontal da faixa de pedestre, linha de retenção e faixa contínua. | 2.182,55 | 2.182,55 |
| 2.4 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA, L=0,50M, COM SUPORTE DE MADEIRA | und | | 151,00 | | | | | | | Somatório das placas de velocidade conforme projeto | | |
| 2.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA, OCTOGONAL L=0,25M, COM SUPORTE DE MADEIRA | und | | 5,00 | | | | | | | Somatório das placas PARE conforme projeto | | |
| 2.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA, QUADRADA L=0,45M, COM SUPORTE DE MADEIRA | und | | 185,00 | | | | | | | Somatório das placas de Rua Sem Saída e Travessia de Pedestre conforme Projeto | | |
| 3 Administração e Gerenciamento da Obra | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Administração da Obra | % | 0,40 | 100,00 | | | | | | | De acordo com o cronograma da obra | 40,00 | 40,00 |
| 3.2 | Equipe Topográfica | % | 0,80 | 100,00 | | | | | | | De acordo com o cronograma da obra | 80,00 | 80,00 |
| 3.3 | As built | % | | | | | | | | | | | |
| #REF! | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | | #REF! |

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO

COE1: COEFICIENTE

COE2: COEFICIENTE

DESC.: DESCONTO

Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO

LARG: LARGURA OU DIÂMETRO

ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA



ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA

CREA 5069243559 D/SP

PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022





ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Início: Início: Início: Início: **12/07/2022**
Término: Término: Término: Término: **12/03/2023**
Situação: Situação: Situação: Situação: **EXECUÇÃO VIGENTE**

| ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL DO ITEM | | PRAZO PROGRAMADO | | | | | | | | TOTAL ACUMULADO | | 1ª MEDIÇÃO | |
| | | VALOR | % | 07/2022 | | 08/2022 | | 09/2022 | | 10/2022 | | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOGÍSTICA | 159.023,67 | 34,07% | 79.511,84 | 79.511,84 | | | | | | | 34,1% | 159.023,67 | 16,61% | 77.520,74 |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO | 263.181,11 | 56,39% | 78.954,33 | 78.954,33 | 65.795,28 | 65.795,28 | 39.477,17 | 39.477,17 | | | 56,4% | 263.181,11 | 19,12% | 89.228,04 |
| 3 | Administração e Gerenciamento da Obra | 44.551,53 | 9,54% | 11.137,88 | 11.137,88 | 11.137,88 | 11.137,88 | 11.137,88 | 11.137,88 | | | 9,5% | 44.551,53 | 3,97% | 18.538,80 |
| TOTAL NO PERÍODO | | | | 169.604,05 | 36,34% | 169.604,05 | 36,34% | 76.933,16 | 16,48% | 50.615,05 | 10,84% | 100,00% | 466.756,32 | 39,70% | 185.287,58 |
| TOTAL ACUMULADO | | 466.756,32 | 100,00% | 169.604,05 | 36,34% | 339.208,11 | 72,67% | 416.141,27 | 89,16% | 466.756,32 | 100,00% | | | | |

Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022


ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Local: Área externa.



Imagem 1

Placa da Obra.

Local: Área interna.

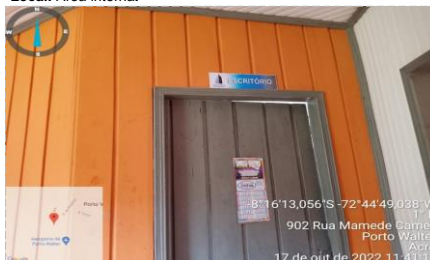


Imagem 2

Escritório em canteiro de obra.

Local: Área interna.

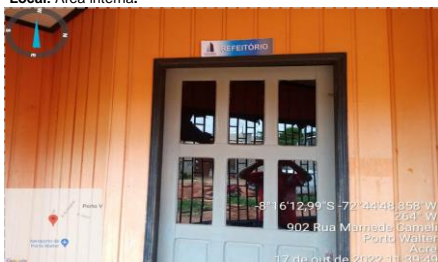


Imagem 3

Refeitório em canteiro de obra.

Local: Área interna.



Imagem 4

Sanitário em canteiro de obra.

Local: Área interna.



Imagem 5

Almoxarifado em canteiro de obra.

Local: Área interna.



Imagem 6

Vestibário em canteiro de obra.

Local: Área externa.



Imagem 7

Reservatório elevado de água em canteiro de obra.

Local: Área externa.



Imagem 8

Demarcação para recebimento de pintura.



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Local: Área externa.



Imagem 9

Demarcação para recebimento de pintura.

Local: Área externa.



Imagem 10

Demarcação para recebimento de pintura.

Local: Área externa.



Imagem 11

Demarcação para recebimento de pintura.

Local: Área externa.



Imagem 12

Demarcação para recebimento de pintura.

Local: Área externa.



Imagem 13

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 14

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 15

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 16

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Local: Área externa.



Imagem 17

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 18

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 19

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 20

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 21

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 22

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 23

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 24

Sinalização horizontal com tinta retroflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Local: Área externa.



Imagem 25

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 26

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 27

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.

Local: Área externa.



Imagem 28

Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.


ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022

Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

ANEXO 6 - JUSTIFICATIVA DE ATRASO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Fonte de Recurso: **100**

Nº CT Construtora: **051/2022**

Fiscal da obra: **ELISSON SILVA ALMEIDA - CREA 5069243559 D/SP**

Respons. Técnico: **FRANCISCO THIAGO ROCHA DE SOUZA ENGº. CIVIL CREA 24454 - AC**

2 - Justificativa para atraso de obra

3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022

ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA

CREA 5069243559 D/SP

PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

ANEXO 7 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**

Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

| Avaliação | Cronog. | Atend. Fisc. | Qualid. | Equipam. | Equipe | Segurança | Admin. Obra | Nota |
|------------|---------|--------------|---------|----------|--------|-----------|---------------------|-------------|
| 1ª Medição | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 |
| 2ª Medição | | | | | | | | |
| 3ª Medição | | | | | | | | |
| 4ª Medição | | | | | | | | |
| 5ª Medição | | | | | | | | |
| 6ª Medição | | | | | | | | |
| 7ª Medição | | | | | | | | |
| 8ª Medição | | | | | | | | |
| | | | | | | | Média Final: | 8,00 |
| | | | | | | | Conceito: | Boa |

| Itens | Critério para Nota | | |
|--|--------------------|---------------------|------------|
| | Atende totalmente | Atende parcialmente | Não atende |
| 1.0 Cronograma físico-financeiro | 2 | 1 | 0 |
| 2.0 Atendimento a fiscalização | 2 | 1 | 0 |
| 3.0 Qualidade dos serviços | 2 | 1 | 0 |
| 4.0 Equipamentos, insumos e técnica | 2 | 1 | 0 |
| 5.0 Equipe técnica | 2 | 1 | 0 |
| 6.0 Segurança do trabalho | 2 | 1 | 0 |
| 7.0 Administração e instalação da obra | 2 | 1 | 0 |

Conceito

| | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| Ruim - | 0,00 a 4,99 | Boa - | 7,00 a 8,99 |
| Razoável - | 5,00 a 6,99 | Muito Boa - | 9,00 a 10,00 |


ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022


Rio Branco - Acre, 15 de dezembro de 2022



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
ANEXO 8 - AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO WALTER - AC.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**
Construtora: **COLUNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado

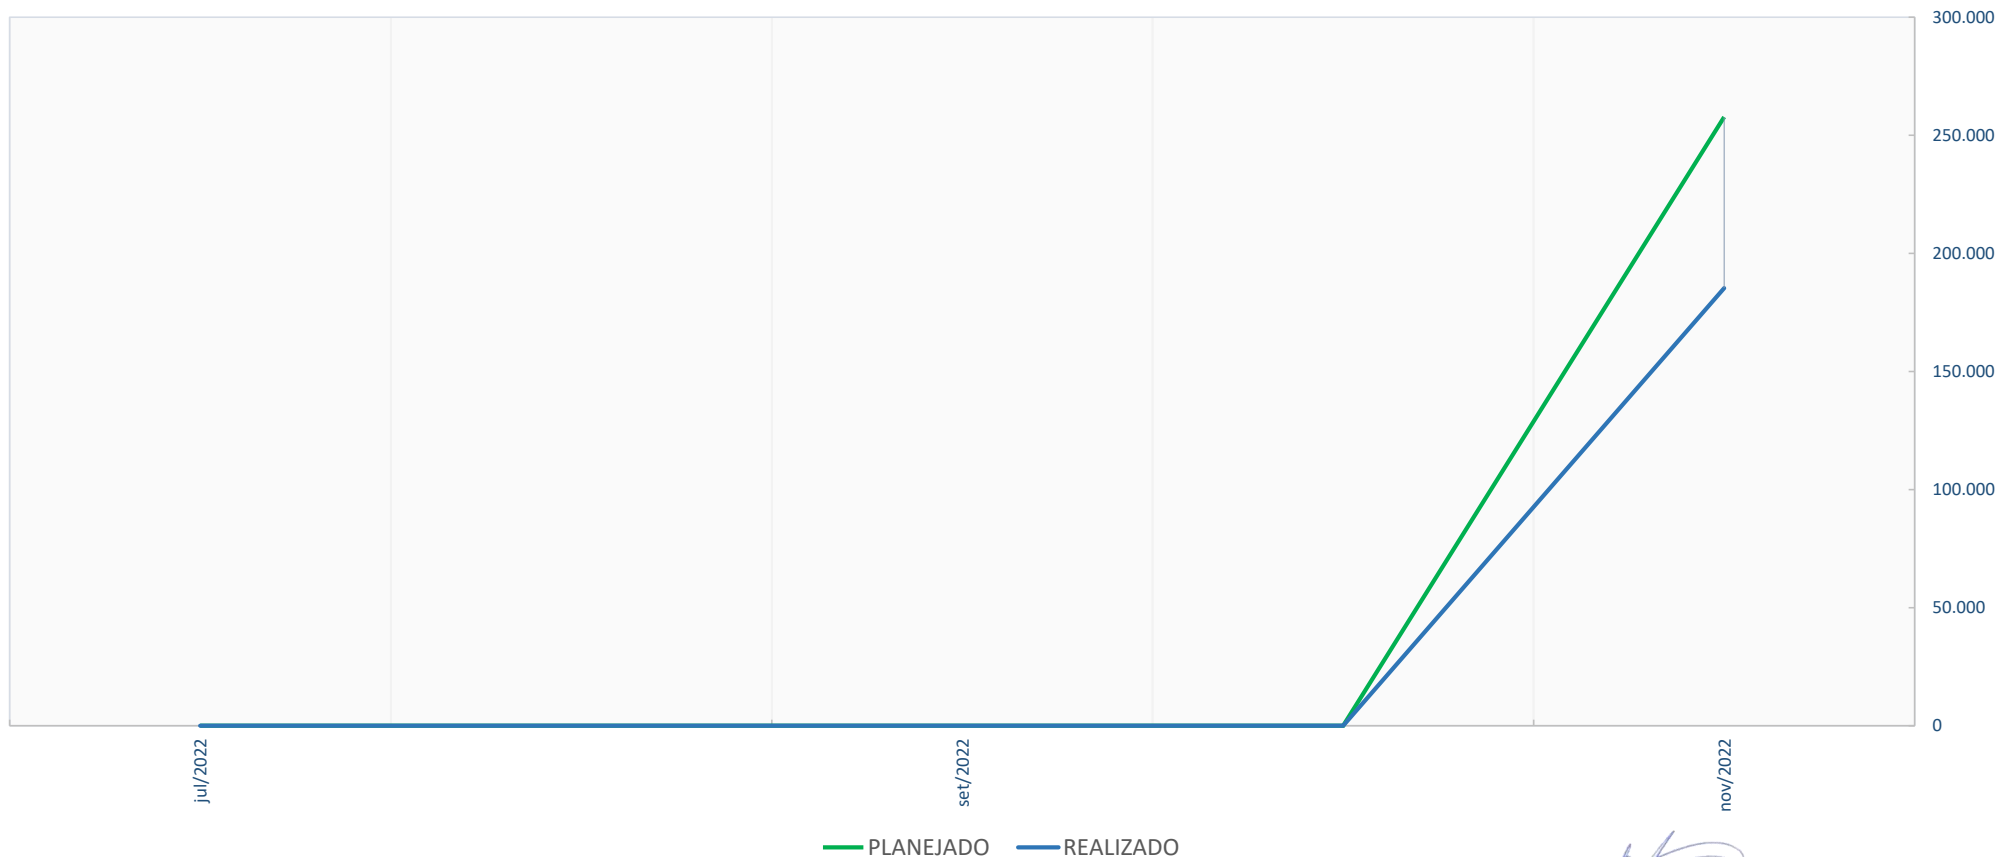

ENGº CIVIL ELISSON SILVA ALMEIDA
CREA 5069243559 D/SP
PORTARIA SEINFRA Nº 195/2022
