



RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Nº CT Contratada: 021/2022 - SEHURB

Construtora: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Número da medição: 12

Data da medição: 05/06/2024

Valor no período: R\$ 289.275,72

Período da medição: 01/04/2024 a 29/05/2024

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.

Geóloga Patrícia Maia Rocha
CREA 2012120806 D/RJ
Fiscal do Contrato nº 021/2022-SEHURB
PORTARIA Nº 185/2023

Responsável Técnico do CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART
Engº Ambiental Fernando Fonseca de Freitas

Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

100,00% executado.



1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Órgão Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Fonte de Recurso: Recursos Próprios - 100; Convênio - 200.

Nº CT Contratada: 021/2022 - SEHURB

Fiscal: Geóloga Patrícia Maia Rocha

Coord. Projetos: Engª. Ambiental Fernando Fonseca de Freitas

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: 12ª

Data da medição: 05/06/24

Período da medição: 01/04/24 A 29/05/24

Início: 05/07/22

Prazo Inicial: 24 MESES

Prazo Reprogramado: 0 DIAS

Prazo Decorrido: 701 DIAS

Término: 05/07/2024

Situação: EXECUÇÃO VIGENTE

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	610.728,88	-	610.728,88	100,0%
2	INSTALAÇÃO, COLETA DE DADOS E REMOÇÃO DE LEVELLOGERS	683.058,36	-	683.058,36	100,0%
3	BATIMETRIA	311.826,64	-	311.826,64	100,0%
4	AEROLEVANTAMENTO	516.834,63	-	516.834,63	100,0%
5	CARACTERIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO	442.332,00	-	442.332,00	100,0%
6	MODELAGEM	1.647.131,82	258.039,02	1.647.131,82	100,0%
7	REUNIÃO DE ENTREGA	31.236,70	31.236,70	31.236,70	100,0%
TOTAL		4.243.149,03	289.275,72	4.243.149,03	100,00%

O valor da presente medição é:

Cento e setenta e dois mil vinte e seis reais e um centavo

4 - Situação da obra

Execução contratual: 100,00%	Valor contrato inicial: 4.243.149,03
Situação do Cronograma Inicial: SERVIÇO VIGENTE	Valor adequado: -

Nível Técnico da Empresa				Conceito da Empresa			
☐ 0,00 a 4,99	☐ 5,00 a 6,99	☐ 7,00 a 8,99	☒ 9,00 a 10,00	☐ Ruim	☐ Razoável	☐ Boa	☒ Muito boa

Observações:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.

O número de vias impressas de forma gráfica e digital não foi entregue conforme previsto no Termo de Referência.

5 - Documentos anexos:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 - Boletim de Medição; | 5 - Justificativa de Atraso; |
| 2 - Memória de Cálculo; | 6 - Avaliação da Contratada; |
| 3 - Termos de Aceite; | 7 - Relatório Fotográfico; |
| 4 - Resumo do Cronograma; | 8 - Gráfico - Planejado x Realizado. |

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024

Geóloga Patrícia Maia Rocha
CREA 2012120806 D/RJ - PORTARIA Nº 185/2023



Objeto: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das interve
Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB
Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE
Fonte: Recursos Próprios - 100; Convênio - 200.
Nº Contrato: 021/2022 - SEHURB
Fiscal: Geóloga Patrícia Maia Rocha
Coord. Engº. Ambiental Fernando Fonseca de Freitas
Projetos:

Data-base Orçamento: nov/2019
Data da Medição: 05/06/2024
Período da Medição: 01/04/2024 A 29/05/2024
Prazo Inicial: 24 MESES
Início: 05/07/2022
Término: 05/07/2024
Situação: EXECUÇÃO VIGENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO				11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT	PREÇO	TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	Reunião Inicial	und	1,00	28.990,33	28.990,33	0,68%					1,00	28.990,33	100,00%	-	-	
1.2	Elaboração do Plano de Trabalho	und	1,00	42.092,47	42.092,47	0,99%					1,00	42.092,47	100,00%	-	-	
1.3	Levantamento de Dados Disponíveis / Existentes	und	1,00	42.092,47	42.092,47	0,99%					1,00	42.092,47	100,00%	-	-	
1.4	Georreferenciamento da mancha falada (mapeamento dos níveis atinidos em residências, árvores, postes, etc).	und	1,00	497.553,61	497.553,61	11,73%					1,00	497.553,61	100,00%	-	-	
2	INSTALAÇÃO, COLETA DE DADOS E REMOÇÃO DE															
2.1	Instalação e Implantação de equipamentos como levellogger, réguas, medidores de nível d'áua. etc.	und	1,00	47.367,12	47.367,12	1,12%					1,00	47.367,12	100,00%	-	-	
2.2	Coleta e avaliação de leituras dos instrumentos instalados ao longo de um ano hidrolóico	und	1,00	622.076,08	622.076,08	14,66%					1,00	622.076,08	100,00%	-	-	
2.3	Remoção dos equipamentos	und	1,00	13.615,16	13.615,16	0,32%					1,00	13.615,16	100,00%	-	-	
3	BATIMETRIA															
3.1	Execução de levantamento batimétrico	und	1,00	170.412,84	170.412,84	4,02%					1,00	170.412,84	100,00%	-	-	
3.2	Processamento dos Dados Brutos Batimétricos e Produção dos mapas de Elevação	und	1,00	141.413,80	141.413,80	3,33%					1,00	141.413,80	100,00%	-	-	
4	AEROLEVANTAMENTO															
4.1	Execução do aerolevantamento com perfilamento a laser sobre a área de proieto	und	1,00	92.593,24	92.593,24	2,18%					1,00	92.593,24	100,00%	-	-	
4.2	Processamento a elaboração do MDT	und	1,00	141.413,80	141.413,80	3,33%					1,00	141.413,80	100,00%	-	-	
4.3	Processamento das ortofotos	und	1,00	282.827,59	282.827,59	6,67%					1,00	282.827,59	100,00%	-	-	
5	CARACTERIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO															
5.1	Elaboração de Estudo Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	und	1,00	147.444,00	147.444,00	3,47%					1,00	147.444,00	100,00%	-	-	
5.2	Caracterização geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	und	1,00	147.444,00	147.444,00	3,47%					1,00	147.444,00	100,00%	-	-	
5.3	Elaboração de Classificação de uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	und	1,00	147.444,00	147.444,00	3,47%					1,00	147.444,00	100,00%	-	-	
6	MODELAGEM															
6.1	Elaboração de modelagens hidrodinâmicas para reprodução das cheias históricas	und	1,00	282.827,59	282.827,59	6,67%					1,00	282.827,59	100,00%	-	-	
6.2	Elaboração dos mapas de inundações referentes às cheias históricas	und	1,00	282.827,59	282.827,59	6,67%					1,00	282.827,59	100,00%	-	-	
6.3	Caracterização sócio-econômica das áreas impactadas	und	1,00	221.346,58	221.346,58	5,22%					1,00	221.346,58	100,00%	-	-	
6.4	Elaboração de Anteprojetos para soluções para regularização de vazões e contenção enchentes propostas	und	1,00	430.065,03	430.065,03	10,14%	0,40	172.026,01	0,60	258.039,02	1,00	430.065,03	100,00%	-	-	
6.5	Integração dos dados de elevação da área molhada e das áreas secas para consolidação de um MDT inteorado	und	1,00	430.065,03	430.065,03	10,14%					1,00	430.065,03	100,00%	-	-	
7	REUNIÃO DE ENTREGA															
7.1	Reunião de Entrega	und	1,00	31.236,70	31.236,70	0,74%			1,00	31.236,70	1,00	31.236,70	100,00%	-	-	
TOTAL SIMPLES											4.243.149,03			100,00%	0,00	
TOTAL ACUMULADO							93,18%	3.953.873,30	100,00%	4.243.149,02						
SALDO							6,82%	289.275,73	0,00%	0,01						

O Valor da presente medição é:

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024

Geóloga Patrícia Maia Rocha
CREA 2012120806 D/RJ - PORTARIA Nº 185/2023

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB
Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Nº CT Contratante: 021/2022 - SEHURB
Fiscal da obra: Geóloga Patrícia Maia Rocha
Respons. Técnico: Eng^a. Ambiental Fernando Fonseca de Freitas

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PERCENTUAL EXECUTADO	DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAL
X	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	1.1	Reunião Inicial	und	1,00	100%	Reunião inicial aprovado conforme termo de aceite em anexo.	1,00
	1.2	Elaboração do Plano de Trabalho	und	1,00	100%	Plano de Trabalho aprovado conforme termo de aceite em anexo.	1,00
	1.3	Levantamento de Dados Disponíveis / Existentes	und	1,00	100%	PRODUTO 02 aprovado conforme termo de aceite da 2ª medição	1,00
	1.4	Georreferenciamento da mancha falada (mapeamento dos níveis atingidos em residências, árvores, postes, etc).	und	1,00	100%	0,12 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição. Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 3ª medição. 0,12 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 2ª medição.	0,76 do 1,00
X	2	INSTALAÇÃO, COLETA DE DADOS E REMOÇÃO DE LEVELLOGERS					
	2.1	Instalação e Implantação de equipamentos como levellogger, réguas, medidores de nível d'água, etc.	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 3ª medição.	1,00
	2.2	Coleta e avaliação de leituras dos instrumentos instalados ao longo de um ano hidrológico	und	1,00	100%	0,13 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição, referente à segunda campanha de coleta de dados. 0,26 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 5ª medição, referente à terceira e quarta campanhas de coleta de dados. 0,13 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 7ª medição - Quinta campanha. 0,13 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 8ª medição - Sexta Campanha 0,13 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 9ª medição - Sétima Campanha. item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 10ª medição - Oitava Campanha	0,22 do 1,00
	2.3	Remoção dos equipamentos	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 10ª medição	1,00
X	3	BATIMETRIA					
	3.1	Execução de levantamento batimétrico	und	1,00	100%	0,34 do item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição. 0,66 do Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 3ª medição.	1,00
	3.2	Processamento dos Dados Brutos Batimétricos e Produção dos mapas de Elevação	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição.	1,00
X	4	AEROLEVANTAMENTO					
	4.1	Execução do aerolevanteamento com perfilamento a laser sobre a área de projeto	und	1,00	100%	PRODUTO 06 aprovado conforme termo de aceite da 2ª medição	1,00
	4.2	Processamento a elaboração do MDT	und	1,00	100%	Item aprovado em 0,90 conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição. Item aprovado em 0,10 conforme Termo de aceite anexo na 3ª medição.	1,00
	4.3	Processamento das ortofotos	und	1,00	100%	Item aprovado em 0,90 conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição. Item aprovado em 0,10 conforme Termo de aceite anexo na 3ª medição.	1,00
X	5	CARACTERIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO					
	5.1	Elaboração de Estudo Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição.	1,00
	5.2	Caracterização geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	und	1,00	100%	Relatório único aprovado conforme termo de aceite da 2ª medição	1,00
	5.3	Elaboração de Classificação de uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 4ª medição.	1,00
X	6	MODELAGEM					
	6.1	Elaboração de modelagens hidrodinâmicas para reprodução das cheias históricas	und	1,00	100%	0,17 Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 6ª medição (faltam os dados de TR5, 10, 25, 50 e 100) Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 10ª medição	0,83 1,00
	6.2	Elaboração dos mapas de inundações referentes às cheias históricas	und	1,00	100%	0,17 Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 6ª medição - 5 de 30 mapas entregues (faltam os mapas de TR5, 10, 25, 50 e 100) Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 10ª medição	0,83 1,00
	6.3	Caracterização sócio-econômica das áreas impactadas	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 6ª medição	1,00
	6.4	Elaboração de Anteprojetos para soluções para regularização de vazões e contenção enchentes propostas	und	1,00	100%	0,40 Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 11ª medição Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 12ª e última medição	0,60 1,00
	6.5	Integração dos dados de elevação da área molhada e das áreas secas para consolidação de um MDT integrado	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 5ª medição	1,00
X	7	REUNIÃO DE ENTREGA					
	7.1	Reunião de Entrega	und	1,00	100%	Item aprovado conforme Termo de aceite anexo na 12ª e última medição	1,00

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024

Objeto: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Início: 05/07/2022

Término: 05/07/2024

Situação: EXECUÇÃO VIGENTE

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		15 MÊS	16 MÊS	17 MÊS	18 MÊS	TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%					%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Reunião Inicial	28.990,33	0,68%					0,68%	28.990,33
1.2	Elaboração do Plano de Trabalho	42.092,47	0,99%					1,68%	71.082,80
1.3	Levantamento de Dados Disponíveis / Existentes	42.092,47	0,99%					2,67%	113.175,27
1.4	Georreferenciamento da mancha falada (mapeamento dos níveis atingidos em residências, árvores, postes, etc).	497.553,61	11,73%					14,39%	610.728,88
2	INSTALAÇÃO, COLETA DE DADOS E REMOÇÃO DE LEVELLOGERS								
2.1	Instalação e Implantação de equipamentos como levellogger, réguas, medidores de nível d'água, etc.	47.367,12	1,12%					15,51%	658.096,00
2.2	Coleta e avaliação de leituras dos instrumentos instalados ao longo de um ano hidrológico	622.076,08	14,66%	52.876,47 8,5%	52.876,47 8,5%	52.876,47 8,5%	93.311,41 15,0%	30,17%	1.280.172,08
2.3	Remoção dos equipamentos	13.615,16	0,32%				13.615,16 100,0%	30,49%	1.293.787,24
3	BATIMETRIA								
3.1	Execução de levantamento batimétrico	170.412,84	4,02%					34,51%	1.464.200,08
3.2	Processamento dos Dados Brutos Batimétricos e Produção dos mapas de Elevação	141.413,80	3,33%					37,84%	1.605.613,88
4	AEROLEVANTAMENTO								
4.1	Execução do aerolevantamento com perfilamento a laser sobre a área de projeto	92.593,24	2,18%					40,02%	1.698.207,12
4.2	Processamento a elaboração do MDT	141.413,80	3,33%					43,36%	1.839.620,92
4.3	Processamento das ortofotos	282.827,59	6,67%					50,02%	2.122.448,51
5	CARACTERIZAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO	-	0,00%					50,02%	2.122.448,51
5.1	Elaboração de Estudo Hidrológico da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	147.444,00	3,47%					53,50%	2.269.892,51
5.2	Caracterização geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	147.444,00	3,47%					56,97%	2.417.336,51
5.3	Elaboração de Classificação de uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica do Rio Acre	147.444,00	3,47%					60,45%	2.564.780,51
6	MODELAGEM								
6.1	Elaboração de modelagens hidrodinâmicas para reprodução das cheias históricas	282.827,59	6,67%					67,11%	2.847.608,10
6.2	Elaboração dos mapas de inundações referentes às cheias históricas	282.827,59	6,67%					73,78%	3.130.435,69
6.3	Caracterização sócio-econômica das áreas impactadas	221.346,58	5,22%					78,99%	3.351.782,27
6.4	Elaboração de Anteprojetos para soluções para regularização de vazões e contenção enchentes propostas	430.065,03	10,14%		430.065,03 100,0%			89,13%	3.781.847,30
6.5	Integração dos dados de elevação da área molhada e das áreas secas para consolidação de um MDT integrado	430.065,03	10,14%					99,26%	4.211.912,33
7	REUNIÃO DE ENTREGA								
7.1	Reunião de Entrega	31.236,70	0,74%				31.236,70 100%	100,00%	4.243.149,03
TOTAL NO PERÍODO				52.876,47 1,25%	482.941,49 11,38%	52.876,47 1,25%	138.163,27 3,26%		
TOTAL ACUMULADO		4.243.149,03	100,00%	3.569.167,79 84,12%	4.052.109,29 95,50%	4.104.985,76 96,74%	4.243.149,03 100,00%		

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Órgão Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Fonte de Recurso: Recursos Próprios - 100; Convênio - 200.

Nº CT Contratante: 021/2022 - SEHURB

Fiscal da obra: Geóloga Patrícia Maia Rocha

Coord. Projeto: Eng^a. Ambiental Fernando Fonseca de Freitas

2 - Justificativa para atraso do serviço

Atraso na entrega dos produtos está relacionada com o atraso da análise do aditivo de valor no Órgão financiador, Já superado.

3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

Nenhuma penalidade imposta a empresa contratada até o presente momento

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024

Objeto:

Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Contratante:

Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Contratada:

CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Nota
1ª Medição	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
2ª Medição	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00
3ª Medição	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	9,50
4ª Medição	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	9,80
5ª Medição	1,90	2,00	1,90	2,00	2,00	9,80
6ª Medição	1,90	2,00	1,90	2,00	2,00	9,80
7ª Medição	1,90	2,00	1,90	2,00	2,00	9,80
8ª Medição	1,90	2,00	1,90	2,00	2,00	9,80
9ª Medição	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
10ª Medição	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
11ª Medição	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
12ª Medição	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
13ª Medição						
14ª Medição						
15ª Medição						
16ª Medição						
17ª Medição						
18ª Medição						
19ª Medição						
20ª Medição						
21ª Medição						
22ª Medição						
23ª Medição						
24ª Medição						
25ª Medição						
26ª Medição						
Média Final: Conceito:						9,63 Muito boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	X	0	0
2.0 Atendimento a fiscalização	X	0	0
3.0 Qualidade dos serviços	X	0	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	X	0	0
5.0 Equipe técnica	X	0	0
Conceito			
Ruim - 0,00 a 4,99	Boa - 7,00 a 8,99		
Razoável - 5,00 a 6,99	Muito Boa - 9,00 a 10,00		

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024

Objeto: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Governador acompanhou a apresentação



Imagem 1
Matheus Willinghoefer explicou como foi feito o estudo



Imagem 3
Presentes na reunião



Imagem 5

Reunião de entrega dos produtos



Imagem 2
Fernando F. de Freitas coordenador executivo do contrato



Imagem 4
Secretário da SEHURB



Imagem 6

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024


AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Realização de diagnóstico, estudos hidrológicos e de viabilidade técnica e socioambiental da bacia do Rio Acre, incluindo elaboração de anteprojetos de engenharia das intervenções necessárias para prevenção de enchentes e recuperação ambiental das áreas de riscos.

Contratante: Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Contratada: CONSÓRCIO NOVA ENGEVIX - TOPOCART_ BACIA DO RIO ACRE

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado

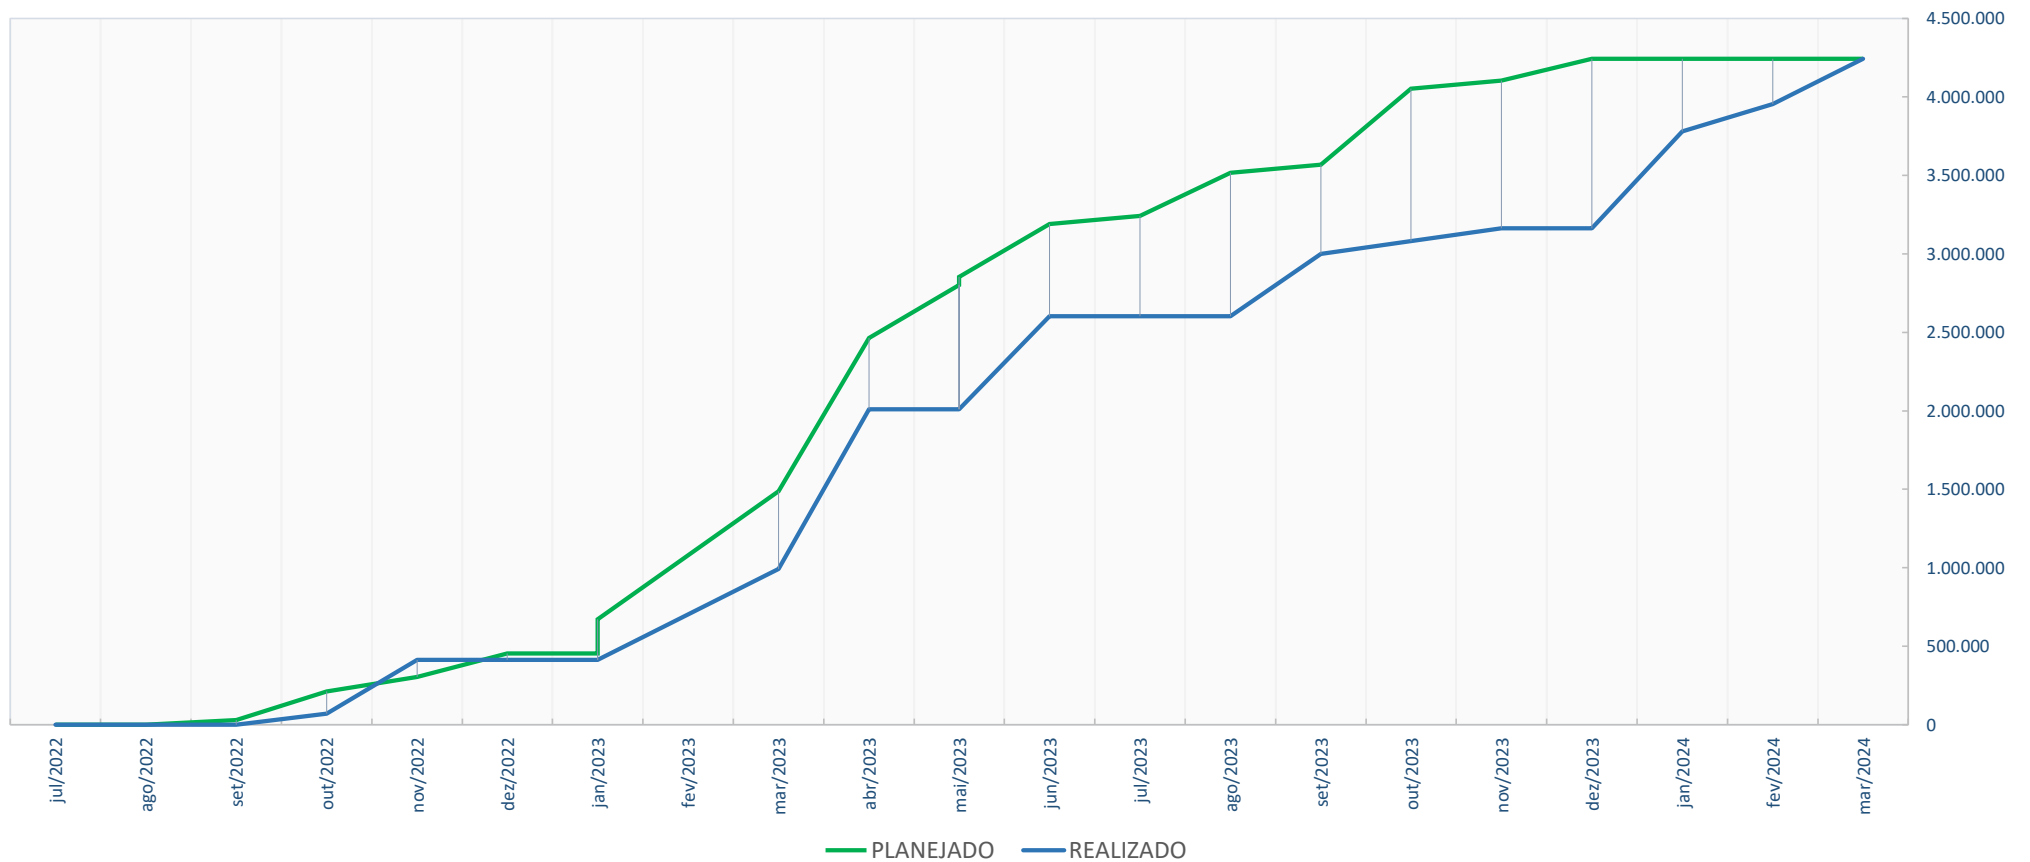

Rio Branco - Acre, 5 de junho de 2024
