



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Nº CT Construtora: 022/2026

Construtora: FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Número da medição: 1

Data da medição: 22/06/2026

Valor no período: R\$ 2.510.390,15

Período da medição: 02/06/2026 a 21/06/2026

PARECER:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.


ENGº CIVIL ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências

64,65% executado.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Fonte de Recurso: **100**
Nº CT Construtora: **022/2026**
Fiscal da obra: **Eng. Civil Isabelle Lima e Silva**
Respons. Técnico: **Eng. Civil Weysser Coelho da Silva**

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: **1ª**
Data da medição: **22/06/26**
Período da medição: **02/06/26** a **21/06/26**
Início da obra: **02/06/26**
Prazo Inicial da Obra: **1 MESES**
Prazo Reprogramado: **0 MESES**
Prazo Decorrido: **1 MESES**
Término da Obra: **02/07/2026**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO EXPIRADA**

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)	78.040,00	50.413,84	50.413,84	64,6%
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.191,98	-	-	0,0%
3	CANTEIRO DE OBRAS	46.274,66	46.274,66	46.274,66	100,0%
4	PLANTIO DE GRAMA	31.424,56	-	-	0,0%
5	PISOS	673.602,98	645.744,77	645.744,77	95,9%
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES	165.014,33	163.147,23	163.147,23	98,9%
7	DRENAGEM	11.756,02	-	-	0,0%
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	11.161,44	-	-	0,0%
9	PISO COMPENSADO	226.054,47	-	-	0,0%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.921,10	1.426,60	1.426,60	7,5%
11	PLANTÃO EXPO JURUÁ	13.064,32	-	-	0,0%
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES	219.587,29	117.657,03	117.657,03	53,6%
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA	360.456,41	243.651,71	243.651,71	67,6%
14	PAISAGISMO	78.670,84	-	-	0,0%
15	ESPAÇO INDUSTRIA	282.108,63	195.674,68	195.674,68	69,4%
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS	149.566,99	82.419,70	82.419,70	55,1%
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)	425.969,53	396.703,71	396.703,71	93,1%
18	SECOM	61.307,24	36.816,35	36.816,35	60,1%
19	ESPAÇO DERACRE	42.466,19	3.414,30	3.414,30	8,0%
20	CASA DE FARINHA	1.430,70	1.237,74	1.237,74	86,5%
21	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	16.966,80	16.966,80	16.966,80	100,0%
22	JARDINEIRAS	304,47	304,47	304,47	100,0%
23	SEFAZ E SAMU	113.738,18	37.325,68	37.325,68	32,8%
24	DECK PISCICULTURA	33.886,10	-	-	0,0%
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS	33.833,06	-	-	0,0%
26	LIMPEZA FINAL	8.420,00	-	-	0,0%
27	PÓRTICO PRINCIPAL	52.277,29	15.594,89	15.594,89	29,8%
28	ESPAÇO PCD	10.155,47	9.009,77	9.009,77	88,7%
29	PALCO PRINCIPAL	59.593,28	19.865,56	19.865,56	33,3%
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP	43.295,26	17.896,14	17.896,14	41,3%
31	SERVIÇOS DIVERSOS	9.373,01	-	-	0,0%
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA	2.759,00	-	-	0,0%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO	518.215,30	378.003,66	378.003,66	72,9%
34	SEMA E IMAC	57.703,14	30.840,86	30.840,86	53,4%
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	20.608,25	-	-	0,0%
36					
37					
TOTAL		3.883.198,29	2.510.390,15	2.510.390,15	64,65%

O valor da presente medição é:
DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS.

4 - Situação da obra

Execução física:	64,65%	Valor contrato inicial:	3.883.198,29
Situação do Cronograma Inicial:	OBRA VIGENTE	Valor adequado:	
Nível Técnico da Empresa		Conceito da Empresa	
☐ 0,00 a 4,99 ☐ 5,00 a 6,99 ☐ 7,00 a 8,99 ☒ 9,00 a 10,00		☐ Ruim ☐ Razoável ☐ Boa ☒ Muito boa	
Observações: Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.			

5 - Documentos anexos:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Boletim de Medição; | 5 - Relatório Fotográfico; |
| 2 - Memória de Cálculo; | 6 - Justificativa de atraso; |
| 3 - Planta iluminada; | 7 - Avaliação; |
| 4 - Resumo do Cronograma; | 8 - Gráfico - Previsto x Realizado. |

ENG. CIVIL ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Fonte: **15000100**

Nº Contrato: **022/2026**

Fiscal: **Eng. Civil Isabelle Lima e Silva**

R.Técnico: **Eng. Civil Weysser Coelho da Silva**

Data-base Orçamento: **03/2026**

Data da Medição: **22/06/2026**

Período da Medição: **02/06/2026** A **21/06/2026**

Prazo Inicial Obra: **1 MESES**

Início da Obra: **02/06/2026**

Término da Obra: **02/07/2026**

Situação da Obra: **EXECUÇÃO EXPIRADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)		-					-	-		-	-	
1.1	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	100,00	780,40	78.040,00	64,60	50.413,84	64,60	50.413,84	64,60%	35,40	27.626,16	35,40%
2	TAXAS E EMOLUMENTOS							-	-		-	-	
2.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN	1,00	1.223,95	1.223,95			-	-		1,00	1.223,95	100,00%
2.2	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN	1,00	815,96	815,96			-	-		1,00	815,96	100,00%
2.3	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,00	917,96	917,96			-	-		1,00	917,96	100,00%
2.4	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART- CREA	UN	1,00	194,19	194,19			-	-		1,00	194,19	100,00%
2.5	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00	2.039,92	2.039,92			-	-		1,00	2.039,92	100,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022. PS	m²	6,00	374,99	2.249,94	6,00	2.249,94	6,00	2.249,94	100,00%	-	-	
3.2	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_ 02/2016	m²	24,00	739,76	17.754,24	24,00	17.754,24	24,00	17.754,24	100,00%	-	-	
3.3	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	m²	10,00	619,09	6.190,90	10,00	6.190,90	10,00	6.190,90	100,00%	-	-	
3.4	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 02/2016	m²	10,00	907,56	9.075,60	10,00	9.075,60	10,00	9.075,60	100,00%	-	-	
3.5	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	m²	10,00	955,19	9.551,90	10,00	9.551,90	10,00	9.551,90	100,00%	-	-	
3.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.452,08	1.452,08	1,00	1.452,08	1,00	1.452,08	100,00%	-	-	
4	PLANTIO DE GRAMA												
4.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	90,15	186,09	16.776,01			-	-		90,15	16.776,01	100,00%
4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,32	405,12			-	-		16,00	405,12	100,00%
4.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	831,49	17,13	14.243,42			-	-		831,49	14.243,42	100,00%
5	PISOS												
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISOS												
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	2.168,97	13,71	29.736,58	2.168,97	29.736,58	2.168,97	29.736,58	100,00%	-	-	
5.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	m³	21,69	680,77	14.765,90	21,69	14.765,90	21,69	14.765,90	100,00%	-	-	
5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	2.168,97	48,44	105.064,91	2.168,97	105.064,91	2.168,97	105.064,91	100,00%	-	-	
5.1.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	14.459,78	0,72	10.411,04	14.459,78	10.411,04	14.459,78	10.411,04	100,00%	-	-	
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	14.766,18	21,63	319.392,47	14.766,18	319.392,47	14.766,18	319.392,47	100,00%	-	-	
5.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,62	100,16	1.864,98	18,62	1.864,98	18,62	1.864,98	100,00%	-	-	
5.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA). REF. SINAPI (6110 - 09/2016)	m³	14,97	959,98	14.370,90	14,97	14.370,90	14,97	14.370,90	100,00%	-	-	
5.1.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_ 08/2023	m³	12,52	69,64	871,89	12,52	871,89	12,52	871,89	100,00%	-	-	
5.1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	126,36	0,80	101,09	126,36	101,09	126,36	101,09	100,00%	-	-	
5.1.10	TRANSPORTE E COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	M3XKM	65,21	2,71	176,72	65,21	176,72	65,21	176,72	100,00%	-	-	
5.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS												
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	137,33	13,71	1.882,79	137,33	1.882,79	137,33	1.882,79	100,00%	-	-	
5.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 08/2019	m³	4,12	680,77	2.804,77	4,12	2.804,77	4,12	2.804,77	100,00%	-	-	
5.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	137,33	48,44	6.652,27	137,33	6.652,27	137,33	6.652,27	100,00%	-	-	
5.2.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1.373,31	0,72	988,78	1.373,31	988,78	1.373,31	988,78	100,00%	-	-	
5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	1.373,31	21,63	29.704,70	1.373,31	29.704,70	1.373,31	29.704,70	100,00%	-	-	
5.3	PISO A EXECUTAR												
5.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	m³	50,44	1.001,73	50.527,26	45,93	46.009,46	45,93	46.009,46	91,06%	4,51	4.517,80	8,94%
5.3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	1.384,35	21,63	29.943,49	1.384,35	29.943,49	1.384,35	29.943,49	100,00%	-	-	
5.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	375,60	82,54	31.002,02	375,60	31.002,02	375,60	31.002,02	100,00%	-	-	
5.4	CALÇADA A EXECUTAR												
5.4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	213,88	5,38	1.150,67			-	-		213,88	1.150,67	100,00%
5.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	m³	21,39	100,16	2.142,42			-	-		21,39	2.142,42	100,00%
5.4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	m²	213,88	8,93	1.909,95			-	-		213,88	1.909,95	100,00%
5.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	m²	22,86	137,83	3.150,79			-	-		22,86	3.150,79	100,00%
5.4.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	213,88	48,44	10.360,35			-	-		213,88	10.360,35	100,00%
5.4.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	213,88	21,63	4.626,22			-	-		213,88	4.626,22	100,00%
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES												
6.1	PAREDES E REVESTIMENTOS												
6.1.1	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	0,00					-	-		-	-	
6.1.2	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANGADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	344,16	254,82	87.698,85	344,16	87.698,85	344,16	87.698,85	100,00%	-	-	
			24,00	217,09	5.210,16	24,00	5.210,16	24,00	5.210,16	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²			1.009,98	9,41	1.009,98	9,41	1.009,98	100,00%	-	-	
6.2	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
6.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	783,84	23,40	18.341,86	783,84	18.341,86	783,84	18.341,86	100,00%	-	-	
6.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	783,84	16,75	13.129,32	783,84	13.129,32	783,84	13.129,32	100,00%	-	-	
6.3	ESQUADRIAS		0,00					-	-		-	-	
6.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,00	1.045,82	25.099,68	24,00	25.099,68	24,00	25.099,68	100,00%	-	-	
6.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00					-	-		-	-	
6.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	15,00	100,16	1.502,40	15,00	1.502,40	15,00	1.502,40	100,00%	-	-	
6.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	30,00	4,07	122,10	30,00	122,10	30,00	122,10	100,00%	-	-	
6.4.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,00	60,73	850,22	14,00	850,22	14,00	850,22	100,00%	-	-	
6.4.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	373,42				-	-		5,00	1.867,10	100,00%
6.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	26,77	642,48	24,00	642,48	24,00	642,48	100,00%	-	-	
6.4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120,00	35,44	4.252,80	120,00	4.252,80	120,00	4.252,80	100,00%	-	-	
6.4.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,27	79,62	6,00	79,62	6,00	79,62	100,00%	-	-	
6.4.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	14,75	88,50	6,00	88,50	6,00	88,50	100,00%	-	-	
6.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	14,31	85,86	6,00	85,86	6,00	85,86	100,00%	-	-	
6.4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	19,78	118,68	6,00	118,68	6,00	118,68	100,00%	-	-	
6.4.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	27,06	81,18	3,00	81,18	3,00	81,18	100,00%	-	-	
6.4.12	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,67	52,02	6,00	52,02	6,00	52,02	100,00%	-	-	
6.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00					-	-		-	-	
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,00	100,16	300,48	3,00	300,48	3,00	300,48	100,00%	-	-	
6.5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	6,00	4,07	24,42	6,00	24,42	6,00	24,42	100,00%	-	-	
6.5.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,80	60,73	48,58	0,80	48,58	0,80	48,58	100,00%	-	-	
6.5.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	40,02	240,12	6,00	240,12	6,00	240,12	100,00%	-	-	
6.5.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	23,46	469,20	20,00	469,20	20,00	469,20	100,00%	-	-	
6.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	11,00	154,00	14,00	154,00	14,00	154,00	100,00%	-	-	
6.5.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	15,68	62,72	4,00	62,72	4,00	62,72	100,00%	-	-	
6.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,02	56,04	2,00	56,04	2,00	56,04	100,00%	-	-	
6.5.9	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	18,37	36,74	2,00	36,74	2,00	36,74	100,00%	-	-	
6.5.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50	111,08	277,70	2,50	277,70	2,50	277,70	100,00%	-	-	
6.5.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	47,53	285,18	6,00	285,18	6,00	285,18	100,00%	-	-	
6.5.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.826,34	2.826,34	1,00	2.826,34	1,00	2.826,34	100,00%	-	-	
7	DRENAGEM		0,00					-	-		-	-	
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,50	100,16	751,20	-	-	-	-		7,50	751,20	100,00%
7.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	15,00	4,07	61,05	-	-	-	-		15,00	61,05	100,00%
7.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	1,50	207,95	311,93	-	-	-	-		1,50	311,93	100,00%
7.4	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	133,28	3.332,00	-	-	-	-		25,00	3.332,00	100,00%
7.5	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,63	60,73	38,26	-	-	-	-		0,63	38,26	100,00%
7.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	25,00	260,82	6.520,50	-	-	-	-		25,00	6.520,50	100,00%
7.7	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	3,00	247,03	741,09	-	-	-	-		3,00	741,09	100,00%
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)		0,00					-	-		-	-	
8.1	ORSE (REF: 3752_03/2024) - CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m	104,00	74,14	7.710,56	-	-	-	-		104,00	7.710,56	100,00%
8.2	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	8,00	431,36	3.450,88	-	-	-	-		8,00	3.450,88	100,00%
9	PISO COMPENSADO		0,00					-	-		-	-	
9.1	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²	500,00	172,20	86.100,00	-	-	-	-		500,00	86.100,00	100,00%
9.2	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	500,00	107,94	53.970,00	-	-	-	-		500,00	53.970,00	100,00%
9.3	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²	459,00	165,70	76.056,30	-	-	-	-		459,00	76.056,30	100,00%
9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	459,00	21,63	9.928,17	-	-	-	-		459,00	9.928,17	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00					-	-		-	-	
10.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	16,00	31,33	501,28	16,00	501,28	16,00	501,28	100,00%	-	-	
10.2	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	16,00	42,33	677,28	16,00	677,28	16,00	677,28	100,00%	-	-	
10.3	SINAPI (REF: 95135_10/2017) - ANDAIME DE MADEIRA	M²	6,00	41,34	248,04	6,00	248,04	6,00	248,04	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
10.4	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	CHI	50,00	64,66	3.233,00			-	-		50,00	3.233,00	100,00%
10.5	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	50,00	285,23	14.261,50			-	-		50,00	14.261,50	100,00%
11	PLANTÃO EXPO JURUA		0,00					-	-		-	-	
11.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	34,09	1.909,04			-	-		56,00	1.909,04	100,00%
11.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	33,51	1.876,56			-	-		56,00	1.876,56	100,00%
11.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	25,32	1.417,92			-	-		56,00	1.417,92	100,00%
11.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	33,64	1.883,84			-	-		56,00	1.883,84	100,00%
11.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,61	1.661,28			-	-		48,00	1.661,28	100,00%
11.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,61	1.661,28			-	-		48,00	1.661,28	100,00%
11.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	27,65	1.327,20			-	-		48,00	1.327,20	100,00%
11.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	27,65	1.327,20			-	-		48,00	1.327,20	100,00%
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES		0,00					-	-		-	-	
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00					-	-		-	-	
12.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	m²	402,50	5,38	2.165,45			-	-		402,50	2.165,45	100,00%
12.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	M	172,26	62,85	10.826,54			-	-		172,26	10.826,54	100,00%
12.2	PAREDES E PAINÉIS		0,00					-	-		-	-	
12.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023 PS	m²	671,38	139,49	93.650,80	622,44	86.824,16	622,44	86.824,16	92,71%	48,94	6.826,64	7,29%
12.3	FORRO		0,00					-	-		-	-	
12.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²	303,56	78,13	23.717,14	197,43	15.425,21	197,43	15.425,21	65,04%	106,13	8.291,94	34,96%
12.3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 08/2023	M	365,30	3,47	1.267,59	237,84	825,30	237,84	825,30	65,11%	127,46	442,29	34,89%
12.4	ESQUADRIAS		0,00					-	-		-	-	
12.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN	14,00	1.045,82	14.641,48	11,00	11.504,02	11,00	11.504,02	78,57%	3,00	3.137,46	21,43%
12.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	31,20	261,44	8.156,93	7,80	2.039,23	7,80	2.039,23	25,00%	23,40	6.117,70	75,00%
12.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	m²	3,06	310,94	951,48			-	-		3,06	951,48	100,00%
12.4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN	2,00	1.039,11	2.078,22	1,00	1.039,11	1,00	1.039,11	50,00%	1,00	1.039,11	50,00%
12.5	PINTURAS		0,00					-	-		-	-	
12.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	1.342,76	19,28	25.888,41			-	-		1.342,76	25.888,41	100,00%
12.5.2	SINAPI (REF: 88487_ 03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	m²	1.342,76	14,60	19.604,30			-	-		1.342,76	19.604,30	100,00%
12.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	303,56	35,89	10.894,77			-	-		303,56	10.894,77	100,00%
12.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	303,56	15,99	4.853,92			-	-		303,56	4.853,92	100,00%
12.5.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²	40,32	22,08	890,27			-	-		40,32	890,27	100,00%
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA		0,00					-	-		-	-	
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		0,00					-	-		-	-	
13.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m³	69,46	117,87	8.187,25	69,46	8.187,25	69,46	8.187,25	100,00%	-	-	
13.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	86,83	32,06	2.783,77	86,83	2.783,77	86,83	2.783,77	100,00%	-	-	
13.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	86,83	6,58	571,34	86,83	571,34	86,83	571,34	100,00%	-	-	
13.2	INFRA E SUPESTRUTURA		0,00					-	-		-	-	
13.2.1	ESTACAS		0,00					-	-		-	-	
13.2.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF. SINAPI (101174)	M	18,00	68,76	1.237,68	18,00	1.237,68	18,00	1.237,68	100,00%	-	-	
13.2.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	21,48	11,56	248,31	21,48	248,31	21,48	248,31	100,00%	-	-	
13.2.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	11,08	17,54	194,34	11,08	194,34	11,08	194,34	100,00%	-	-	
13.2.2	VIGAS BALDRAME		0,00					-	-		-	-	
13.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	m³	5,27	123,22	649,37	5,27	649,37	5,27	649,37	100,00%	-	-	
13.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	m²	18,81	8,93	167,97	18,81	167,97	18,81	167,97	100,00%	-	-	
13.2.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	0,31	547,41	169,70	0,31	169,70	0,31	169,70	100,00%	-	-	
13.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	42,75	85,56	3.657,69	42,75	3.657,69	42,75	3.657,69	100,00%	-	-	
13.2.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	41,54	17,43	724,04	41,54	724,04	41,54	724,04	100,00%	-	-	
13.2.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	59,31	14,12	837,46	59,31	837,46	59,31	837,46	100,00%	-	-	
13.2.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	2,56	672,16	1.720,73	2,56	1.720,73	2,56	1.720,73	100,00%	-	-	
13.2.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	2,56	354,77	908,21	2,56	908,21	2,56	908,21	100,00%	-	-	
13.2.2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	2,39	30,68	73,33	2,39	73,33	2,39	73,33	100,00%	-	-	
13.2.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	M3XKM	17,94	2,71	48,62	17,94	48,62	17,94	48,62	100,00%	-	-	
13.2.3	PILARES		0,00					-	-		-	-	
13.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	33,26	106,14	3.530,22	33,26	3.530,22	33,26	3.530,22	100,00%	-	-	
13.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	24,96	14,24	355,43	24,96	355,43	24,96	355,43	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
13.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	56,76	10,35	587,47	56,76	587,47	56,76	587,47	100,00%	-	-	
13.2.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	1,43	672,16	961,19	1,43	961,19	1,43	961,19	100,00%	-	-	
13.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	1,43	354,77	507,32	1,43	507,32	1,43	507,32	100,00%	-	-	
13.2.4	VIGAS		0,00			-		-			-	-	
13.2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	53,00	145,68	7.721,04	53,00	7.721,04	53,00	7.721,04	100,00%	-	-	
13.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	41,39	14,24	589,39	41,39	589,39	41,39	589,39	100,00%	-	-	
13.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	69,87	11,80	824,47	69,87	824,47	69,87	824,47	100,00%	-	-	
13.2.4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	2,56	672,16	1.720,73	2,56	1.720,73	2,56	1.720,73	100,00%	-	-	
13.2.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	2,56	354,77	908,21	2,56	908,21	2,56	908,21	100,00%	-	-	
13.3	PAREDES E PAINÉIS		0,00			-		-			-	-	
13.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	m²	239,44	108,75	26.039,10	239,44	26.039,10	239,44	26.039,10	100,00%	-	-	
13.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	m²	9,66	154,73	1.494,69	9,66	1.494,69	9,66	1.494,69	100,00%	-	-	
13.3.3	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	21,30	53,12	1.131,46	21,30	1.131,46	21,30	1.131,46	100,00%	-	-	
13.3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	11,40	41,55	473,67	11,40	473,67	11,40	473,67	100,00%	-	-	
13.4	REVESTIMENTOS		0,00			-		-			-	-	
13.4.1	PISOS		0,00			-		-			-	-	
13.4.1.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE -REF SINAPI (55835) - 10/2017	m³	16,13	88,62	1.429,44	16,13	1.429,44	16,13	1.429,44	100,00%	-	-	
13.4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	m²	161,33	3,92	632,41	161,33	632,41	161,33	632,41	100,00%	-	-	
13.4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERs, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	161,33	48,44	7.814,83	161,33	7.814,83	161,33	7.814,83	100,00%	-	-	
13.4.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF. SINAPI (87622)	m²	161,33	37,23	6.006,32	161,33	6.006,32	161,33	6.006,32	100,00%	-	-	
13.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023. PE	m²	15,98	73,40	1.172,93	15,98	1.172,93	15,98	1.172,93	100,00%	-	-	
13.4.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023. PE	m²	145,35	62,16	9.034,96	145,35	9.034,96	145,35	9.034,96	100,00%	-	-	
13.4.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 02/2023	M	112,30	11,80	1.325,14	112,30	1.325,14	112,30	1.325,14	100,00%	-	-	
13.4.1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	m³	6,45	1.001,73	6.461,16	6,45	6.461,16	6,45	6.461,16	100,00%	-	-	
13.4.1.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 02/2026	M	9,95	173,77	1.729,01	9,95	1.729,01	9,95	1.729,01	100,00%	-	-	
13.4.2	PAREDES		0,00			-		-			-	-	
13.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	m²	488,54	10,23	4.997,76	488,54	4.997,76	488,54	4.997,76	100,00%	-	-	
13.4.2.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	249,10	45,30	11.284,23	249,10	11.284,23	249,10	11.284,23	100,00%	-	-	
13.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022	m²	239,44	69,81	16.715,31	239,44	16.715,31	239,44	16.715,31	100,00%	-	-	
13.4.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 02/2023. PE	m²	33,28	67,07	2.232,09	33,28	2.232,09	33,28	2.232,09	100,00%	-	-	
13.4.3	TETO		0,00			-		-			-	-	
13.4.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_ 08/2023_PS	m²	161,33	53,65	8.655,35	161,33	8.655,35	161,33	8.655,35	100,00%	-	-	
13.5	COBERTURA		0,00			-		-			-	-	
13.5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÇAMENTO. AF_ 10/2025	UN	10,00	1.396,99	13.969,90	10,00	13.969,90	10,00	13.969,90	100,00%	-	-	
13.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 10/2025	m²	203,31	71,66	14.569,19	203,31	14.569,19	203,31	14.569,19	100,00%	-	-	
13.5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	m²	203,31	51,54	10.478,60	-		-			203,31	10.478,60	100,00%
13.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	36,70	38,85	1.425,80	36,70	1.425,80	36,70	1.425,80	100,00%	-	-	
13.5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	36,70	62,21	2.283,11	36,70	2.283,11	36,70	2.283,11	100,00%	-	-	
13.6	ESQUADRIAS		0,00			-		-			-	-	
13.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN	5,00	984,27	4.921,35	2,00	1.968,54	2,00	1.968,54	40,00%	3,00	2.952,81	60,00%
13.6.2	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 11/2025	UN	3,00	1.056,93	3.170,79	-		-			3,00	3.170,79	100,00%
13.6.3	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	9,43	698,66	6.588,36	9,43	6.588,36	9,43	6.588,36	100,00%	-	-	
13.6.4	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇÃO DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	52,20	618,98	32.310,76	52,20	32.310,76	52,20	32.310,76	100,00%	-	-	
13.6.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	0,72	501,11	360,80	0,72	360,80	0,72	360,80	100,00%	-	-	
13.7	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00			-		-			-	-	
13.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	m²	53,00	46,41	2.459,73	53,00	2.459,73	53,00	2.459,73	100,00%	-	-	
13.7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	488,54	4,24	2.071,41	-		-			488,54	2.071,41	100,00%
13.7.3	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 96126	m²	471,94	16,82	7.938,03	-		-			471,94	7.938,03	100,00%
13.7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	471,94	10,08	4.757,16	-		-			471,94	4.757,16	100,00%
13.7.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	161,33	23,95	3.863,85	-		-			161,33	3.863,85	100,00%
13.7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	161,33	12,86	2.074,70	-		-			161,33	2.074,70	100,00%
13.7.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	107,57	21,63	2.326,74	-		-			107,57	2.326,74	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
13.7.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	64,13	11,02	706,71			-	-		64,13	706,71	100,00%
13.7.9	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE T.U. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²	9,66	27,91	269,61			-	-		9,66	269,61	100,00%
13.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO		0,00					-	-		-	-	
13.8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	12,49	162,37	13,00	162,37	13,00	162,37	100,00%	-	-	
13.8.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	20,40	183,60	9,00	183,60	9,00	183,60	100,00%	-	-	
13.8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	36,52	219,12	6,00	219,12	6,00	219,12	100,00%	-	-	
13.8.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	16,64	532,48	32,00	532,48	32,00	532,48	100,00%	-	-	
13.8.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	9,31	37,24	4,00	37,24	4,00	37,24	100,00%	-	-	
13.8.6	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	8,90	15,46	137,59	8,90	137,59	8,90	137,59	100,00%	-	-	
13.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	692,46	4,62	3.199,17	692,46	3.199,17	692,46	3.199,17	100,00%	-	-	
13.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,60	28,26	1.006,06	35,60	1.006,06	35,60	1.006,06	100,00%	-	-	
13.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	157,20	7,09	1.114,55	157,20	1.114,55	157,20	1.114,55	100,00%	-	-	
13.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	9,84	1.082,40	110,00	1.082,40	110,00	1.082,40	100,00%	-	-	
13.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	33,94	169,70	5,00	169,70	5,00	169,70	100,00%	-	-	
13.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	51,56	103,12	2,00	103,12	2,00	103,12	100,00%	-	-	
13.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	42,45	84,90	2,00	84,90	2,00	84,90	100,00%	-	-	
13.8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	35,54	355,40	10,00	355,40	10,00	355,40	100,00%	-	-	
13.8.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	54,70	273,50	5,00	273,50	5,00	273,50	100,00%	-	-	
13.8.16	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	2,00	22,18	44,36	2,00	44,36	2,00	44,36	100,00%	-	-	
13.8.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	10,02	50,10	5,00	50,10	5,00	50,10	100,00%	-	-	
13.8.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,02	10,02	1,00	10,02	1,00	10,02	100,00%	-	-	
13.8.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	48,32	96,64	2,00	96,64	2,00	96,64	100,00%	-	-	
13.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	64,54	129,08	2,00	129,08	2,00	129,08	100,00%	-	-	
13.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,00	186,19	186,19	1,00	186,19	1,00	186,19	100,00%	-	-	
13.8.22	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	20,15	86,72	1.747,41	20,15	1.747,41	20,15	1.747,41	100,00%	-	-	
13.8.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,55	10,87	342,95	31,55	342,95	31,55	342,95	100,00%	-	-	
13.8.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,90	8,04	71,56	8,90	71,56	8,90	71,56	100,00%	-	-	
13.8.25	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	69,60	12,76	888,10	69,60	888,10	69,60	888,10	100,00%	-	-	
13.8.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,70	10,74	1.575,56	146,70	1.575,56	146,70	1.575,56	100,00%	-	-	
13.8.27	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	32,00	49,55	1.585,60	32,00	1.585,60	32,00	1.585,60	100,00%	-	-	
13.8.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	420,95	420,95	1,00	420,95	1,00	420,95	100,00%	-	-	
13.8.29	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	6,00	70,58	423,48	6,00	423,48	6,00	423,48	100,00%	-	-	
13.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00					-	-		-	-	
13.9.1	ALIMENTAÇÃO		0,00					-	-		-	-	
13.9.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	22,70	22,70	1,00	22,70	1,00	22,70	100,00%	-	-	
13.9.1.2	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	21,10	21,10	1,00	21,10	1,00	21,10	100,00%	-	-	
13.9.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	6,02	6,02	1,00	6,02	1,00	6,02	100,00%	-	-	
13.9.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,91	18,91	1,00	18,91	1,00	18,91	100,00%	-	-	
13.9.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,28	7,28	1,00	7,28	1,00	7,28	100,00%	-	-	
13.9.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,78	21,56	2,00	21,56	2,00	21,56	100,00%	-	-	
13.9.1.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	34,98	34,98	1,00	34,98	1,00	34,98	100,00%	-	-	
13.9.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	7,50	6,43	48,23	7,50	48,23	7,50	48,23	100,00%	-	-	
13.9.2	ÁGUA FRIA		0,00					-	-		-	-	
13.9.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	316,69	316,69			-	-		1,00	316,69	100,00%
13.9.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	76,76	76,76			-	-		1,00	76,76	100,00%
13.9.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	84,57	169,14			-	-		2,00	169,14	100,00%
13.9.2.4	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	417,72	835,44			-	-		2,00	835,44	100,00%
13.9.2.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	35,27	70,54			-	-		2,00	70,54	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
13.9.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	23,06	69,18	3,00	69,18	3,00	69,18	100,00%	-	-	
13.9.2.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	10,18	20,36	2,00	20,36	2,00	20,36	100,00%	-	-	
13.9.2.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	18,91	56,73	3,00	56,73	3,00	56,73	100,00%	-	-	
13.9.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,28	43,68	6,00	43,68	6,00	43,68	100,00%	-	-	
13.9.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	10,78	97,02	9,00	97,02	9,00	97,02	100,00%	-	-	
13.9.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,60	6,43	119,60	18,60	119,60	18,60	119,60	100,00%	-	-	
13.9.2.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,13	32,52	4,00	32,52	4,00	32,52	100,00%	-	-	
13.9.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,17	16,17	1,00	16,17	1,00	16,17	100,00%	-	-	
13.9.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,27	53,08	4,00	53,08	4,00	53,08	100,00%	-	-	
13.9.3	ESGOTO		0,00					-	-		-	-	
13.9.3.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	315,48	315,48	1,00	315,48	1,00	315,48	100,00%	-	-	
13.9.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	65,34	196,02	3,00	196,02	3,00	196,02	100,00%	-	-	
13.9.3.3	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	2,00	315,48	630,96	2,00	630,96	2,00	630,96	100,00%	-	-	
13.9.3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	9,62	28,86			-	-		3,00	28,86	100,00%
13.9.3.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	44,28	44,28			-	-		1,00	44,28	100,00%
13.9.3.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	41,41	82,82			-	-		2,00	82,82	100,00%
13.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,59	9,59	1,00	9,59	1,00	9,59	100,00%	-	-	
13.9.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,00	22,00	2,00	22,00	2,00	22,00	100,00%	-	-	
13.9.3.9	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN	1,00	2.295,45	2.295,45			-	-		1,00	2.295,45	100,00%
13.9.3.10	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13.1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.826,34	2.826,34			-	-		1,00	2.826,34	100,00%
13.9.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,19	22,38	2,00	22,38	2,00	22,38	100,00%	-	-	
13.9.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	16,47	49,41	3,00	49,41	3,00	49,41	100,00%	-	-	
13.9.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	33,15	66,30	2,00	66,30	2,00	66,30	100,00%	-	-	
13.9.3.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	11,00	22,00	2,00	22,00	2,00	22,00	100,00%	-	-	
13.9.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	15,86	15,86	1,00	15,86	1,00	15,86	100,00%	-	-	
13.9.3.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	40,49	80,98	2,00	80,98	2,00	80,98	100,00%	-	-	
13.9.3.17	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,90	40,02	596,30	14,90	596,30	14,90	596,30	100,00%	-	-	
13.9.3.18	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	23,46	46,92	2,00	46,92	2,00	46,92	100,00%	-	-	
13.9.3.19	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,10	28,72	203,91	7,10	203,91	7,10	203,91	100,00%	-	-	
13.9.4	VENTILAÇÃO		0,00					-	-		-	-	
13.9.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	9,59	19,18			-	-		2,00	19,18	100,00%
13.9.4.2	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,45	9,45			-	-		1,00	9,45	100,00%
13.9.4.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,90	12,00	58,80			-	-		4,90	58,80	100,00%
13.9.4.4	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	16,51	33,02			-	-		2,00	33,02	100,00%
13.10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		0,00					-	-		-	-	
13.10.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	3,00	16,57	49,71			-	-		3,00	49,71	100,00%
13.10.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN	2,00	37,16	74,32			-	-		2,00	74,32	100,00%
13.10.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026, PE	UN	1,00	198,40	198,40			-	-		1,00	198,40	100,00%
13.10.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	18,35	73,40			-	-		4,00	73,40	100,00%
13.10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	52,29	209,16			-	-		4,00	209,16	100,00%
13.11	CLIMATIZAÇÃO		0,00					-	-		-	-	
13.11.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN	4,00	44,92	179,68			-	-		4,00	179,68	100,00%
13.11.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,00	40,33	645,28			-	-		16,00	645,28	100,00%
13.11.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	4,00	61,87	247,48			-	-		4,00	247,48	100,00%
13.11.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M	12,00	102,18	1.226,16			-	-		12,00	1.226,16	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
13.11.5	CABO FLEXIVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M	16,00	8,78	140,48			-	-		16,00	140,48	100,00%
13.11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	M	16,00	19,10	305,60			-	-		16,00	305,60	100,00%
13.11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4,00	8,89	35,56			-	-		4,00	35,56	100,00%
13.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4,00	8,23	32,92			-	-		4,00	32,92	100,00%
13.11.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	4,00	6,07	24,28			-	-		4,00	24,28	100,00%
13.11.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021_PSE	UN	2,00	9.834,24	19.668,48			-	-		2,00	19.668,48	100,00%
13.11.11	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021_PSE	UN	2,00	13.654,69	27.309,38			-	-		2,00	27.309,38	100,00%
13.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00					-	-		-	-	
13.12.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00					-	-		-	-	
13.12.1.1	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	232,59	465,18			-	-		2,00	465,18	100,00%
13.12.1.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	3,00	70,72	212,16			-	-		3,00	212,16	100,00%
13.12.1.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²	2,00	656,03	1.312,06			-	-		2,00	1.312,06	100,00%
13.12.1.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²	2,45	1.064,63	2.608,34			-	-		2,45	2.608,34	100,00%
13.12.1.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	1,00	199,78	199,78			-	-		1,00	199,78	100,00%
13.12.1.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	123,05	246,10			-	-		2,00	246,10	100,00%
13.12.2	IDENTIFICAÇÃO VISUAL		0,00					-	-		-	-	
13.12.2.1	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN	4,00	51,65	206,60			-	-		4,00	206,60	100,00%
13.12.2.2	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Copia da SINAPI (84122)	UN	1,00	993,75	993,75			-	-		1,00	993,75	100,00%
13.12.2.3	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUÍDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.107,92	2.107,92			-	-		1,00	2.107,92	100,00%
13.12.3	PAISAGISMO		0,00					-	-		-	-	
13.12.3.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_ 07/2024	m²	106,90	4,04	431,88			-	-		106,90	431,88	100,00%
13.12.3.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 07/2024	m²	91,80	17,13	1.572,53			-	-		91,80	1.572,53	100,00%
13.12.3.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_ 07/2024	UN	2,00	431,99	863,98			-	-		2,00	863,98	100,00%
13.12.3.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	4,00	224,60	898,40			-	-		4,00	898,40	100,00%
13.12.3.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,00	162,81	3.256,20			-	-		20,00	3.256,20	100,00%
13.12.3.6	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²	15,10	233,93	3.532,34			-	-		15,10	3.532,34	100,00%
14	PAISAGISMO		0,00					-	-		-	-	
14.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	60,00	580,78	34.846,80			-	-		60,00	34.846,80	100,00%
14.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20,00	162,81	3.256,20			-	-		20,00	3.256,20	100,00%
14.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	20,00	224,60	4.492,00			-	-		20,00	4.492,00	100,00%
14.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_ 07/2024	m²	140,00	5,88	823,20			-	-		140,00	823,20	100,00%
14.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	140,00	22,31	3.123,40			-	-		140,00	3.123,40	100,00%
14.6	AGAVE - DRAGÃO	UN	190,00	70,56	13.406,40			-	-		190,00	13.406,40	100,00%
14.7	BARBA DE SERPENTE	UN	286,00	16,64	4.759,04			-	-		286,00	4.759,04	100,00%
14.8	ESPADA SÃO JORGE	UN	190,00	61,51	11.686,90			-	-		190,00	11.686,90	100,00%
14.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_ 01/2024	m³	5,00	455,38	2.276,90			-	-		5,00	2.276,90	100,00%
15	ESPAÇO INDUSTRIA		0,00					-	-		-	-	
15.1	PORTAL							-	-		-	-	
15.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_ 07/2023_PS	m²	34,16	179,87	6.144,36			-	-		34,16	6.144,36	100,00%
15.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	23,68	19,28	456,55			-	-		23,68	456,55	100,00%
15.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	23,68	13,21	312,81			-	-		23,68	312,81	100,00%
15.1.4	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	10,49	55,69	584,19			-	-		10,49	584,19	100,00%
15.2	ALVENARIA												
15.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,78	107,33	3.410,95	31,78	3.410,95	31,78	3.410,95	100,00%	-	-	
15.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	55,16	8,83	487,06	55,16	487,06	55,16	487,06	100,00%	-	-	
15.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	55,16	69,81	3.850,72	55,16	3.850,72	55,16	3.850,72	100,00%	-	-	
15.3	ESQUADRIAS												
15.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.045,82	4.183,28			-	-		4,00	4.183,28	100,00%
15.4	LOUÇAS E METAIS												
15.4.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	417,72	835,44			-	-		2,00	835,44	100,00%
15.5	PAREDES E PAINÉIS												
15.5.1	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	168,86	271,97	45.924,85	168,86	45.924,85	168,86	45.924,85	100,00%	-	-	
15.5.2	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	373,52	380,17	142.001,10	373,52	142.001,10	373,52	142.001,10	100,00%	-	-	
15.6	PINTURA												

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
15.6.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	22,08	370,94			-	-		16,80	370,94	100,00%
15.6.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1.831,79	23,40	42.863,89			-	-		1.831,79	42.863,89	100,00%
15.6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.831,79	16,75	30.682,48			-	-		1.831,79	30.682,48	100,00%
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS		0,00					-	-		-	-	
16.1	BAIAS		0,00					-	-		-	-	
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,79	100,16	279,45	2,79	279,45	2,79	279,45	100,00%	-	-	
16.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	9,00	111,08	999,72	9,00	999,72	9,00	999,72	100,00%	-	-	
16.1.3	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	11,52	555,82	6.403,05			-	-		11,52	6.403,05	100,00%
16.1.4	FERROLHO COM TRANÇA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	16,00	150,58	2.409,28	16,00	2.409,28	16,00	2.409,28	100,00%	-	-	
16.1.5	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "20 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	152,20	116,56	17.740,43	152,20	17.740,43	152,20	17.740,43	100,00%	-	-	
16.1.6	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	6,75	179,93	1.214,53	6,75	1.214,53	6,75	1.214,53	100,00%	-	-	
16.1.7	CABRO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	86,80	16,92	1.468,66	86,80	1.468,66	86,80	1.468,66	100,00%	-	-	
16.1.8	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	646,20	33,42	21.596,00	646,20	21.596,00	646,20	21.596,00	100,00%	-	-	
16.1.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	129,24	13,21	1.707,26			-	-		129,24	1.707,26	100,00%
16.1.10	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	12,96	431,36	5.590,43	12,96	5.590,43	12,96	5.590,43	100,00%	-	-	
16.2	PORTAL AGRO I		0,00					-	-		-	-	
16.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023. PS	m²	51,60	179,87	9.281,29			-	-		51,60	9.281,29	100,00%
16.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	37,20	19,28	717,22			-	-		37,20	717,22	100,00%
16.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	37,20	13,21	491,41			-	-		37,20	491,41	100,00%
16.2.4	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECobrIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²	14,40	55,69	801,94			-	-		14,40	801,94	100,00%
16.3	PORTAL AGRO II		0,00					-	-		-	-	
16.3.1	MOVIMENTO DE TERRA		0,00					-	-		-	-	
16.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,88	100,16	88,14	0,88	88,14	0,88	88,14	100,00%	-	-	
16.3.1.2	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,14	60,73	8,50	0,14	8,50	0,14	8,50	100,00%	-	-	
16.3.2	SUPERESTRUTURA		0,00					-	-		-	-	
16.3.2.1	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "20 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	17,00	116,56	1.981,52	17,00	1.981,52	17,00	1.981,52	100,00%	-	-	
16.3.2.2	CABRO APARELHADO "7,5 X 7,5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	72	16,92	1.218,24			-	-		72,00	1.218,24	100,00%
16.3.2.3	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	210,00	33,42	7.018,20			-	-		210,00	7.018,20	100,00%
16.3.2.4	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PANEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²	4,00	46,11	184,44			-	-		4,00	184,44	100,00%
16.3.2.5	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	68,64	380,17	26094,8688	21,12	8.029,19	21,12	8.029,19	30,77%	47,52	18.065,68	69,23%
16.3.3	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
16.3.3.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	33,44	22,08	738,36			-	-		33,44	738,36	100,00%
16.3.3.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	68,64	23,40	1.606,18			-	-		68,64	1.606,18	100,00%
16.3.3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,64	16,75	1.149,72			-	-		68,64	1.149,72	100,00%
16.4	CERCAMENTO DO AGRO		0,00					-	-		-	-	
16.4.1	MOVIMENTO DE TERRA		0,00					-	-		-	-	
16.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,38	100,16	438,70	4,38	438,70	4,38	438,70	100,00%	-	-	
16.4.1.2	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,58	60,73	95,95	1,58	95,95	1,58	95,95	100,00%	-	-	
16.4.2	SUPERESTRUTURA		0,00					-	-		-	-	
16.4.2.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	210,00	97,52	20.479,20	210,00	20.479,20	210,00	20.479,20	100,00%	-	-	
16.4.3	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00					-	-		-	-	
16.4.3.1	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	546,00	27,44	14.982,24			-	-		546,00	14.982,24	100,00%
16.4.4	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
16.4.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	126,00	22,08	2.782,08			-	-		126,00	2.782,08	100,00%
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)		0,00					-	-		-	-	
17.1	ESQUADRIAS		0,00					-	-		-	-	
17.1.1	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	17,01	555,82	9.454,50	17,01	9.454,50	17,01	9.454,50	100,00%	-	-	
17.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00					-	-		-	-	
17.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,90	100,16	1.893,02	18,90	1.893,02	18,90	1.893,02	100,00%	-	-	
17.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	37,80	4,07	153,85	37,80	153,85	37,80	153,85	100,00%	-	-	
17.2.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,60	60,73	765,20	12,60	765,20	12,60	765,20	100,00%	-	-	
17.2.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	21,00	373,42	7.841,82			-	-		21,00	7.841,82	100,00%
17.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	160,00	26,77	4.283,20	160,00	4.283,20	160,00	4.283,20	100,00%	-	-	
17.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	140,00	35,44	4.961,60	140,00	4.961,60	140,00	4.961,60	100,00%	-	-	
17.2.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	13,27	278,67	21,00	278,67	21,00	278,67	100,00%	-	-	
17.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	14,75	309,75	21,00	309,75	21,00	309,75	100,00%	-	-	
17.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	14,31	186,03	13,00	186,03	13,00	186,03	100,00%	-	-	
17.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	19,78	257,14	13,00	257,14	13,00	257,14	100,00%	-	-	
17.2.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	27,06	432,96	16,00	432,96	16,00	432,96	100,00%	-	-	
17.2.12	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,67	112,71	13,00	112,71	13,00	112,71	100,00%	-	-	
17.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00					-	-		-	-	
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,00	100,16	1.001,60	10,00	1.001,60	10,00	1.001,60	100,00%	-	-	
17.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	20,00	4,07	81,40	20,00	81,40	20,00	81,40	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
17.3.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,00	60,73	303,65	5,00	303,65	5,00	303,65	100,00%	-	-	
17.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	40,02	2.401,20	60,00	2.401,20	60,00	2.401,20	100,00%	-	-	
17.3.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	23,46	1.407,60	60,00	1.407,60	60,00	1.407,60	100,00%	-	-	
17.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	11,00	440,00	40,00	440,00	40,00	440,00	100,00%	-	-	
17.3.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	15,68	188,16	12,00	188,16	12,00	188,16	100,00%	-	-	
17.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	28,02	588,42	21,00	588,42	21,00	588,42	100,00%	-	-	
17.3.9	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	18,37	385,77	21,00	385,77	21,00	385,77	100,00%	-	-	
17.3.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50	111,08	277,70	2,50	277,70	2,50	277,70	100,00%	-	-	
17.3.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	47,53	998,13	21,00	998,13	21,00	998,13	100,00%	-	-	
17.4	PINTURA		0,00			-	-	-	-				
17.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	970,29	22,08	21.424,00	-	-	-	-		970,29	21.424,00	100,00%
17.5	TELHAMENTO		0,00			-	-	-	-		-	-	
17.5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.357,02	47,03	63.820,65	1.357,02	63.820,65	1.357,02	63.820,65	100,00%	-	-	
17.5.2	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	76,26	54,29	4.140,16	76,26	4.140,16	76,26	4.140,16	100,00%	-	-	
17.6	DRENAGEM PLUVIAL		0,00			-	-	-	-		-	-	
17.6.1	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,21	66,55	10.063,03	151,21	10.063,03	151,21	10.063,03	100,00%	-	-	
17.6.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	74,05	28,92	2.141,53	74,05	2.141,53	74,05	2.141,53	100,00%	-	-	
17.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	43,29	692,64	16,00	692,64	16,00	692,64	100,00%	-	-	
17.6.4	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,00	13,67	54,68	4,00	54,68	4,00	54,68	100,00%	-	-	
17.7	ESTRUTURA METÁLICA		0,00			-	-	-	-		-	-	
17.7.1	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.087,88	5,48	22.401,58	4.087,88	22.401,58	4.087,88	22.401,58	100,00%	-	-	
17.7.2	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.409,78	9,61	13.547,99	1.409,78	13.547,99	1.409,78	13.547,99	100,00%	-	-	
17.7.3	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.114,53	16,72	18.634,94	1.114,53	18.634,94	1.114,53	18.634,94	100,00%	-	-	
17.7.4	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.748,04	9,26	25.446,85	2.748,04	25.446,85	2.748,04	25.446,85	100,00%	-	-	
17.7.5	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2,25	KG	2.150,34	15,29	32.878,70	2.150,34	32.878,70	2.150,34	32.878,70	100,00%	-	-	
17.7.6	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,39	7,36	834,55	113,39	834,55	113,39	834,55	100,00%	-	-	
17.7.7	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	86,87	4,28	371,80	86,87	371,80	86,87	371,80	100,00%	-	-	
17.7.8	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	193,17	8,22	1.587,86	193,17	1.587,86	193,17	1.587,86	100,00%	-	-	
17.7.9	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	94,68	11,74	1.111,54	94,68	1.111,54	94,68	1.111,54	100,00%	-	-	
17.7.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	24,95	32.732,15	1.311,91	32.732,15	1.311,91	32.732,15	100,00%	-	-	
17.7.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1.311,91	24,57	32.233,63	1.311,91	32.233,63	1.311,91	32.233,63	100,00%	-	-	
17.8	ESTRUTURAL - BLOCOS		0,00			-	-	-	-		-	-	
17.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3,39	112,08	379,95	3,39	379,95	3,39	379,95	100,00%	-	-	
17.8.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	8,47	8,93	75,64	8,47	75,64	8,47	75,64	100,00%	-	-	
17.8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,47	52,11	441,37	8,47	441,37	8,47	441,37	100,00%	-	-	
17.8.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	54,04	141,16	7.628,29	54,04	7.628,29	54,04	7.628,29	100,00%	-	-	
17.8.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,30	21,28	1.176,78	55,30	1.176,78	55,30	1.176,78	100,00%	-	-	
17.8.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,90	18,53	2.147,63	115,90	2.147,63	115,90	2.147,63	100,00%	-	-	
17.8.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,80	13,95	1.517,76	108,80	1.517,76	108,80	1.517,76	100,00%	-	-	
17.8.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,89	672,16	3.959,02	5,89	3.959,02	5,89	3.959,02	100,00%	-	-	
17.8.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,89	49,33	290,55	5,89	290,55	5,89	290,55	100,00%	-	-	
17.8.10	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	106,02	19,01	2.015,44	106,02	2.015,44	106,02	2.015,44	100,00%	-	-	
17.9	VIGAS BALDRAME		0,00			-	-	-	-		-	-	
17.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	14,78	123,22	1.821,19	14,78	1.821,19	14,78	1.821,19	100,00%	-	-	
17.9.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	36,94	8,93	329,87	36,94	329,87	36,94	329,87	100,00%	-	-	
17.9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	36,94	48,44	1.789,37	36,94	1.789,37	36,94	1.789,37	100,00%	-	-	
17.9.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,84	66,57	12.371,37	185,84	12.371,37	185,84	12.371,37	100,00%	-	-	
17.9.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,40	17,43	2.830,63	162,40	2.830,63	162,40	2.830,63	100,00%	-	-	
17.9.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	477,30	14,12	6.739,48	477,30	6.739,48	477,30	6.739,48	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
17.9.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	14,86	672,16	9.988,30	14,86	9.988,30	14,86	9.988,30	100,00%	-	-	
17.9.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	14,86	49,33	733,04	14,86	733,04	14,86	733,04	100,00%	-	-	
17.9.9	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	267,48	19,01	5.084,79	267,48	5.084,79	267,48	5.084,79	100,00%	-	-	
17.10	INFRAESTRUTURA - ESTACAS		0,00					-	-		-	-	
17.10.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	146,00	22,79	3.327,34	146,00	3.327,34	146,00	3.327,34	100,00%	-	-	
17.10.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_ 09/2021_ PS	KG	145,70	16,52	2.406,96	145,70	2.406,96	145,70	2.406,96	100,00%	-	-	
17.10.3	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_ 09/2021_ PS	KG	447,10	9,95	4.448,65	447,10	4.448,65	447,10	4.448,65	100,00%	-	-	
17.10.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	m³	6,96	1.341,37	9.335,94	6,96	9.335,94	6,96	9.335,94	100,00%	-	-	
17.10.5	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	125,28	19,01	2.381,57	125,28	2.381,57	125,28	2.381,57	100,00%	-	-	
17.11	INFRA E SUPERESTRUTURA - 1 BOX												
17.11.1	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m³	1,44	703,11	1.012,48	1,44	1.012,48	1,44	1.012,48	100,00%	-	-	
17.11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	11,62	154,62	1.796,68	11,62	1.796,68	11,62	1.796,68	100,00%	-	-	
17.11.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	111,55	10,35	1.154,54	111,55	1.154,54	111,55	1.154,54	100,00%	-	-	
17.11.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	113,23	14,24	1.612,40	113,23	1.612,40	113,23	1.612,40	100,00%	-	-	
17.11.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	0,46	672,16	309,19	0,46	309,19	0,46	309,19	100,00%	-	-	
17.11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	0,46	354,77	163,19	0,46	163,19	0,46	163,19	100,00%	-	-	
17.12	PAREDES E PAINÉIS												
17.12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	m²	28,29	107,33	3.036,37	28,29	3.036,37	28,29	3.036,37	100,00%	-	-	
17.12.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	m²	1,76	262,72	462,39	1,76	462,39	1,76	462,39	100,00%	-	-	
17.12.3	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	39,85	217,09	8.651,04	39,85	8.651,04	39,85	8.651,04	100,00%	-	-	
17.12.4	PAREDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367 AF_06/2017_P	m²	44,10	32,38	1.427,96	44,10	1.427,96	44,10	1.427,96	100,00%	-	-	
18	SECOM		0,00					-	-		-	-	
18.1	PAREDES E PAINÉIS		0,00					-	-		-	-	
18.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF_ 07/2023 PS	m²	165,64	139,49	23.105,12	165,64	23.105,12	165,64	23.105,12	100,00%	-	-	
18.2	FORRO		0,00					-	-		-	-	
18.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_ PS	m²	92,84	78,13	7.253,59	92,84	7.253,59	92,84	7.253,59	100,00%	-	-	
18.3	ESQUADRIAS		0,00					-	-		-	-	
18.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN	4,00	1.045,82	4.183,28	4,00	4.183,28	4,00	4.183,28	100,00%	-	-	
18.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	5,85	261,44	1.529,42	5,85	1.529,42	5,85	1.529,42	100,00%	-	-	
18.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	0,28	501,11	140,31	0,28	140,31	0,28	140,31	100,00%	-	-	
18.4	PISO		0,00					-	-		-	-	
18.4.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 10/2025	m²	92,84	0,72	66,84	92,84	66,84	92,84	66,84	100,00%	-	-	
18.5	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
18.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	331,27	19,28	6.386,89	-		-			331,27	6.386,89	100,00%
18.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	331,27	13,21	4.376,08	-		-			331,27	4.376,08	100,00%
18.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	92,84	35,89	3.332,03	-		-			92,84	3.332,03	100,00%
18.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	92,84	15,99	1.484,51	-		-			92,84	1.484,51	100,00%
18.5.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²	16,80	22,08	370,94	-		-			16,80	370,94	100,00%
18.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		0,00					-	-		-	-	
18.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	1,00	417,72	417,72	-		-			1,00	417,72	100,00%
18.6.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 14 X 35" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	1,00	308,39	308,39	-		-			1,00	308,39	100,00%
18.6.3	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	1,00	880,20	880,20	-		-			1,00	880,20	100,00%
18.6.4	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	1,00	182,93	182,93	-		-			1,00	182,93	100,00%
18.6.5	SINAPI (REF: 104667_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_ 05/2023	UN	2,00	110,60	221,20	2,00	221,20	2,00	221,20	100,00%	-	-	
18.6.6	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_ 05/2023	UN	2,00	158,29	316,58	2,00	316,58	2,00	316,58	100,00%	-	-	
18.6.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	2.826,34	2.826,34	-		-			1,00	2.826,34	100,00%
18.6.8	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	1.834,53	1.834,53	-		-			1,00	1.834,53	100,00%
18.6.9	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATÉ 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00	2.090,33	2.090,33	-		-			1,00	2.090,33	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
19	ESPAÇO DERACRE		0,00					-	-		-	-	
19.1	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
19.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	205,92	54,43	11.208,23			-	-		205,92	11.208,23	100,00%
19.1.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	182,40	4,24	773,38			-	-		182,40	773,38	100,00%
19.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	182,40	19,28	3.516,67			-	-		182,40	3.516,67	100,00%
19.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	182,40	13,21	2.409,50			-	-		182,40	2.409,50	100,00%
19.1.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	322,70	2,23	719,62			-	-		322,70	719,62	100,00%
19.1.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	322,70	23,40	7.551,18			-	-		322,70	7.551,18	100,00%
19.1.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	322,70	17,08	5.511,72			-	-		322,70	5.511,72	100,00%
19.1.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	60,75	21,63	1.314,02			-	-		60,75	1.314,02	100,00%
19.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00					-	-		-	-	
19.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	29,51	118,04	4,00	118,04	4,00	118,04	100,00%	-	-	
19.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	15,86	63,44	4,00	63,44	4,00	63,44	100,00%	-	-	
19.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	40,02	800,40			-	-		20,00	800,40	100,00%
19.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	28,72	574,40			-	-		20,00	574,40	100,00%
19.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	45,05	90,10	2,00	90,10	2,00	90,10	100,00%	-	-	
19.2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	47,53	190,12	4,00	190,12	4,00	190,12	100,00%	-	-	
19.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	13,44	80,64	6,00	80,64	6,00	80,64	100,00%	-	-	
19.2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	13,30	159,60	12,00	159,60	12,00	159,60	100,00%	-	-	
19.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,80	39,20	4,00	39,20	4,00	39,20	100,00%	-	-	
19.2.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,27	53,08	4,00	53,08	4,00	53,08	100,00%	-	-	
19.3	LOUÇAS E METAIS		0,00					-	-		-	-	
19.3.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	417,72	835,44			-	-		2,00	835,44	100,00%
19.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	569,19	1.138,38			-	-		2,00	1.138,38	100,00%
19.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00					-	-		-	-	
19.4.1	GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	36,00	72,78	2.620,08	36,00	2.620,08	36,00	2.620,08	100,00%	-	-	
19.4.2	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	15,00	179,93	2.698,95			-	-		15,00	2.698,95	100,00%
20	CASA DE FARINHA		0,00					-	-		-	-	
20.1	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²	3,60	53,60	192,96			-	-		3,60	192,96	100,00%
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,07	166,24	1.175,32	7,07	1.175,32	7,07	1.175,32	100,00%	-	-	
20.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	7,07	8,83	62,43	7,07	62,43	7,07	62,43	100,00%	-	-	
21	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS		0,00					-	-		-	-	
21.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	450,00	35,44	15.948,00	450,00	15.948,00	450,00	15.948,00	100,00%	-	-	
21.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	18,23	364,60	20,00	364,60	20,00	364,60	100,00%	-	-	
21.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,15	263,00	20,00	263,00	20,00	263,00	100,00%	-	-	
21.4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,76	195,20	20,00	195,20	20,00	195,20	100,00%	-	-	
21.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	9,80	196,00	20,00	196,00	20,00	196,00	100,00%	-	-	
22	JARDINEIRAS		0,00					-	-		-	-	
22.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,50	67,66	304,47	4,50	304,47	4,50	304,47	100,00%	-	-	
23	SEFAZ E SAMU		0,00					-	-		-	-	
23.1	PAREDES E PAINÉIS		0,00					-	-		-	-	
23.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	168,90	139,49	23.559,86	84,45	11.779,93	84,45	11.779,93	50,00%	84,45	11.779,93	50,00%
23.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	85,60	8,83	755,85			-	-		85,60	755,85	100,00%
23.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	85,60	69,81	5.975,74			-	-		85,60	5.975,74	100,00%
23.2	FORRO		0,00					-	-		-	-	
23.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	64,33	78,13	5.026,10	32,17	2.513,44	32,17	2.513,44	50,01%	32,16	2.512,66	49,99%
23.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	82,40	3,47	285,93	41,20	142,96	41,20	142,96	50,00%	41,20	142,96	50,00%
23.3	ESQUADRIAS		0,00					-	-		-	-	
23.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.039,11	2.078,22			-	-		2,00	2.078,22	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
23.3.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO. COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_ 10/2025	m²	14,70	370,37	5.444,44			-	-		14,70	5.444,44	100,00%
23.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR. BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM. VIDRO INCLUSO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM. SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	0,48	501,11	240,53			-	-		0,48	240,53	100,00%
23.3.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE. FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	7,80	261,44	2.039,23			-	-		7,80	2.039,23	100,00%
23.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		0,00					-	-		-	-	
23.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	200,00	26,77	5.354,00	100,00	2.677,00	100,00	2.677,00	50,00%	100,00	2.677,00	50,00%
23.4.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	6,00	16,17	97,02	3,00	48,51	3,00	48,51	50,00%	3,00	48,51	50,00%
23.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	16,00	9,80	156,80	8,00	78,40	8,00	78,40	50,00%	8,00	78,40	50,00%
23.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	6,00	34,84	209,04			-	-		6,00	209,04	100,00%
23.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	4,00	18,91	75,64			-	-		4,00	75,64	100,00%
23.4.6	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	2,00	12,06	24,12			-	-		2,00	24,12	100,00%
23.4.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	2,00	192,34	384,68			-	-		2,00	384,68	100,00%
23.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,00					-	-		-	-	
23.5.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2,00	18,20	36,40	1,00	18,20	1,00	18,20	50,00%	1,00	18,20	50,00%
23.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	20,00	40,02	800,40	10,00	400,20	10,00	400,20	50,00%	10,00	400,20	50,00%
23.5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	8,00	28,72	229,76	4,00	114,88	4,00	114,88	50,00%	4,00	114,88	50,00%
23.5.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	2,00	45,05	90,10	1,00	45,05	1,00	45,05	50,00%	1,00	45,05	50,00%
23.5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	4,00	28,02	112,08	2,00	56,04	2,00	56,04	50,00%	2,00	56,04	50,00%
23.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2,00	15,86	31,72	1,00	15,86	1,00	15,86	50,00%	1,00	15,86	50,00%
23.5.7	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2021	UN	2,00	62,13	124,26	1,00	62,13	1,00	62,13	50,00%	1,00	62,13	50,00%
23.5.8	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	52,84	105,68	1,00	52,84	1,00	52,84	50,00%	1,00	52,84	50,00%
23.5.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	2,00	13.395,20	26.790,40	1,00	13.395,20	1,00	13.395,20	50,00%	1,00	13.395,20	50,00%
23.6	LOUÇAS E METAIS		0,00					-	-		-	-	
23.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	417,72	835,44	1,00	417,72	1,00	417,72	50,00%	1,00	417,72	50,00%
23.6.2	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0,80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM. ASSENTADA.	UN	2,00	1.241,18	2.482,36	1,00	1.241,18	1,00	1.241,18	50,00%	1,00	1.241,18	50,00%
23.6.3	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 02/2026	UN	2,00	232,59	465,18			-	-		2,00	465,18	100,00%
23.7	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
23.7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	403,34	19,28	7.776,40	201,67	3.888,20	201,67	3.888,20	50,00%	201,67	3.888,20	50,00%
23.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	403,34	13,21	5.328,12			-	-		403,34	5.328,12	100,00%
23.7.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	65,49	35,89	2.350,44			-	-		65,49	2.350,44	100,00%
23.7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	65,49	15,99	1.047,19			-	-		65,49	1.047,19	100,00%
23.7.5	PINTURA VERNIZ (NCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²	101,28	22,08	2.236,26			-	-		101,28	2.236,26	100,00%
23.8	REVESTIMENTO CERÂMICO		0,00					-	-		-	-	
23.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 02/2023_PE	m²	180,00	62,16	11.188,80	6,08	377,93	6,08	377,93	3,38%	173,92	10.810,87	96,62%
24	DECK PISCICULTURA		0,00					-	-		-	-	
24.1	MOVIMENTO DE TERRA		0,00					-	-		-	-	
24.1.1	SBC REF:(020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APOLOAMENTO	m³	8,10	127,26	1.030,81			-	-		8,10	1.030,81	100,00%
24.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_ 09/2024	m³	20,25	100,16	2.028,24			-	-		20,25	2.028,24	100,00%
24.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	m²	81,00	8,93	723,33			-	-		81,00	723,33	100,00%
24.1.4	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	m³	1,79	60,73	108,71			-	-		1,79	108,71	100,00%
24.2	INFRAESTRUTURA		0,00					-	-		-	-	
24.2.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	75,00	60,32	4.524,00			-	-		75,00	4.524,00	100,00%
24.2.2	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"X5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	149,55	34,81	5.205,84			-	-		149,55	5.205,84	100,00%
24.3	SUPERESTRUTURA		0,00					-	-		-	-	
24.3.1	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_ 09/2020	m²	71,45	179,93	12.856,00			-	-		71,45	12.856,00	100,00%
24.3.2	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	30,00	97,52	2.925,60			-	-		30,00	2.925,60	100,00%
24.4	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
24.4.1	PINTURA VERNIZ (NCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²	89,05	22,08	1.966,22			-	-		89,05	1.966,22	100,00%
24.5	SERVIÇOS DIVERSOS		0,00					-	-		-	-	
24.5.1	SBC (REF: 130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M	68,80	27,44	1.887,87			-	-		68,80	1.887,87	100,00%
24.5.2	ESCADA DE MADEIRA	m²	4,35	144,71	629,49			-	-		4,35	629,49	100,00%
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS		0,00					-	-		-	-	
25.1	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	603,17	9,61	5.796,46			-	-		603,17	5.796,46	100,00%
25.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	UN	37,00	15,23	563,51			-	-		37,00	563,51	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
25.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	651,11	10,03	6.530,63			-	-		651,11	6.530,63	100,00%
25.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	292,15	3,50	1.022,53			-	-		292,15	1.022,53	100,00%
25.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	53,49	11,47	613,53			-	-		53,49	613,53	100,00%
25.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	23,96	29,65	710,41			-	-		23,96	710,41	100,00%
25.7	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168,00	11,48	1.928,64			-	-		168,00	1.928,64	100,00%
25.8	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²	168,00	11,05	1.856,40			-	-		168,00	1.856,40	100,00%
25.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5.666,00	1,15	6.515,90			-	-		5.666,00	6.515,90	100,00%
25.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	11.260,00	0,64	7.206,40			-	-		11.260,00	7.206,40	100,00%
25.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	504,00	2,16	1.088,64			-	-		504,00	1.088,64	100,00%
26	LIMPEZA FINAL		0,00					-	-		-	-	
26.1	SINAPI (REF: 9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.000,00	4,21	8.420,00			-	-		2.000,00	8.420,00	100,00%
27	PÓRTICO PRINCIPAL		0,00					-	-		-	-	
27.1	FORRO, ACM E LETREIRO		0,00					-	-		-	-	
27.1.1	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²	198,22	181,85	36.046,31						198,22	36.046,31	100,00%
27.1.2	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	118,04	66,82	7.887,43	118,04	7.887,43	118,04	7.887,43	100,00%	-	-	
27.1.3	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	2,00	3.853,73	7.707,46	2,00	7.707,46	2,00	7.707,46	100,00%	-	-	
27.2	PINTURA		0,00					-	-		-	-	
27.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,00	4,24	55,12			-	-		13,00	55,12	100,00%
27.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	13,00	31,48	409,24			-	-		13,00	409,24	100,00%
27.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,00	13,21	171,73			-	-		13,00	171,73	100,00%
28	ESPAÇO PCD												
28.1	PISOS												
28.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,36	100,16	36,06	0,36	36,06	0,36	36,06	100,00%	-	-	
28.1.2	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	16,00	60,32	965,12	16,00	965,12	16,00	965,12	100,00%	-	-	
28.1.3	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	30,60	179,93	5.505,86	30,60	5.505,86	30,60	5.505,86	100,00%	-	-	
28.2	GUARDA CORPO												
28.2.1	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	37,80	66,21	2.502,74	37,80	2.502,74	37,80	2.502,74	100,00%	-	-	
28.3	PINTURA												
28.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	68,40	16,75	1.145,70			-	-		68,40	1.145,70	100,00%
29	PALCO PRINCIPAL												
29.1	VEDAÇÃO												
29.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	455,12	75,50	34.361,56	263,12	19.865,56	263,12	19.865,56	57,81%	192,00	14.496,00	42,19%
29.2	CAMARIM												
29.2.1	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	62,95	380,17	23.931,70			-	-		62,95	23.931,70	100,00%
29.2.2	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	4,78	271,97	1.300,02			-	-		4,78	1.300,02	100,00%
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP												
30.1	PAREDES E PAINÉIS												
30.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	161,04	139,49	22.463,47	104,31	14.550,20	104,31	14.550,20	64,77%	56,73	7.913,27	35,23%
30.2	FORRO												
30.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	61,12	78,13	4.775,31	40,80	3.187,70	40,80	3.187,70	66,75%	20,32	1.587,60	33,25%
30.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	64,29	3,47	223,09	45,60	158,23	45,60	158,23	70,93%	18,69	64,85	29,07%
30.3	PINTURA												
30.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	322,09	19,28	6.209,90			-	-		322,09	6.209,90	100,00%
30.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	322,09	13,21	4.254,81			-	-		322,09	4.254,81	100,00%
30.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	64,08	35,89	2.299,83			-	-		64,08	2.299,83	100,00%
30.3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	64,08	15,99	1.024,64			-	-		64,08	1.024,64	100,00%
30.4	ESQUADRIAS												
30.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.007,28	1.007,28			-	-		1,00	1.007,28	100,00%
30.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	95,76	95,76			-	-		1,00	95,76	100,00%
30.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,60	261,44	941,18			-	-		3,60	941,18	100,00%
31	SERVIÇOS DIVERSOS												
31.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	30,00	51,41	1.542,30			-	-		30,00	1.542,30	100,00%
31.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,00	238,70	1.909,60			-	-		8,00	1.909,60	100,00%
31.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²	455,12	13,01	5.921,11			-	-		455,12	5.921,11	100,00%
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA												
32.1	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M	80,60	11,69	942,21			-	-		80,60	942,21	100,00%
32.2	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²	17,25	45,29	781,25			-	-		17,25	781,25	100,00%
32.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	3,61	21,15	76,35			-	-		3,61	76,35	100,00%
32.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	3,61	47,03	169,78			-	-		3,61	169,78	100,00%
32.5	ESCADADEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF. SBC (012003 - 07/2023)	M	1,50	239,36	359,04			-	-		1,50	359,04	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
32.6	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	6,50	66,21	430,37			-	-		6,50	430,37	100,00%
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO												
33.1	INSTITUCIONAL		0,00					-	-		-	-	
33.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	686,28	2.058,84	3,00	2.058,84	3,00	2.058,84	100,00%	-	-	
33.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	64,92	194,76	3,00	194,76	3,00	194,76	100,00%	-	-	
33.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	50,45	403,60	8,00	403,60	8,00	403,60	100,00%	-	-	
33.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	10,96	43,84	4,00	43,84	4,00	43,84	100,00%	-	-	
33.1.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	54,70	1.641,00	30,00	1.641,00	30,00	1.641,00	100,00%	-	-	
33.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	33,94	271,52	8,00	271,52	8,00	271,52	100,00%	-	-	
33.1.7	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	24,00	64,02	1.536,48	24,00	1.536,48	24,00	1.536,48	100,00%	-	-	
33.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00	18,62	23.275,00	1.250,00	23.275,00	1.250,00	23.275,00	100,00%	-	-	
33.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	12,49	374,70	30,00	374,70	30,00	374,70	100,00%	-	-	
33.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	20,40	163,20	8,00	163,20	8,00	163,20	100,00%	-	-	
33.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	36,52	292,16	8,00	292,16	8,00	292,16	100,00%	-	-	
33.1.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	16,64	399,36	24,00	399,36	24,00	399,36	100,00%	-	-	
33.1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	19,07	3.814,00	200,00	3.814,00	200,00	3.814,00	100,00%	-	-	
33.1.14	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU . REF - (SINAPI 91935)	M	50,00	20,12	1.006,00	50,00	1.006,00	50,00	1.006,00	100,00%	-	-	
33.2	TENDAS 2,00M X 2,00M		0,00					-	-		-	-	
33.2.1	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	70,00	64,02	4.481,40			-	-		70,00	4.481,40	100,00%
33.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	18,62	5.586,00			-	-		300,00	5.586,00	100,00%
33.2.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	300,00	14,03	4.209,00			-	-		300,00	4.209,00	100,00%
33.2.4	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	200,00	19,53	3.906,00			-	-		200,00	3.906,00	100,00%
33.3	TENDAS 5,00M X 5,00M		0,00					-	-		-	-	
33.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	425,00	18,62	7.913,50			-	-		425,00	7.913,50	100,00%
33.3.2	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	75,00	64,02	4.801,50			-	-		75,00	4.801,50	100,00%
33.3.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	240,00	14,03	3.367,20			-	-		240,00	3.367,20	100,00%
33.3.4	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	202,00	19,53	3.945,06			-	-		202,00	3.945,06	100,00%
33.3.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	17,00	326,74	5.554,58			-	-		17,00	5.554,58	100,00%
33.4	TENDAS 8,00M X 8,00M E 10,00M X 10,00M		0,00					-	-		-	-	
33.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.250,00	18,62	60.515,00	3.250,00	60.515,00	3.250,00	60.515,00	100,00%	-	-	
33.4.2	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	830,00	19,53	16.209,90	830,00	16.209,90	830,00	16.209,90	100,00%	-	-	
33.4.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	1.820,00	14,03	25.534,60	1.820,00	25.534,60	1.820,00	25.534,60	100,00%	-	-	
33.4.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	325,00	64,02	20.806,50	325,00	20.806,50	325,00	20.806,50	100,00%	-	-	
33.4.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00	326,74	42.476,20	130,00	42.476,20	130,00	42.476,20	100,00%	-	-	
33.5	TENDAS 12,00M X 12,00M		0,00					-	-		-	-	
33.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	18,62	18.620,00			-	-		1.000,00	18.620,00	100,00%
33.5.2	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	340,00	19,53	6.640,20			-	-		340,00	6.640,20	100,00%
33.5.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	860,00	14,03	12.065,80			-	-		860,00	12.065,80	100,00%
33.5.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	260,00	64,02	16.645,20			-	-		260,00	16.645,20	100,00%
33.5.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00	326,74	42.476,20			-	-		130,00	42.476,20	100,00%
33.6	SECOM E SEFAZ		0,00					-	-		-	-	
33.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	54,70	1.094,00	20,00	1.094,00	20,00	1.094,00	100,00%	-	-	
33.6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	52,29	522,90	10,00	522,90	10,00	522,90	100,00%	-	-	
33.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	33,94	305,46	9,00	305,46	9,00	305,46	100,00%	-	-	
33.6.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	15,00	64,02	960,30	15,00	960,30	15,00	960,30	100,00%	-	-	
33.6.5	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	16,64	249,60	15,00	249,60	15,00	249,60	100,00%	-	-	
33.6.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	12,49	249,80	20,00	249,80	20,00	249,80	100,00%	-	-	
33.6.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	20,40	183,60	9,00	183,60	9,00	183,60	100,00%	-	-	
33.6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	19,07	6.674,50	350,00	6.674,50	350,00	6.674,50	100,00%	-	-	
33.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00	4,62	3.927,00	850,00	3.927,00	850,00	3.927,00	100,00%	-	-	
33.7	RESTAURANTES		0,00					-	-		-	-	
33.7.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	16,64	698,88	42,00	698,88	42,00	698,88	100,00%	-	-	
33.7.2	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	84,00	17,78	1.493,52	84,00	1.493,52	84,00	1.493,52	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
33.7.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	UN	21,00	22,10	464,10	21,00	464,10	21,00	464,10	100,00%	-	-	
33.7.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	UN	21,00	21,29	447,09	21,00	447,09	21,00	447,09	100,00%	-	-	
33.7.5	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	UN	21,00	16,97	356,37	21,00	356,37	21,00	356,37	100,00%	-	-	
33.7.6	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026	UN	21,00	24,45	513,45	21,00	513,45	21,00	513,45	100,00%	-	-	
33.7.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1,00	9,25	9,25	1,00	9,25	1,00	9,25	100,00%	-	-	
33.7.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	61,00	7,51	458,11	61,00	458,11	61,00	458,11	100,00%	-	-	
33.7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	472,24	4,62	2.181,75	472,24	2.181,75	472,24	2.181,75	100,00%	-	-	
33.7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	3.389,58	7,09	24.032,12	3.389,58	24.032,12	3.389,58	24.032,12	100,00%	-	-	
33.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	10,60	38,93	412,66	10,60	412,66	10,60	412,66	100,00%	-	-	
33.7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	45,60	77,81	3.548,14	45,60	3.548,14	45,60	3.548,14	100,00%	-	-	
33.7.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	2,00	133,48	266,96	2,00	266,96	2,00	266,96	100,00%	-	-	
33.7.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	168,00	25,29	4.248,72	168,00	4.248,72	168,00	4.248,72	100,00%	-	-	
33.7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	4,00	10,02	40,08	4,00	40,08	4,00	40,08	100,00%	-	-	
33.7.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	11,00	13,69	150,59	11,00	150,59	11,00	150,59	100,00%	-	-	
33.7.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	11,00	53,68	590,48	11,00	590,48	11,00	590,48	100,00%	-	-	
33.7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 101895	UN	4,00	435,15	1.740,60	4,00	1.740,60	4,00	1.740,60	100,00%	-	-	
33.7.19	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". REF.: SBC 063756 10/2024	UND	2,00	11,00	22,00	2,00	22,00	2,00	22,00	100,00%	-	-	
33.7.20	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TÉCN. 97236	M	83,86	82,75	6.939,42	83,86	6.939,42	83,86	6.939,42	100,00%	-	-	
33.7.21	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_ 09/2023	M	220,00	12,76	2.807,20	220,00	2.807,20	220,00	2.807,20	100,00%	-	-	
33.7.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	11,40	11,42	130,19	11,40	130,19	11,40	130,19	100,00%	-	-	
33.7.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	464,15	10,74	4.984,97	464,15	4.984,97	464,15	4.984,97	100,00%	-	-	
33.7.24	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	42,00	78,51	3.297,42	42,00	3.297,42	42,00	3.297,42	100,00%	-	-	
33.7.25	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	24,00	70,58	1.693,92	24,00	1.693,92	24,00	1.693,92	100,00%	-	-	
33.7.26	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025	UN	1,00	139,60	139,60	1,00	139,60	1,00	139,60	100,00%	-	-	
33.7.27	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	50,40	22,24	1.120,90	50,40	1.120,90	50,40	1.120,90	100,00%	-	-	
33.7.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00	437,65	875,30	2,00	875,30	2,00	875,30	100,00%	-	-	
33.7.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879)	UN	2,00	500,28	1.000,56	2,00	1.000,56	2,00	1.000,56	100,00%	-	-	
33.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
33.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00	18,62	23.275,00	1.250,00	23.275,00	1.250,00	23.275,00	100,00%	-	-	
33.8.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	100,00	54,70	5.470,00	100,00	5.470,00	100,00	5.470,00	100,00%	-	-	
33.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	M	25,00	10,96	274,00	25,00	274,00	25,00	274,00	100,00%	-	-	
33.8.4	ref. SINAPI (92984) - CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	4.500,00	11,75	52.875,00	4.500,00	52.875,00	4.500,00	52.875,00	100,00%	-	-	
33.8.5	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM REF: SBC: 063026	UND	14.500,00	1,08	15.660,00	14.500,00	15.660,00	14.500,00	15.660,00	100,00%	-	-	
33.8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	50,00	12,03	601,50	50,00	601,50	50,00	601,50	100,00%	-	-	
34	SEMA E IMAC												
34.1	PAREDES E PAINÉIS												
34.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023_PS	m²	185,60	139,49	25.889,34	185,60	25.889,34	185,60	25.889,34	100,00%	-	-	
34.2	FORRO												
34.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²	60,00	78,13	4.687,80	60,00	4.687,80	60,00	4.687,80	100,00%	-	-	
34.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_ 08/2023	M	76,00	3,47	263,72	76,00	263,72	76,00	263,72	100,00%	-	-	
34.3	ESQUADRIAS												
34.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN	6,00	1.039,11	6.234,66	-	-	-	-		6,00	6.234,66	100,00%
34.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	6,60	261,44	1.725,50	-	-	-	-		6,60	1.725,50	100,00%
34.4	PINTURA												
34.4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	371,20	19,28	7.156,74	-	-	-	-		371,20	7.156,74	100,00%
34.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	371,20	13,21	4.903,55	-	-	-	-		371,20	4.903,55	100,00%
34.4.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	60,00	35,89	2.153,40	-	-	-	-		60,00	2.153,40	100,00%
34.4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²	60,00	15,99	959,40	-	-	-	-		60,00	959,40	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
34.4.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,96	22,08	418,64			-	-		18,96	418,64	100,00%
34.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
34.5.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	36,00	60,32	2.171,52			-	-		36,00	2.171,52	100,00%
34.5.2	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	8,40	25,58	214,87			-	-		8,40	214,87	100,00%
34.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	4,62	924,00			-	-		200,00	924,00	100,00%
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO												
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026, PE	UN	18,00	214,57	3.862,26			-	-		18,00	3.862,26	100,00%
35.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN	18,00	29,03	522,54			-	-		18,00	522,54	100,00%
35.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN	63,00	16,57	1.043,91			-	-		63,00	1.043,91	100,00%
35.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²	14,00	428,68	6.001,52			-	-		14,00	6.001,52	100,00%
35.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	103,00	18,35	1.890,05			-	-		103,00	1.890,05	100,00%
35.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	103,00	52,29	5.385,87			-	-		103,00	5.385,87	100,00%
35.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	412,00	4,62	1.903,44			-	-		412,00	1.903,44	100,00%
	ARREDONDAMENTO DE PLANILHA		1,00	-1,34	-1,34			-	-		1,00	- 1,34	100,00%
TOTAL SIMPLES					3.883.198,29		64,65%	2.510.390,15	2.510.390,15 64,65%		1.372.808,14 35,35%		
TOTAL ACUMULADO							64,65%	2.510.390,15					
SALDO							35,35%	1.372.808,14					

O Valor da presente medição é:
DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS.

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026


ENG^o CIVIL ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
Construtora: FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nº CT Construtora: 022/2026
Fiscal da obra: Eng. Civil Isabelle Lima e Silva
Respons. Técnico: Eng. Civil Weysser Coelho da Silva

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)												
1.1	ADMINISTRAÇÃO EXPO JURUÁ	%	64,60									64,60	64,60
2	TAXAS E EMOLUMENTOS												
2.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	UN											
2.2	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO	UN											
2.3	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN											
2.4	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN											
2.5	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN											
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,00			3,00	2,00				PLACA DA OBRA	6,00	6,00
3.2	SINAPI (REF: 93208_12/2023) - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	1,00			8,00	3,00				DEPÓSITO DA OBRA	24,00	24,00
3.3	SINAPI (REF: 93211_12/2023) - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENÁRIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1,00			4,00	2,50				REFEITÓRIO	10,00	10,00
3.4	SINAPI (REF: 93212_12/2023) - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	1,00			4,00	2,50				SANITÁRIO E VESTIARIO	10,00	10,00
3.5	SINAPI (REF: 93207_12/2023) - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	1,00			4,00	2,50				ESCRITÓRIO	10,00	10,00
3.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00									1,00	1,00
4	PLANTIO DE GRAMA												
4.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³											
4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
4.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²											
5	PISOS												
5.1	RECUPERAÇÃO DE PISOS												
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14.459,78	0,15							RECUPERAÇÃO DE 15% DOS PISOS EXISTENTES	2.168,97	2.168,97
5.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	21,69									21,69	21,69
5.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,00	2.168,97				0,01			COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1	21,69	2.168,97
5.1.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,00	2.168,97							COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1	2.168,97	
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,00	14.459,78							COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	14.459,78	14.459,78
5.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,62								COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	14.459,78	
			1,00	14.459,78							SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO		
			1,00			75,61	1,60				PISO RESTAURENTES - 22 BOXES	120,98	
			1,00			10,29	0,43				PISO RESTAURENTES - 22 BOXES	4,42	
			1,00			10,00	10,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	100,00	
			1,00			9,00	9,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	81,00	
			1,00								COE1= SOMATÓRIO DO ITEM 5.1.1, SEM OS 15% DA DEMOLIÇÃO	14.459,78	
			1,00			75,61	0,30	0,20			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	4,54	
			1,00			10,29	0,30	0,20			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,62	
			1,00			20,00	0,30	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	1,20	
			1,00			18,00	0,30	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	1,08	
			1,00			13,00	0,30	0,30			ESCAVAÇÃO PARA CANALETA NO PISO DO ESPAÇO INDUSTRIA	1,17	
			1,00			38,00	0,30	0,20			PISO TRE	2,28	
			1,00			55,30	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO	6,14	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
5.1.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). REF. SINAPI (6110 -09/2016)	m³	4,00			3,60	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	1,60	14,97
			14,97									14,97	
			1,00			75,61	0,20	0,20			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	3,02	
			1,00			10,29	0,20	0,20			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,41	
			1,00			20,00	0,20	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	0,80	
			1,00			18,00	0,20	0,20			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	0,72	
			1,00			38,00	0,30	0,20			PISO TRE	2,28	
			1,00			55,30	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO	6,14	
			4,00			3,60	0,30	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	1,60	
5.1.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	9,63	1,30								12,52	12,52
			1,00			75,41	1,20	0,10			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	9,05	
			1,00			9,89	0,23	0,10			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,23	
			4,00			0,60	0,40	0,37			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	0,36	
5.1.9	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	126,36	1,00								126,36	126,36
			1,00			75,61	1,60				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	120,98	
			1,00			10,29	0,43				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	4,42	
			4,00			0,60	0,40				PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	0,96	
5.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12,54	1,30	4,00							65,21	65,21
			1,00			75,61	1,60	0,10			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	12,10	
			1,00			10,29	0,43	0,10			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,44	
5.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS												
5.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1.373,31	0,10							COE1= CONSIDERAR 10% DO TOTAL	137,33	137,33
			1,00			31,00	2,60				DERACRE	80,60	
			4,00			3,80	11,30				ROTATÓRIA	171,76	
			1,00			58,00	2,60				ESPAÇO INDUSTRIA	150,80	
			1,00			178,70	1,60				CALÇAMENTO RUA PRINCIPAL	285,92	
			1,00			149,40	2,60				CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	388,44	
			1,00						113,09		CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	113,09	
			1,00			60,90	3,00				ESPAÇO AGRO	182,70	
			41,20	0,10							COE1= CONSIDERAR 10% DO TOTAL	4,12	
5.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m²											4,12
			1,00			31,00	2,60	0,03			DERACRE	2,42	
			4,00			3,80	11,30	0,03			ROTATÓRIA	5,15	
			1,00			58,00	2,60	0,03			ESPAÇO INDUSTRIA	4,52	
			1,00			178,70	1,60	0,03			CALÇAMENTO RUA PRINCIPAL	8,58	
			1,00			149,40	2,60	0,03			CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	11,65	
			1,00					0,03	113,09		CALÇAMENTO CHAPÉU DE PALHA	3,39	
			1,00			60,90	3,00	0,03			ESPAÇO AGRO	5,48	
											COE1= IDEM 5.2.1	137,33	
5.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,00	137,33									137,33
5.2.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,00	1.373,31							COE1= IDEM 5.2.1, SEM OS 10%	1.373,31	1.373,31
5.2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,00	1.373,31							COE1= IDEM 5.2.1, SEM OS 10%	1.373,31	1.373,31
5.3	PISO A EXECUTAR												
5.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	45,93									45,93	45,93
			1,00			75,61	1,60	0,05			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	6,05	
			1,00			10,29	0,43	0,05			PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	0,22	
			1,00			10,00	10,00	0,05			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	5,00	
			1,00			9,00	9,00	0,05			PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	4,05	
			1,00			13,00	0,30	0,05			CANALETA DO PISO DO ESPAÇO INDUSTRIA	0,20	
			1,00					0,05	605,00		COMPLEMENTO DO PISO DA INDUSTRIA	30,25	
			4,00			1,00	0,80	0,05			PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	0,16	
5.3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1.384,35									1.384,35	1.384,35
			1,00			75,61	1,60				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	120,98	
			1,00			10,29	0,43				PISO RESTAURENTES - 21 BOXES	4,42	
			1,00			10,00	10,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	100,00	
			1,00			9,00	9,00				PISO ECONOMIA SOLIDÁRIA - COMPLEMENTO	81,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			13,00	0,30				CANALETA DO PISO DO ESPAÇO INDUSTRIA	3,90	
			1,00						605,00		COMPLEMENTO DO PISO DA INDUSTRIA	605,00	
			1,00			9,50	9,50				PISO TRE	90,25	
			1,00			31,30	12,00				PISO DA FECOMÉRCIO	375,60	
			4,00			1,00	0,80				PISO DA FECOMÉRCIO - SAPATAS DE APOIO	3,20	
5.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	375,60									375,60	375,60
			1,00			31,30	12,00				PISO DA FECOMÉRCIO PISO DA FECOMÉRCIO	375,60	
5.4	CALCADA A EXECUTAR												
5.4.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²											
5.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³											
5.4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²											
5.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²											
5.4.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²											
5.4.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²											
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES												
6.1	PAREDES E REVESTIMENTOS												
6.1.1	SBC (120067_02/2025) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	344,16									344,16	344,16
			1,00			58,80		2,20			PAREDES FUNDO - BLOCO 24 UND	129,36	
			24,00			2,50		2,20			PAREDES INTERNAS - BLOCO 24 UND	132,00	
			24,00			2,00		0,90			PAREDES FRONTAIS - BLOCO 24 UND	43,20	
			24,00			0,50		0,90			SUORTE BANCADA - BLOCO 24 UND	10,80	
			24,00			2,00		0,60			COMPENSADO FRONTAL PARA LOGO DAS 24 UND	28,80	
6.1.2	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	24,00			2,00	0,50				BANCADA EM MADEIRA DOS BOX	24,00	24,00
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,41								ALVENARIA PARA APOIO DAS PIAS	9,41	9,41
			3,00			1,60	1,20				ALVENARIA PARA APOIO DAS PIAS	5,76	
			3,00			1,35	0,90				ALVENARIA PARA APOIO DAS PIAS	3,65	
6.2	PINTURA												
6.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	391,92	2,00							COE1= SOMATÓRIO DOS 2 LADOS DA ALVENARIA	783,84	783,84
			1,00			58,80		2,20			PAREDES FUNDO - BLOCO 24 UND	129,36	
			24,00			2,50		2,20			PAREDES INTERNAS - BLOCO 24 UND	132,00	
			24,00			2,00		0,90			PAREDES FRONTAIS - BLOCO 24 UND	43,20	
			24,00			0,50		0,90			SUORTE BANCADA - BLOCO 24UND	10,80	
			24,00			2,00		0,60			COMPENSADO FRONTAL PARA LOGO DAS 24 UND	28,80	
			24,00			2,00	0,50				BANCADAS DAS 24 UND	24,00	
			24,00			1,10		0,90			PORTAS DAS 24UND	23,76	
6.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,00	783,84							COE1= IGUAL AO ITEM 6.2.1	783,84	783,84
6.3	ESQUADRIAS												
6.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,00								PORTA DOS BOXES DA ALIMENTAÇÃO	24,00	24,00
6.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
6.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			100,00	0,30	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	15,00	15,00
6.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			100,00	0,30				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	30,00	30,00
6.4.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			100,00	0,28	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	14,00	14,00
6.4.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
6.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00			6,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	24,00	24,00
6.4.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			120,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	120,00	120,00
6.4.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	6,00	6,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.			CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.						
6.4.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00										6,00	6,00
6.4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00										6,00	6,00
6.4.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00										6,00	6,00
6.4.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00										3,00	3,00
6.4.12	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00										6,00	6,00
6.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
6.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			20,00	0,30	0,50					3,00	3,00
6.5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			20,00	0,30						6,00	6,00
6.5.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			20,00	0,10	0,40					0,80	0,80
6.5.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			6,00							6,00	6,00
6.5.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			20,00							20,00	20,00
6.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00										14,00	14,00
6.5.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00										4,00	4,00
6.5.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00										2,00	2,00
6.5.9	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00										2,00	2,00
6.5.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	2,50										2,50	2,50
6.5.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00										6,00	6,00
6.5.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00										1,00	1,00
7	DRENAGEM													
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³												
7.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²												
7.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m³												
7.4	SINAPI (REF: 75029/001_11/2020) - TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO DN 400 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M												
7.5	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³												
7.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M												
7.7	SINAPI (REF: 74104/001_04/2018) - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN												
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)													
8.1	ORSE (REF: 3752_03/2024) -CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,00M, ALTURA LIVRE DE 2,00M, COM 8 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO	m												

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
8.2	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADICAS	m²											
9	PISO COMPENSADO												
9.1	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	m²											
9.2	SBC (REF: 170019_02/2025) - PISO DE COMPENSADO NAVAL 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²											
9.3	PISO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 15MM REF SINAPI: 98460	m²											
9.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²											
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
10.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	1,00			4,00		4,00			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR	16,00	16,00
10.2	SINAPI (REF: 95135_10/2027) - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1,00			4,00		4,00			LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	16,00	16,00
10.3	SINAPI (REF: 95135_10/2017) -ANDAIME DE MADEIRA	M²	5,00			1,20		1,00			ANDAIME DE MADEIRA	6,00	6,00
10.4	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI											
10.5	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP											
11	PLANTÃO EXPO JURUÁ												
11.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
11.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES												
11.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
11.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
11.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
11.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
11.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
11.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H											
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES												
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
12.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024												
12.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M											
12.2	PAREDES E PAINÉIS												
12.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	622,44									622,44	622,44
			1,00	2,00		82,90		2,70			PAREDES DE DRYWALL NO BOXES INSTITUCIONAIS	447,66	
			1,00	2,00		39,45		2,70		(38,25)	PAREDES DE DRYWALL NO BOXES INSTITUCIONAIS	174,78	
12.3	FORRO												
12.3.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	197,43									197,43	197,43
			1,00					8,64			SEASDH	8,64	
			1,00					22,50			PROCON	22,50	
			1,00					22,30			SEMULHER	22,30	
			1,00					22,82			IEPETEC	22,82	
			1,00					22,32			MP	22,32	
			1,00					22,32			DEFENSORIA	22,32	
			1,00					22,32			IGREJA CATOLICA	22,32	
			1,00					22,32			RÁDIO CIDADE	22,32	
			1,00					24,89			PROCON	24,89	
			1,00					7,00			SEMASC	7,00	
12.3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	237,84									237,84	237,84
			1,00			12,20					SEASDH	12,20	
			1,00			23,26					PROCON	23,26	
			1,00			24,73					SEMULHER	24,73	
			1,00			23,15					IEPETEC	23,15	
			1,00			26,80					MP	26,80	
			1,00			26,80					DEFENSORIA	26,80	
			1,00			26,80					IGREJA CATOLICA	26,80	
			1,00			26,80					RÁDIO CIDADE	26,80	
			1,00			26,80					PROCON	26,80	
			1,00			20,50					SEMASC	20,50	
12.4	ESQUADRIAS												
12.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11,00								PORTA DE MADEIRA	11,00	11,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
12.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	4,00			1,50	1,30				JANELA DE CORRER DE VIDRO	7,80	7,80
12.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 11/2025	m²											
12.4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	UN	1,00								SEASDH	1,00	1,00
12.5	PINTURAS												
12.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²											
12.5.2	SINAPI (REF: 88487_ 03/2021) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	m²											
12.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²											
12.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²											
12.5.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²											
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA												
13.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
13.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m³	69,46									69,46	69,46
			1,00	3,14		64,00		0,34			Piso circular existente	68,33	
			1,00	0,50		4,45	1,50	0,34			Rampa existente	1,13	
13.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - REF. SINAPI (72897)	m³	1,00	1,25					69,46		Item 13.1.1 + 25% de empolamento	86,83	86,83
13.1.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM REF. SINAPI (72900)	m³	1,00						86,83		Idem item 13.1.2	86,83	86,83
13.2	INFRA E SUPESTRUTURA												0,00
13.2.1	ESTACAS												0,00
13.2.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO C/ FCK=25MPA, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA SEM ARMADURA. REF. SINAPI (101174)	M	12,00			1,50					As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP	18,00	18,00
13.2.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	21,48								As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP	21,48	21,48
13.2.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	11,08								As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP	11,08	11,08
13.2.2	VIGAS BALDRAME												0,00
13.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_ 01/2024	m³	1,00			85,49	0,22	0,28				5,27	5,27
13.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2026	m²	1,00			85,49	0,22					18,81	18,81
13.2.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	1,00			85,49	0,12	0,03			3 cm de lastro	0,31	0,31
13.2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	1,00			85,49		0,50			Viga baldrame 0,12 x 0,25 m	42,75	42,75
13.2.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	41,54									41,54	41,54
13.2.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	59,31									59,31	59,31
13.2.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	1,00			85,49	0,12	0,25			Seção da viga x comp. Total	2,56	2,56
13.2.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	1,00						2,56		Idem item anterior	2,56	2,56
13.2.2.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	1,00			85,49	0,10	0,28				2,39	2,39
13.2.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	M3XKM	1,00	1,25	5,00				2,87		Volume de escavação - reaterro + 25% empolamento x 5km	17,94	17,94
13.2.3	PILARES												0,00
13.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	12,00			0,84		3,30			Perímetro do pilar x altura x qtde total. Pilar: 0,12 x 0,30 x 3,30m	33,26	33,26
13.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	24,96									24,96	24,96
13.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	56,76									56,76	56,76
13.2.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	12,00			0,30	0,12	3,30			Seção do pilar x altura x qtde total. Pilar: 0,12 x 0,30 x 3,30m	1,43	1,43
13.2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	m³	1,00						1,43		Idem item anterior	1,43	1,43
13.2.4	VIGAS												0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.2.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,00			85,49		0,62			Seção da viga 0,12 x 0,25m (0,12+0,25+0,25) x comp. Total	= 53,00	53,00
13.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,39									41,39	41,39
13.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,87									69,87	69,87
13.2.4.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,00			85,49	0,12	0,25			Seção da viga (0,12 x 0,25m) x comp. Total	2,56	2,56
13.2.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,00						2,56			2,56	2,56
13.3	PAREDES E PAINÉIS												0,00
13.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,00						266,56	(27,12)	Total da alvenaria descontando as esquadrias (P2, P3, J1 e J2)	239,44	239,44
13.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,00			6,90		0,70			Tijolo maciço aparente na fachada	9,66	9,66
13.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	1,00			21,30					J1, J2, P2 e P3	21,30	21,30
13.3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	1,00			11,40					J1 e J2	11,40	11,40
13.4	REVESTIMENTOS												0,00
13.4.1	PISOS												0,00
13.4.1.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE -REF SINAPI (55835) - 10/2017	m³	1,00					0,10	161,33		Áreas internas conforme projeto	16,13	16,13
13.4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1,00						161,33		Áreas internas conforme projeto	161,33	161,33
13.4.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,00						161,33		Áreas internas conforme projeto	161,33	161,33
13.4.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. REF. SINAPI (87622)	m²	1,00						161,33		Áreas internas conforme projeto	161,33	161,33
13.4.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1,00						15,98		Hall, copa e lavabos	15,98	15,98
13.4.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1,00						145,35		Recepção, gab gov e gabinete.	145,35	145,35
13.4.1.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	1,00			112,30					Conforme projeto	112,30	112,30
13.4.1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,00					0,06	107,57		Acesso principal + calçadas de contorno (espessura de 6 cm)	6,45	6,45
13.4.1.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,00			9,95					Conforme projeto	9,95	9,95
13.4.2	PAREDES												0,00
13.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	488,54									488,54	488,54
				1,00	2,00				239,44		Alvenaria de tijolo furado x 2	478,88	
				1,00	1,00				9,66		Avenaria tijolo maciço - área interna - x 1	9,66	
13.4.2.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1,00						249,10		Paredes internas	249,10	249,10
13.4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1,00		1,00				239,44		Paredes externas	239,44	239,44
13.4.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1,00			20,80		1,60			Revestimento das paredes dos lavabos e copa até h=1,6m	33,28	33,28
13.4.3	TETO												0,00
13.4.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1,00						161,33		Soma das áreas: Recepção, Gab. Gov, Gabinete, Hall, Copa e Lavabos	161,33	161,33
13.5	COBERTURA												0,00
13.5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2025	UN	10,00								Conforme projeto	10,00	10,00
13.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	1,00						203,31		Conforme projeto	203,31	203,31
13.5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²											
13.5.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00			18,35					Conforme projeto	36,70	36,70
13.5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,00			18,35					Conforme projeto	36,70	36,70
13.6	ESQUADRIAS												0,00
13.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00								PORTA GABINETE E GOVERNADORA	2,00	2,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.6.2	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 11/2025	UN											
13.6.3	PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO REF. SBC (110180)	m²	1,00			3,25		2,90			Porta de entrada	9,43	9,43
13.6.4	JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO (MARCO/BATENTE/GUARNIÇÃO DE MADEIRA) REF. SBC (110320)	m²	52,20									52,20	52,20
13.6.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	m²	4,00 2,00 2,00			2,00 9,50 0,60		1,30 2,20 0,60			4 X J1 2XJ3 2XJ2	10,40 41,80 0,72	0,72
13.7	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO												0,00
13.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	m²	1,00			85,49	0,62				Comp. Total da viga x (0,25+0,25+0,12)	53,00	53,00
13.7.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²											
13.7.3	MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, UMA DEMÃO. REF. SINAPI 99126	m²											
13.7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²											
13.7.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²											
13.7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	m²											
13.7.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²											
13.7.8	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	m²											
13.7.9	APLICAÇÃO DE PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM ALVENARIA DE TIJ. MACIÇO, 2 DEMÃOS	M²											
13.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO										As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP		0,00
13.8.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	13,00									13,00	13,00
13.8.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	9,00									9,00	9,00
13.8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	6,00									6,00	6,00
13.8.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	32,00									32,00	32,00
13.8.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4,00									4,00	4,00
13.8.6	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	M	8,90									8,90	8,90
13.8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	692,46									692,46	692,46
13.8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	35,60									35,60	35,60
13.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	157,20									157,20	157,20
13.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	110,00									110,00	110,00
13.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5,00									5,00	5,00
13.8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	10,00									10,00	10,00
13.8.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5,00									5,00	5,00
13.8.16	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	5,00									5,00	5,00
13.8.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00									1,00	1,00
13.8.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00									2,00	2,00
13.8.21	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 106031	UN	1,00									1,00	1,00
13.8.22	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2023 REF. SINAPI (97236)	M	20,15									20,15	20,15
13.8.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	31,55									31,55	31,55

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.8.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,90									8,90	8,90
13.8.25	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	69,60									69,60	69,60
13.8.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,70									146,70	146,70
13.8.27	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI (103788)	UN	32,00									32,00	32,00
13.8.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00									1,00	1,00
13.8.29	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 105920	UN	6,00									6,00	6,00
13.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												0,00
13.9.1	ALIMENTAÇÃO										As quantidades estão em conformidade com os projetos complementares elaborados pela SEOP		0,00
13.9.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.2	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.1.7	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	7,50									7,50	7,50
13.9.2	ÁGUA FRIA												0,00
13.9.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN											
13.9.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.9.2.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.9.2.4	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.9.2.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.9.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.2.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.2.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00									6,00	6,00
13.9.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00									9,00	9,00
13.9.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,60									18,60	18,60
13.9.2.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.9.2.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.2.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00									4,00	4,00
13.9.3	ESGOTO												0,00
13.9.3.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.2	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.3.3	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 REF. SINAPI (98110)	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.9.3.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.9.3.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.9.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.9	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500L POLIETILENO REF. SBC (053021)	UN											
13.9.3.10	n	UN											
13.9.3.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00									3,00	3,00
13.9.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00									1,00	1,00
13.9.3.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00									2,00	2,00
13.9.3.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,90									14,90	14,90
13.9.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00									2,00	2,00
13.9.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,10									7,10	7,10
13.9.4	VENTILAÇÃO												
13.9.4.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN											
13.9.4.2	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN											
13.9.4.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M											
13.9.4.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN											
13.10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
13.10.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN											
13.10.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - S2, S12 REF. SBC (055035)	UN											
13.10.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN											
13.10.4	PE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
13.10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN											
13.11	CLIMATIZAÇÃO												
13.11.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. (104325)	UN											
13.11.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M											
13.11.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M											
13.11.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 97330)	M											
13.11.5	CABO FLEXIVEL (PP) PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 PARA INTERLIGAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT (REF. SBC 063003)	M											
13.11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M											
13.11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN											
13.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN											
13.11.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN											
13.11.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN											
13.11.11	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN											
13.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
13.12.1	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS												
13.12.1.1	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.12.1.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.12.1.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. REF. SINAPI (102143)	m²											
13.12.1.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (86889)	m²											
13.12.1.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.12.1.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
13.12.2	IDENTIFICAÇÃO VISUAL												
13.12.2.1	PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF SINAPI (84121)	UN											
13.12.2.2	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF Copia da SINAPI (84122)	UN											
13.12.2.3	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA E ACM - 1,00 X 1,50 X 0,30 M - INCLUIDO CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN											
13.12.3	PAISAGISMO												
13.12.3.1	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²											
13.12.3.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²											
13.12.3.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN											
13.12.3.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN											
13.12.3.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN											
13.12.3.6	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	m²											
14	PAISAGISMO												
14.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN											
14.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN											
14.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN											
14.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²											
14.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²											
14.6	AGAVE - DRAGÃO	UN											
14.7	BARBA DE SERPENTE	UN											
14.8	ESPADA SÃO JORGE	UN											
14.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³											
15	ESPAÇO INDÚSTRIA												
15.1	PORTAL												
15.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	m²											
15.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
15.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
15.1.4	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
15.2	ALVENARIA												
15.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31,78									31,78	31,78
			1,00			7,39		1,80			PAREDES BANHEIRO	13,30	
			2,00			2,45		1,80			PAREDES BANHEIRO	8,82	
			1,00			0,70		1,80			PAREDES BANHEIRO	1,26	
			1,00			28,00		0,30			CANALETA NO PISO	8,40	
15.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	55,16									55,16	55,16
			1,00	2,00		7,39		1,80			PAREDES BANHEIRO	26,60	
			2,00	2,00		2,45		1,80			PAREDES BANHEIRO	17,64	
			1,00	2,00		0,70		1,80			PAREDES BANHEIRO	2,52	
			1,00			28,00		0,30			CANALETA NO PISO	8,40	
15.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	55,16									55,16	55,16
			1,00	2,00		7,39		1,80			PAREDES BANHEIRO	26,60	
			2,00	2,00		2,45		1,80			PAREDES BANHEIRO	17,64	
			1,00	2,00		0,70		1,80			PAREDES BANHEIRO	2,52	
			1,00			28,00		0,30			CANALETA NO PISO	8,40	
15.3	ESQUADRIAS												
15.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), UN PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN											
15.4	LOUÇAS E METAIS												
15.4.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											
15.5	PAREDES E PAINÉIS												
15.5.1	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²	1,00			93,81		1,80			PAREDES SIMPLES - EXPOSITORES	168,86	168,86
15.5.2	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLA (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	373,52									373,52	373,52
			1,00			75,60		1,80			PAREDE DUPLA - EXPOSITORES	136,08	
			1,00			74,31		1,80			PAREDE DUPLA - EXPOSITORES	133,76	
			1,00			57,60		1,80			PAREDE DUPLA - EXPOSITORES	103,68	
15.6	PINTURA												
15.6.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
15.6.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²											
15.6.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS												
16.1	BAIAS												
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	62,00			0,30	0,30	0,50			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	2,79	2,79
16.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,00					0,05	180,00		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	9,00	9,00
16.1.3	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²											0,00
16.1.4	FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8", SOLDADO	UN	16,00								FERROLHO COM TRANCA EM BARRA LISA 3/4", PINO 3/4", CHAPA DE AÇO 3/8" SOLDADO	16,00	16,00
16.1.5	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	152,20								PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	152,20	152,20
			58,00					2,40			PILARES DA BAIA	139,20	
			2,00					3,00			PILARES DA RAMP	6,00	
			2,00					3,50			PILARES DA RAMP	7,00	
16.1.6	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	1,00			4,50	1,50				ASSOALHO DE MADEIRA.	6,75	6,75
16.1.7	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	86,80								CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	86,80	86,80
			4,00			18,00						72,00	
			4,00			3,70						14,80	
16.1.8	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M	646,20								RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO) - REF.: SINAPI (72192) - 11/2018	646,20	646,20
			22,00			18,00						396,00	
			56,00			3,70						207,20	
			10,00			4,30						43,00	
16.1.9	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											0,00
16.1.10	ORSE (REF: 3211_04/2022) - PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 15X15 E RÉGUAS DE MADEIRA 10 X 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS	m²	9,00			1,20		1,20			PORTÕES DAS BAIAS	12,96	12,96
16.2	PORTAL AGRO I												

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
16.2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²											
16.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
16.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
16.2.4	SBC (REF: 023066_04/2024) - REVESTIMENTO MELAMINICO PARA RECOBRIMENTO DA ESTRUTURA DO PÓRTICO	m²											
16.3	PORTAL AGRO II												
16.3.1	MOVIMENTO DE TERRA												
16.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,00			0,25	0,25	7,00			PILARES DO PÓRTICO	0,88	0,88
16.3.1.2	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,00			0,90	0,05	1,50			REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	0,14	0,14
16.3.2	SUPERESTRUTURA												
16.3.2.1	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,00			8,50					02 UNIDADE DE PILA QUADRADO 0,20X0,20X8,50 M	17,00	17,00
16.3.2.2	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M											0,00
16.3.2.3	SINAPI (REF: 72192_09/2019) -RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI 5CM DE ESPESSURA (COLOCADO)	M											0,00
16.3.2.4	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	m²											
16.3.2.5	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²	4,00			4,40		1,20			DIVISORIAS DO ESPAÇO AGRO	21,12	21,12
16.3.3	PINTURA												
16.3.3.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											0,00
16.3.3.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²											0,00
16.3.3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											0,00
16.4	CERCAMENTO DO AGRO												0,00
16.4.1	MOVIMENTO DE TERRA												
16.4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	140,00			0,25	0,25	0,50			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	4,38	4,38
16.4.1.2	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	140,00			0,15	0,15	0,50			REATERRO DOS MOURÕES	1,58	1,58
16.4.2	SUPERESTRUTURA												
16.4.2.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M	105,00			2,00					PILAR DE MADEIRA 15 X 15	210,00	210,00
16.4.3	SERVIÇOS DIVERSOS												
16.4.3.1	SBC REF:(130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M											0,00
16.4.4	PINTURA												
16.4.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)												
17.1	ESQUADRIAS												0,00
17.1.1	SBC (REF: 110606_04/2024) - PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m²	21,00			0,90	0,90				PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	17,01	17,01
17.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												0,00
17.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	21,00			6,00	0,30	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	18,90	18,90
17.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	21,00			6,00	0,30				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	37,80	37,80
17.2.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21,00			6,00	0,20	0,50			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	12,60	12,60
17.2.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
17.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			160,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	160,00	160,00
17.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			140,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	140,00	140,00
17.2.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.2.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	21,00	21,00
17.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	13,00	13,00
17.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	13,00	13,00
17.2.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	16,00	16,00
17.2.12	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	13,00	13,00
17.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												0,00
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00			100,00	0,20	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS BOXES DOS RESTAURANTES	10,00	10,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	1,00			100,00	0,20				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	20,00	20,00
17.3.3	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,00			100,00	0,10	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	5,00	5,00
17.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			60,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	60,00	60,00
17.3.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			60,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	60,00	60,00
17.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	40,00	40,00
17.3.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	12,00	12,00
17.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	21,00	21,00
17.3.9	CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	21,00	21,00
17.3.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	1,00			50,00	0,10	0,50			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	2,50	2,50
17.3.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS BOXES DOS RESTAURANTES DOS	21,00	21,00
17.4	PINTURA												0,00
17.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											0,00
17.5	TELHAMENTO												0,00
17.5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.350,27	1,01							COE1= COEFICIENTE DE INCLINAÇÃO	1.357,02	1.357,02
			1,00						284,37		COBERTURA GALPÃO	284,37	
			1,00						660,98		COBERTURA GALPÃO	660,98	
			1,00						56,96		COBERTURA GALPÃO	56,96	
			1,00						347,96		COBERTURA GALPÃO	347,96	
17.5.2	SINAPI (REF: 100326_03/2025) - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA M TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1,00			76,26					COBERTURA GALPÃO	76,26	76,26
17.6	DRENAGEM PLUVIAL												
17.6.1	SINAPI REF: (94228_03/2025) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,00			151,21					CONFORME PROJETO	151,21	151,21
17.6.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1,00			74,05					CONFORME PROJETO	74,05	74,05
17.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00								CONFORME PROJETO	16,00	16,00
17.6.4	CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO UN ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	4,00								CONFORME PROJETO	4,00	4,00
17.7	ESTRUTURA METÁLICA												0,00
17.7.1	SINAPI (REF:104314_03/2025) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	4.087,88								C100X50X17X2,25 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	4.087,88	4.087,88
17.7.2	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - PERFIL ESTRUTURAL U 68X30X2 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.409,78								U68X30X2 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	1.409,78	1.409,78
17.7.3	SINAPI (REF: 100773_12/2024) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.114,53								U75X40X2 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	1.114,53	1.114,53
17.7.4	SINAPI (REF:100773_12/2024) - PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, LANTERNIM, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.748,04								U100X50X3 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	2.748,04	2.748,04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.7.5	SINAPI (REF:100773_12/2024) - ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25	KG	2.150,34								U82X40X2 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT) (U82X30X2 SUBSTITUI U82X40X2)	2.150,34	2.150,34
17.7.6	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	113,39								L5/8X1/8 (CANTONEIRA) - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	113,39	113,39
17.7.7	SINAPI (REF:104314_03/2025) - CONTRAVENTAMENTO, BARRA REDONDA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	86,87								BARRA REDONDA 1/4 - (6 MT/ VALOR DA BARRA)(PESO TOTAL DA BARRA / PELO COEFICIENTE KG/MT)	86,87	86,87
17.7.8	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	193,17								PLACA BASE	193,17	193,17
17.7.9	SINAPI (REF:104314_03/2025) - PLACA DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	94,68								ANCORAGEM	94,68	94,68
17.7.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,00						1.311,91		CONFORME PROJETO	1.311,91	1.311,91
17.7.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,00						1.311,91		CONFORME PROJETO	1.311,91	1.311,91
17.8	ESTRUTURAL - BLOCOS												0,00
17.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	28,00			0,55	0,55	0,40			EST (2/3)	3,39	3,39
17.8.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	28,00			0,55	0,55				EST (2/3)	8,47	8,47
17.8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	28,00			0,55	0,55				EST (2/3)	8,47	8,47
17.8.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,00						54,04		EST (2/3)	54,04	54,04
17.8.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,30								EST (2/3)	55,30	55,30
17.8.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,90								EST (2/3)	115,90	115,90
17.8.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,80								EST (2/3)	108,80	108,80
17.8.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,89								EST (2/3)	5,89	5,89
17.8.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,89								EST (2/3)	5,89	5,89
17.8.10	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E L CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,00	5,89	18,00						ADITIVO ACELERADOR	106,02	106,02
17.9	VIGAS BALDRAME												0,00
17.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	14,78									14,78	14,78
			2,00			9,89	0,20	0,40			V5 E V8 EST (2/3)	1,58	
			1,00			9,89	0,20	0,40			V6 EST (2/3)	0,79	
			1,00			9,89	0,20	0,40			V7 EST (2/3)	0,79	
			1,00			39,20	0,20	0,40			V1 EST (2/3)	3,14	
			2,00			33,38	0,20	0,40			V2 E V4 EST (2/3)	5,34	
			1,00			39,20	0,20	0,40			V3 EST (2/3)	3,14	
17.9.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	36,94									36,94	36,94
			2,00			9,89	0,20				V5 E V8 EST (2/3)	3,96	
			1,00			9,89	0,20				V6 EST (2/3)	1,98	
						9,89	0,20				V7 EST (2/3)	1,98	
			1,00			39,20	0,20				V1 EST (2/3)	7,84	
			2,00			33,38	0,20				V2 E V4 EST (2/3)	13,35	
			1,00			39,20	0,20				V3 EST (2/3)	7,84	
17.9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	36,94									36,94	36,94
			2,00			9,89	0,20				V5 E V8 EST (2/3)	3,96	
			1,00			9,89	0,20				V6 EST (2/3)	1,98	
			1,00			9,89	0,20				V7 EST (2/3)	1,98	
			1,00			39,20	0,20				V1 EST (2/3)	7,84	
			2,00			33,38	0,20				V2 E V4 EST (2/3)	13,35	
			1,00			39,20	0,20				V3 EST (2/3)	7,84	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
17.9.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	185,84									185,84	185,84
			1,00						40,56	EST (2/3)		40,56	
									145,28	EST (3/3)		145,28	
17.9.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,40									162,40	162,40
			1,00						34,40	EST (2/3)		34,40	
			1,00						128,00	EST (3/3)		128,00	
17.9.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	477,30									477,30	477,30
			1,00						108,10	EST (2/3)		108,10	
			1,00						369,20	EST (3/3)		369,20	
17.9.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	14,86									14,86	14,86
			1,00						3,24	EST (2/3)		3,24	
			1,00						11,62	EST (3/3)		11,62	
17.9.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	14,86									14,86	14,86
			1,00						3,24	EST (2/3)		3,24	
			1,00						11,62	EST (3/3)		11,62	
17.9.9	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	1,00	14,86	18,00						ADITIVO ACELERADOR	267,48	267,48
17.10	INFRAESTRUTURA - ESTACAS												0,00
17.10.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). SEM CONCRETO E SEM ARMAÇÃO. REF SINAPI = 100896	M	146,00									146,00	146,00
			28,00			5,00					EST (1/3)	140,00	
			4,00			1,50					EST (1/3)	6,00	
17.10.2	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	145,70									145,70	145,70
17.10.3	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	447,10									447,10	447,10
17.10.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,00						6,96		EST (1/3)	6,96	6,96
17.10.5	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	18,00	6,96							ADITIVO ACELERADOR	125,28	125,28
17.11	INFRA E SUPERESTRUTURA - 1 BOX												0,00
17.11.1	(REF. SINAPI 101166) ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1,00			14,44	0,20	0,50			ALVENARIA DO BOX 21	1,44	1,44
17.11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,00			23,24	0,50				FORMA DOS PILARES E VIGAS DO BOX 21	11,62	11,62
17.11.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,00	1,20		23,24					ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS DO BOX 21	111,55	111,55
17.11.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00	1,20	0,58	23,24					ARMAÇÃO DOS ESTRIBOS DO BOX 21	113,23	113,23
17.11.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,00			23,24	0,10	0,20			CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DO BOX 21	0,46	0,46
17.11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,00			23,24	0,10	0,20			CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DO BOX 22	0,46	0,46
17.12	PAREDES E PAINÉIS												0,00
17.12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,29									28,29	28,29
			1,00			6,64		2,20			ALVENARIA DO BOX 21	14,61	
			2,00			3,45		1,65			ALVENARIA DO BOX 22	11,39	
			1,00			2,55		0,90			ALVENARIA DA BANCADA DO BOX 21	2,30	
17.12.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,00			3,20		0,55				1,76	1,76
17.12.3	SBC (REF: 110822_04/2024) - BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	21,00			3,45		0,55			BANCADA DOS 21 BOXES	39,85	39,85
17.12.4	PAREDE COM PLACAS DE COMPENSADO. REF.: 96367 AF_06/2017_P	m²	21,00			3,50		0,60			PLACA DOS 21 BOXES	44,10	44,10
18	SECOM												
18.1	PAREDES E PAINÉIS												
18.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	165,64								CONFORME PROJETO	165,64	165,64
			1,00			47,01		2,80			PAREDES EXTERNAS	131,63	
			1,00			1,85		2,80			PAREDE INTERNA	5,18	
			2,00			1,90		2,80			PAREDES INTERNAS	10,64	
			1,00			4,38		2,80			PAREDES INTERNAS	12,26	
			1,00			5,95		2,80			PAREDE INTERNA	16,66	
			1,00			4,95		0,70			PAREDE EXTERNA	3,47	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			-1,00			0,53		0,53			DESCONTO BASCULANTE	-0,28	
			-4,00			1,50		1,20			DESCONTO JANELAS	-7,20	
			-4,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTAS	-6,72	
18.2	FORRO												
18.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,00						92,84		ÁREA DE FORRO - CONFORME PROJETO	92,84	92,84
18.3	ESQUADRIAS												
18.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00								CONFORME PROJETO	4,00	4,00
18.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,00			1,50		1,30			CONFORME PROJETO	5,85	5,85
18.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,00				0,53	0,53			CONFORME PROJETO	0,28	0,28
18.4	PISO												
18.4.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	m²	1,00						92,84		CONFORME PROJETO	92,84	92,84
18.5	PINTURA												0,00
18.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
18.5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
18.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
18.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
18.5.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
18.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA												0,00
18.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
18.6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
18.6.3	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
18.6.4	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
18.6.5	SINAPI (REF: 104667_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023	UN	2,00									2,00	2,00
18.6.6	SINAPI (REF: 104680_02/2024) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	2,00									2,00	2,00
18.6.7	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN											0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
18.6.8	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN											0,00
18.6.9	SBC (REF: 053850_03/2025) - FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 CONTRIBUINTES	UN											0,00
19.0	ESPAÇO DERACRE												
19.1	PINTURA												0,00
19.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²											0,00
19.1.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²											0,00
19.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											0,00
19.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											0,00
19.1.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²											0,00
19.1.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²											0,00
19.1.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											0,00
19.1.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²											0,00
19.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												0,00
19.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M											0,00
19.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M											0,00
19.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,00	2,00
19.2.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6,00	6,00
19.2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			12,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12,00	12,00
19.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,00	4,00
19.2.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,00	4,00
19.3	LOUÇAS E METAIS												0,00
19.3.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
19.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
19.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												0,00
19.4.1	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	2,00			18,00		1,00			GUARDA CORPO EM MADEIRA	36,00	36,00
19.4.2	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²											0,00
20.0	CASA DE FARINHA												
20.1	SINAPI (REF: 98457_03/2025) - CHAPA METÁLICA - CHAMINÉ	m²											0,00
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15,02									7,07	7,07
			1,00			4,71		0,70			FORNO REDONDO	3,30	
			2,00			5,40		0,70			FORNO RETANGULAR	7,56	
			1,00			4,40		0,70			BANCADA DE TANQUE	3,08	
			1,00			1,20		0,90			BANCADA DE TANQUE	1,08	
			1,00						(7,95)		(DESC. QUANTI. DA PLANILHA)	-7,95	
20.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	15,02									7,07	7,07
			1,00			4,71		0,70			FORNO REDONDO	3,30	
			2,00			5,40		0,70			FORNO RETANGULAR	7,56	
			1,00			4,40		0,70			BANCADA DE TANQUE	3,08	
			1,00			1,20		0,90			BANCADA DE TANQUE	1,08	
			1,00						(7,95)		(DESC. QUANTI. DA PLANILHA)	-7,95	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
21.0	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS												
21.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			450,00					REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	450,00	450,00
21.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
21.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
21.4	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
21.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00								REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	20,00	20,00
22.0	JARDINEIRAS												
22.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,50								DEMOLIÇÃO DE ALVENRIA DAS JARDINEIRAS	4,50	4,50
			4,00			9,80	0,10	0,60				2,35	
			4,00			3,83	0,10	0,60				0,92	
			3,00			6,80	0,10	0,60				1,22	
23	SEFAZ E SAMU												
23.1	PAREDES E PAINÉIS											0,00	0,00
23.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS		84,45								PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	84,45	84,45
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			0,00						(3,90)		DESCONTO DE JANELAS - SEFAZ	-3,90	
			0,00						(7,35)		DESCONTO DE PORTAS - SEFAZ	-7,35	
23.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²											0,00
23.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²											0,00
23.2	FORRO												0,00
23.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	32,17								FORRO EM DRYWALL	32,17	32,17
			1,00			5,95	2,45				SEFAZ	14,58	
			1,00			6,75	2,25				SEFAZ	15,19	
			1,00			2,00	1,20				SEFAZ	2,40	
23.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	41,20								ACABAMENTOS PARA FORRO	41,20	41,20
			2,00			8,40					(5,95+2,45=8,4) - SEFAZ	16,80	
			2,00			9,00					(6,75+2,25=9) - SEFAZ	18,00	
			2,00			3,20					(2+1,2=3,2) - SEFAZ	6,40	
23.3	ESQUADRIAS												
23.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN											
23.3.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²											
23.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²											
23.3.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²											
23.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
23.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00			100,00					INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 100M NA SEFAZ	100,00	100,00
23.4.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3 NA SEFAZ	3,00	3,00
23.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00								INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8 NA SEFAZ	8,00	8,00
23.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN											
23.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN											
23.4.6	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN											
23.4.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
23.5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
23.5.1	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			10,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10M NA SEFAZ	10,00	10,00
23.5.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00			4,00					INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4M NA SEFAZ	4,00	4,00
23.5.4	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.5.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2 NA SEFAZ	2,00	2,00
23.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.5.7	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.5.8	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.5.9	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.6	LOUÇAS E METAIS												0,00
23.6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.6.2	SINAPI (REF: 86895_04/2024) - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM 0,80X0,60 COM 01 CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	1,00								INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 NA SEFAZ	1,00	1,00
23.6.3	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN											0,00
23.7	PINTURA												0,00
23.7.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	100,84	2,00								201,67	0,00
			2,00			5,75		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	33,35	
			1,00			2,45		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	7,11	
			1,00			0,85		2,90			PAREDES ATENDIMENTO - SEFAZ	2,47	
			2,00			6,85		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	39,73	
			1,00			2,25		2,90			PAREDES SECRETÁRIO - SEFAZ	6,53	
			-2,00			1,50		1,30			DESCONTO DAS JANELAS - SEFAZ	-3,90	
			-2,00			1,75		2,10			DESCONTO DE PORTAS - SEFAZ	-7,35	
			1,00						22,91		BANHEIRO - SEFAZ	22,91	
23.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
23.7.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
23.7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
23.7.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
23.8	REVESTIMENTO CERÂMICO												
23.8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	m²	30,00			0,45	0,45					6,08	6,08
24	DECK PISCICULTURA												
24.1	MOVIMENTO DE TERRA												
24.1.1	SBC REF:(020014_02/2025) - REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO	m³											
24.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
24.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²											
24.1.4	SINAPI (REF: 96995_07/2023) - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³											
24.2	INFRAESTRUTURA												
24.2.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M											
24.2.2	SBC (REF: 040077_04/2024) - VIGA DE MADEIRA 2"X5" (TRAVEJAMENTO DO PISO) FORNECIMENTO E MONTAGEM	M											
24.3	SUPERESTRUTURA												
24.3.1	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²											
24.3.2	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 15X15	M											
24.4	PINTURA												
24.4.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
24.5	SERVIÇOS DIVERSOS												
24.5.1	SBC (REF: 130358_02/2025) - CORDAO NYLON PARA RODAPES	M											
24.5.2	ESCADA DE MADEIRA	m²											
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS												
25.1	SINAPI (REF: 97638_02/2025) - REMOCAO DE PAREDE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²											
25.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN											
25.3	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²											
25.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²											
25.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²											
25.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²											
25.7	SINAPI (REF: 104802_02/2025) - REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²											
25.8	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m²											
25.9	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M											
25.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M											
25.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN											
26	LIMPEZA FINAL												
26.1	SINAPI (REF:9537_11/2018) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²											
27	PÓRTICO PRINCIPAL												
27.1	FORRO, ACM E LETREIRO	m²											
27.1.1	SBC (REF:121580_10/2024) - PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM	m²											
27.1.2	SINAPI (REF:96485_03/2025) - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,00			26,00	4,54				ÁREA DO FORRO DE PVC EMBAIXO DO PORTAL	118,04	118,04
27.1.3	SBC (REF:121580_10/2024) - LETREIRO EM ACRILICO COM LED	UND	2,00								LETREIRO DA FACHADA	2,00	2,00
27.2	PINTURA												
27.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²											
27.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²											
27.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
28	ESPAÇO PCD												
28.1	PISOS												
28.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	16,00			1,00	0,15	0,15			PILARES DE MADEIRA	0,36	0,36
28.1.2	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M	16,00			1,00					INFRAESTRUTURA	16,00	16,00
28.1.3	SINAPI (REF: 101746_04/2024) - ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	30,60									30,60	30,60
			1,00			10,00	1,50				RAMPA	15,00	
			1,00			6,50	2,40				PATAMAR	15,60	
28.2	GUARDA CORPO												
28.2.1	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M	1,00			37,80					CONTORNO DA RAMPA E PATAMAR	37,80	37,80
28.3	PINTURA												
28.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
29	PALCO PRINCIPAL												
29.1	VEDAÇÃO												
29.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	263,12									263,12	263,12
			1,00			13,00	2,00				VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	26,00	
			1,00			50,00	2,00				VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	100,00	
			1,00			28,50	2,00				VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	57,00	
			1,00			29,00	2,00				VEDAÇÃO DA ÁREA DO PALCO	58,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			7,90		2,80			VEDAÇÃO NO VÃO DO ESTÁDIO	22,12	
29.2	CAMARIM												0,00
29.2.1	PAREDES EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA COM FECHAMENTO DUPLO (REF: SBC 120067 - 02/2026)	m²											0,00
29.2.2	SBC (REF: 120067_04/2024) - PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA	m²											0,00
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP												0,00
30.1	PAREDES E PAINÉIS												0,00
30.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	104,31									104,31	104,31
			3,00			4,00		2,60			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	31,20	
			2,00			2,20		2,60			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	11,44	
			1,00			2,00		2,60			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	5,20	
			1,00			6,70		2,60			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	17,42	
			-3,00			0,80		2,60			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-6,24	
			-3,00			1,50		1,20			DESCONTO PORTAS ESPAÇO COMUNICAÇÃO	-5,40	
			2,00			5,70		2,60			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	29,64	
			2,00			3,20		2,60			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	16,64	
			1,00			2,15		2,60				5,59	
			-2,00			1,30		1,10			DESCONTO JANELAS SEJUSP	-2,86	
			1,00			0,80		2,10			DESCONTO PORTA SEJUSP	1,68	
30.2	FORRO												
30.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	40,80									40,80	40,80
			2,00			2,35		4,80			ESPAÇO COMUNICAÇÃO	22,56	
			1,00			5,70		3,20			ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	18,24	
30.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	45,60									45,60	45,60
			2,00			14,30					ESPAÇO COMUNICAÇÃO	28,60	
			1,00			17,00					ESPAÇO SEJUSP - GABINETE SECRETARIO	17,00	
30.3	PINTURA												
30.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
30.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
30.3.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
30.3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
30.4	ESQUADRIAS												
30.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN											
30.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN											
30.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²											
31	SERVIÇOS DIVERSOS												
31.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M											
31.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP											
31.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m²											
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA												
32.1	PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 4X7,5CM - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 92543	M											
32.2	ASSOALHO DE COMPENSADO - INSTALAÇÃO - REF SINAPI 101746	m²											
32.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²											
32.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
32.5	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,00M - REF. SBC (012003 - 07/2023)	M											
32.6	GUARDA CORPO COM ALTURA DE 1,00 M, CORRIMÃO EM MADEIRA APARELHADA NATIVA DA REGIÃO.	M											
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO												
33.1	INSTITUCIONAL												0,00
33.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	3,00	3,00
33.1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	3,00	3,00
33.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	4,00	4,00
33.1.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	30,00	30,00
33.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.7	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	24,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	24,00	24,00
33.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	1.250,00	1.250,00
33.1.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	30,00	30,00
33.1.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	8,00	8,00
33.1.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	24,00	24,00
33.1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	200,00	200,00
33.1.14	CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 3 X 16 MM TENSÃO DE ISOLAMENTO: 0,6/1,0 KV CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO COMPACTADO. ISOLAÇÃO: POLIETILENO RETICULADO - XLPE - 90C CONDUTOR NEUTRO: ALUMÍNIO NU . REF - (SINAPI 91935)	M	50,00								utilizado para as instalações elétricas das salas institucionais, circuitos de força e iluminação.	50,00	50,00
33.2	TENDAS 2,00M X 2,00M												
33.2.1	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND											
33.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M											
33.2.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND											
33.2.4	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND											
33.3	TENDAS 5,00M X 5,00M												
33.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M											
33.3.2	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND											
33.3.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND											
33.3.4	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND											
33.3.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND											
33.4	TENDAS 8,00M X 8,00M E 10,00M X 10,00M												
33.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.250,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	3.250,00	3.250,00
33.4.2	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND	830,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	830,00	830,00
33.4.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND	1.820,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	1.820,00	1.820,00
33.4.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	325,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	325,00	325,00
33.4.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND	130,00								utilizado para as instalações elétricas das tendas 08x08 e 10 x 10, circuitos de força e iluminação.	130,00	130,00
33.5	TENDAS 12,00M X 12,00M												
33.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.5.2	PLUG FEMEA 2P + T 20A REF.SINAPI: 91998	UND											
33.5.3	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 101550 CADERNO TÉCNICO SINAPI	UND											
33.5.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND											
33.5.5	REFLETOR DE LED 400W IP68 REF. SINAPI: 105921	UND											
33.6	SECOM E SEFAZ												
33.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	20,00	20,00
33.6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	10,00	10,00
33.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	9,00	9,00
33.6.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 50 a 100W REF. SINAPI: 103788	UND	15,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	15,00	15,00
33.6.5	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	15,00	15,00
33.6.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	20,00	20,00
33.6.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	9,00	9,00
33.6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	350,00	350,00
33.6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMNAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	850,00								utilizado para as instalações elétricas dos espaço da SECOM e SEFAZ, circuitos de força e iluminação.	850,00	850,00
33.7	RESTAURANTES												0,00
33.7.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	42,00	42,00
33.7.2	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	84,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	84,00	84,00
33.7.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.5	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.6	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	21,00	21,00
33.7.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	1,00	1,00
33.7.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	61,00	61,00
33.7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMNAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	472,24								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	472,24	472,24
33.7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.389,58								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	3.389,58	3.389,58
33.7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,60								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	10,60	10,60
33.7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,60								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	45,60	45,60
33.7.13	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
33.7.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	168,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	168,00	168,00
33.7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	4,00	4,00
33.7.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	11,00	11,00
33.7.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	11,00	11,00
33.7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 101895	UN	4,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	4,00	4,00
33.7.19	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4". REF.: SBC 063756 10/2024	UND	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.7.20	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: CADERNO TÊC. 97236	M	83,86								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	83,86	83,86
33.7.21	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	220,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	220,00	220,00
33.7.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,40								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	11,40	11,40
33.7.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	464,15								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	464,15	464,15
33.7.24	LUMINÁRIA PENDENTE TIPO PRISMÁTICA, COM 1 LÂMPADA LED DE 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 97605	UN	42,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	42,00	42,00
33.7.25	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 105920	UN	24,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	24,00	24,00
33.7.26	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	1,00	1,00
33.7.27	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO SUSTENTAÇÃO. REF.: 96562	M	50,40								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	50,40	50,40
33.7.28	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.7.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101879)	UN	2,00								utilizado para as instalações elétricas do Restaurante idem projeto, circuitos de força e iluminação.	2,00	2,00
33.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												0,00
33.8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO ISOLADO, 2X4 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.250,00								Iténs necesarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	1.250,00	1.250,00
33.8.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00								Iténs necesarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	100,00	100,00
33.8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00								Iténs necesarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	25,00	25,00
33.8.4	ref. SINAPI (92984) - CABO TRIPLEX DE 3X16+1X16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.500,00								Iténs necesarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	4.500,00	4.500,00
33.8.5	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM REF: SBC: 063026	UND	14.500,00								Iténs necesarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	14.500,00	14.500,00
33.8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00								Iténs necesarios para conclusão das tendas devido o aumento no quantitativos de tendas.	50,00	50,00
34	SEMA E IMAC												
34.1	PAREDES E PAINÉIS												
34.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	2,00			32,00		2,90			PAREDES EM DRYWALL DA SEMA E IMA	185,60	185,60
34.2	FORRO												
34.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,00			10,00	3,00				FORRO EM DRYWALL DA SEMA E DO IMAC	60,00	60,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
34.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	2,00			38,00					FORRO EM DRYWALL DA SEMA E DO IMAC	76,00	76,00
34.3	ESQUADRIAS												
34.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN											
34.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²											
34.4	PINTURA												
34.4.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
34.4.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
34.4.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²											
34.4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²											
34.4.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²											
34.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
34.5.1	SINAPI (REF: 105042_04/2024) - PILAR DE MADEIRA 10X10 (BARROTE)	M											
34.5.2	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG											
34.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M											
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO												
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN											
35.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTOR. REF. SBC (172858 - 07/2025)	UN											
35.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm - REF. SBC (055035-05)	UN											
35.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	m²											
35.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN											
35.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN											
35.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M											

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026


ENGº CIVIL ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Objeto do Contrato:


Órgão Contratante:

Construtora:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ESTRUTURA METALICA DOS RESTAURANTES (COMPLETO)

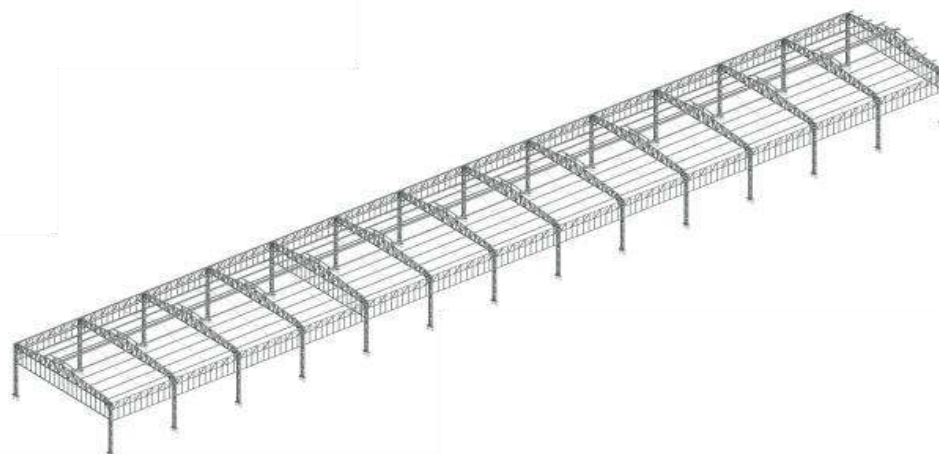


BOX ALIMENTAÇÃO - COMPLETO (INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, PAREDES DE COMPENSADO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PISO)



1 PLANTA BAIXA ALIMENTAÇÃO - 6 TENDAS
1:100

ESPAÇO PCD - PISO E GUARDA-CORPO

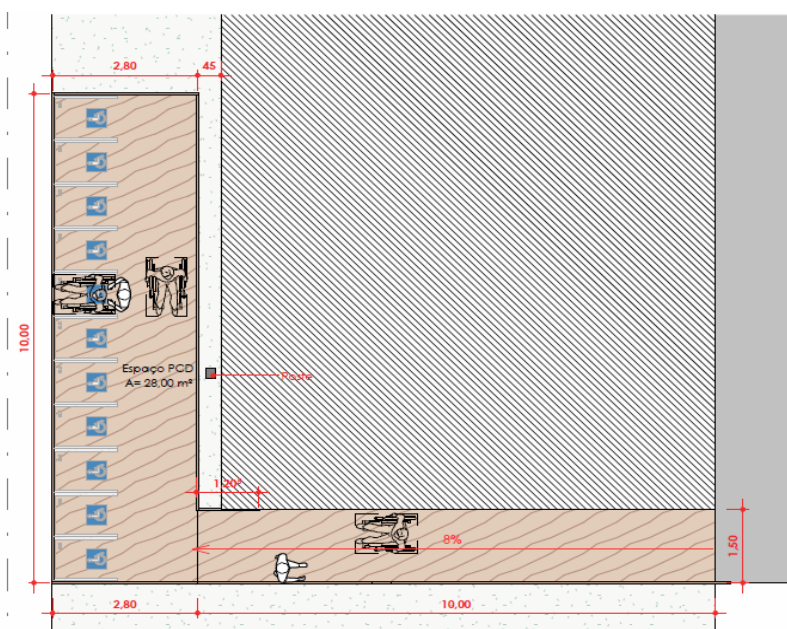



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Objeto do Contrato:


Órgão Contratante:

Construtora:


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PAREDES E FORRO DE GESSO, ELETRICA, RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DO PISO DA SECOM

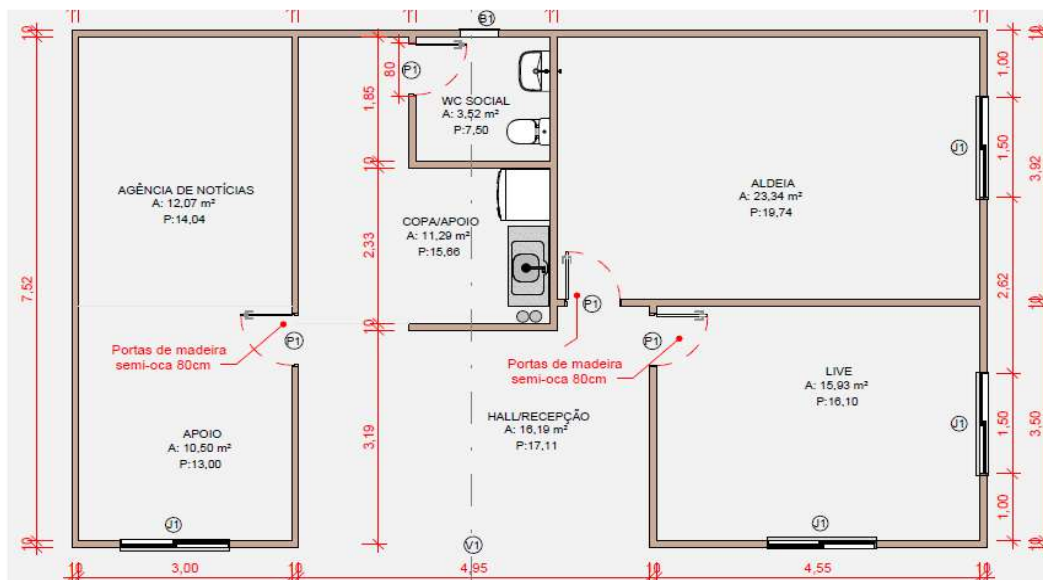

GESSO, RECUPERAÇÃO DE PISO, ELETRICA E BANHEIRO DA SEFAZ

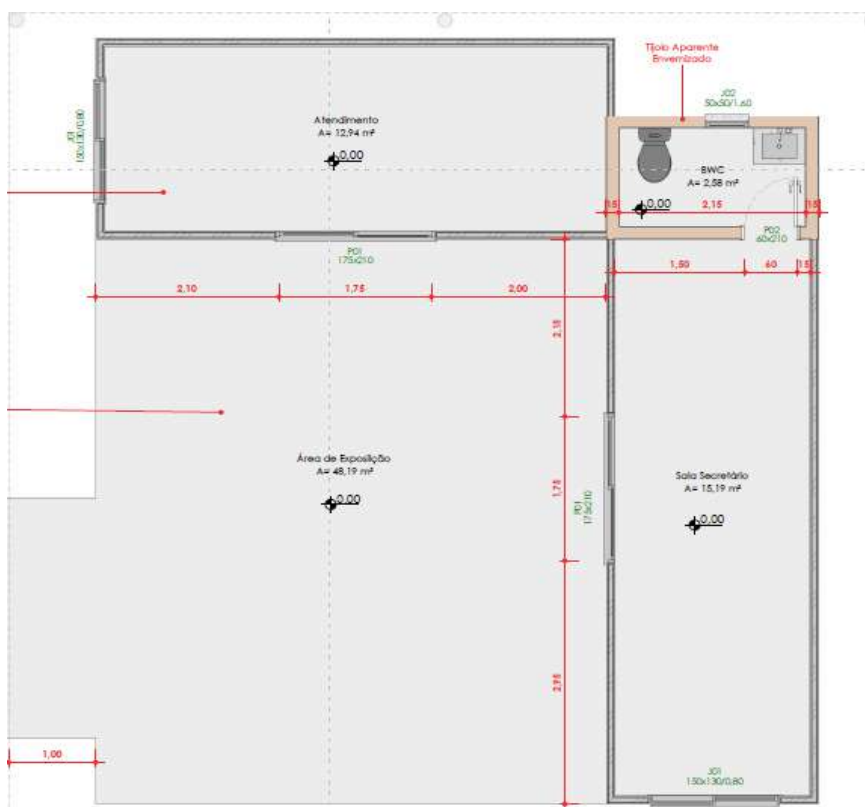



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Objeto do Contrato:


Órgão Contratante:

Construtora:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP


FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

PAREDES DE GESSO E ELETRICA SEMA E IMAC

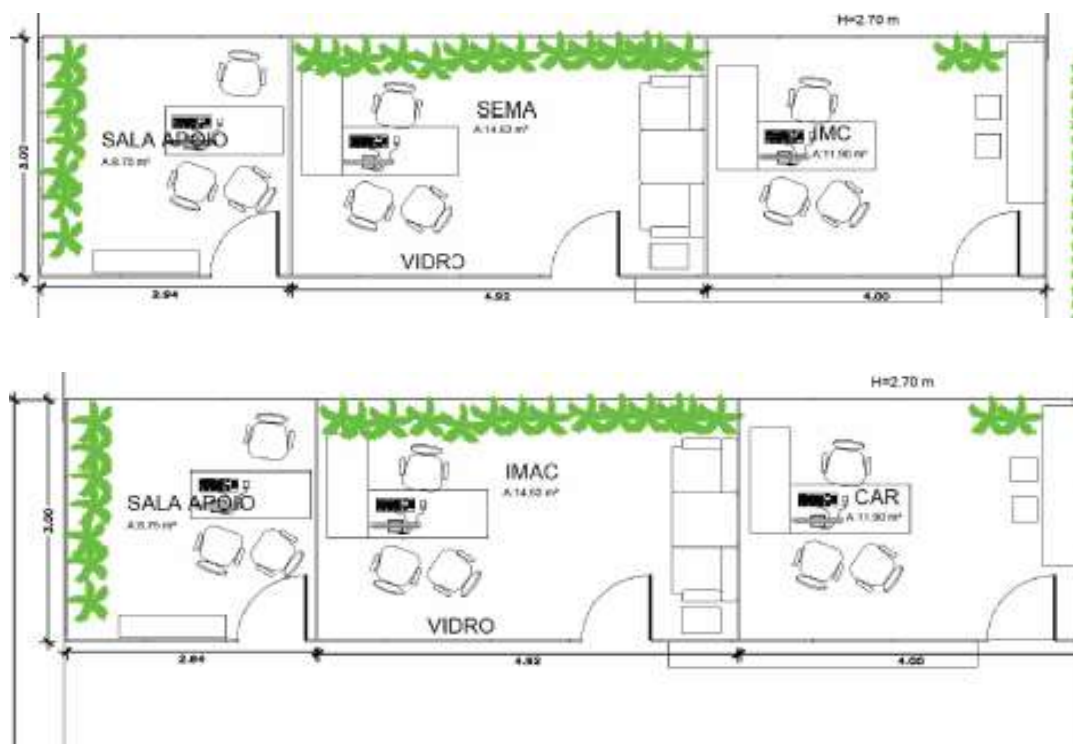

GABINETE DA GOVERNADORA

Alvenaria, Revestimento e esquadrias medidas

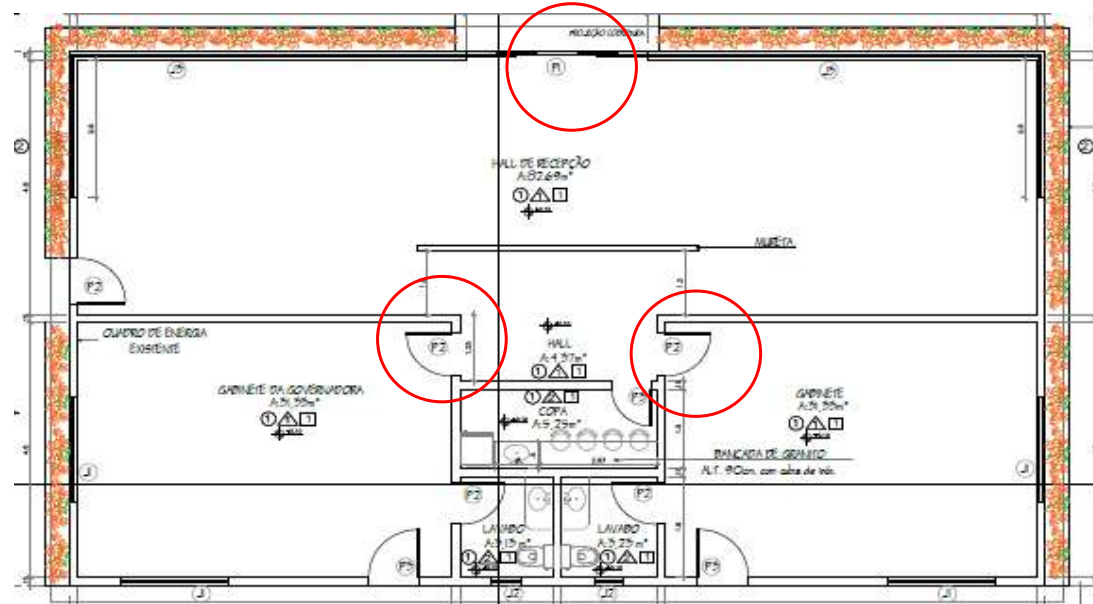



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Objeto do Contrato:


Órgão Contratante:

Construtora:


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

REVESTIMENTO DAS PAREDES

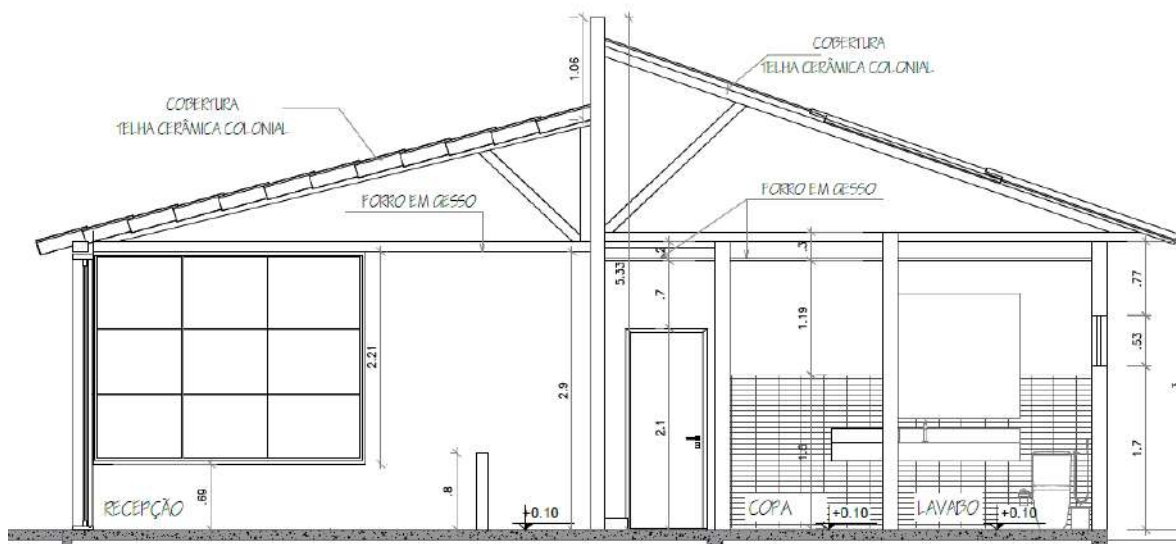

ESTRUTURAL DO GABINETE

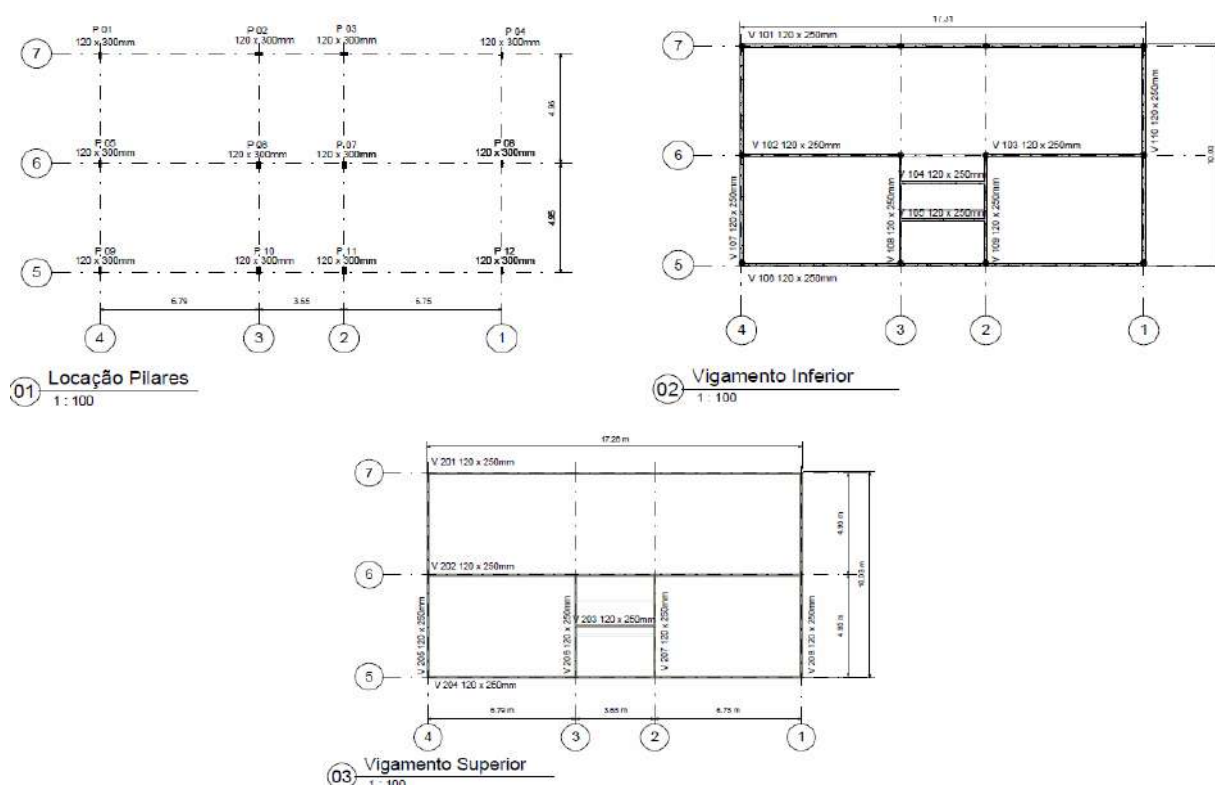



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.


Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:


Construtora:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP


FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

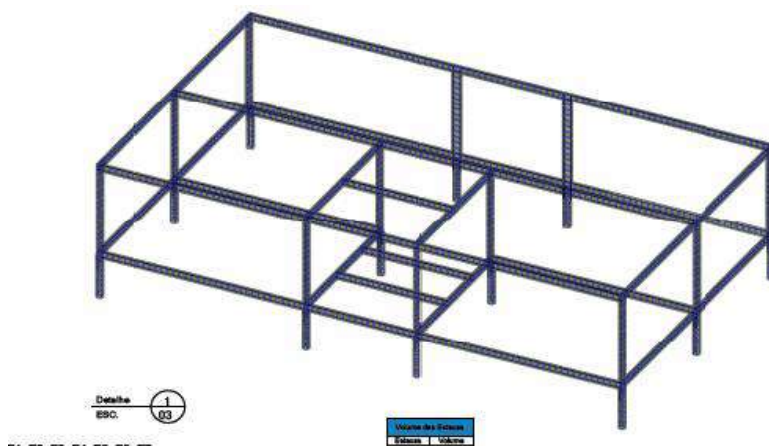

CANTEIRO DE OBRAS

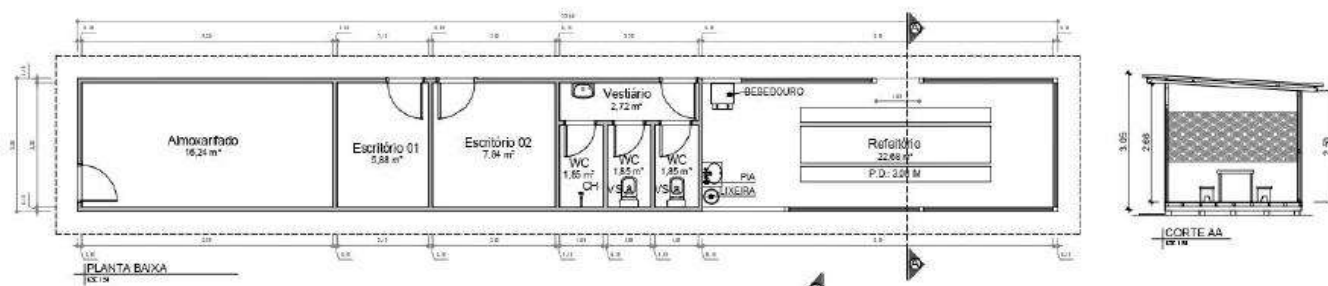

INSTITUCIONAL

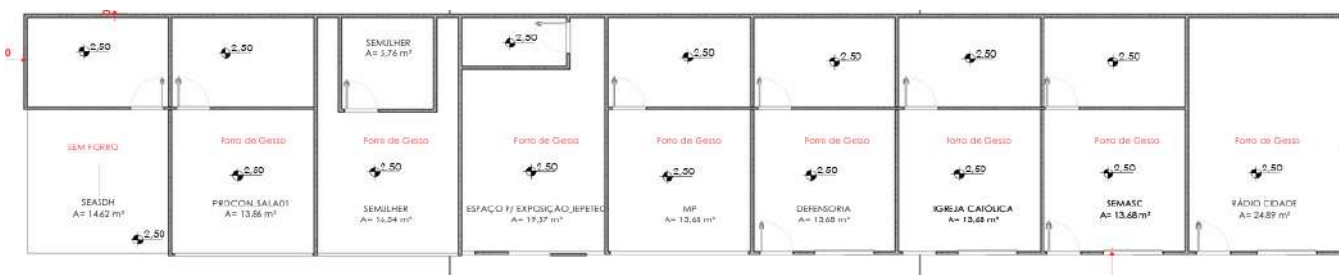

ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora:


SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

INSTITUCIONAL



GABINETE SEJUSP

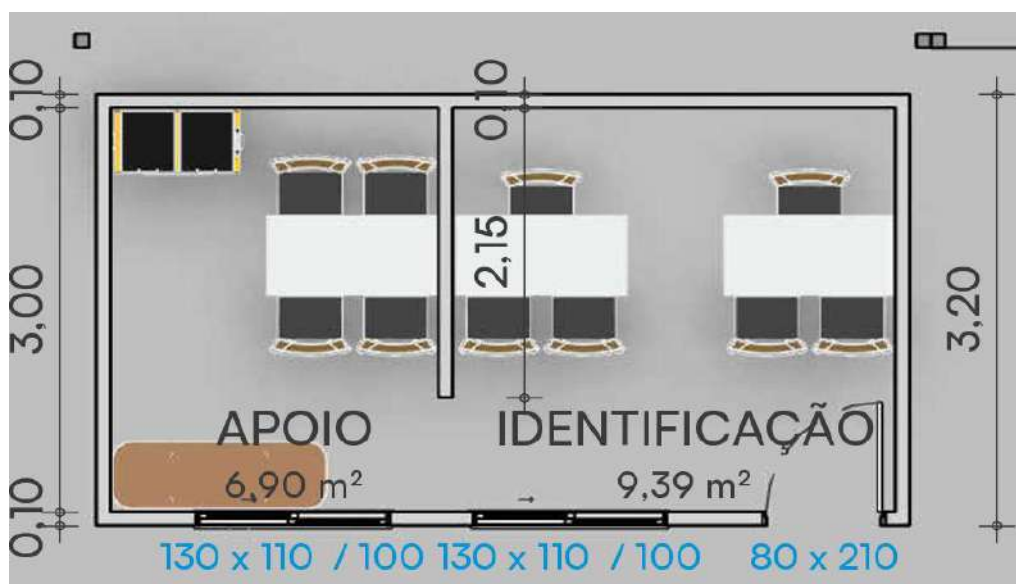



ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

An aerial photograph of the University of Utah campus. The image shows a large, complex of buildings with grey roofs, surrounded by green lawns and trees. A prominent road with a roundabout is visible on the left side. The campus is situated in a valley, with hills visible in the background.


ENGº CIVIL ISABELLE LIMA
 CREA 21809 D/AC

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora: FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

02/06/2026

02/07/2026

EXECUÇÃO EXPIRADA

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	06/2026	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (TCU Decisão nº 1332/02 e Acórdão 325/07)	78.040,00	2,01%	78.040,00	100,00%	78.040,00	
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.191,98	0,13%	5.191,98	100,00%	83.231,98	
3	CANTEIRO DE OBRAS	46.274,66	1,19%	46.274,66	100,00%	129.506,64	
4	PLANTIO DE GRAMA	31.424,56	0,81%	31.424,56	100,00%	160.931,20	
5	PISOS	673.602,98	17,35%	673.602,98	100,00%	834.534,18	
6	BOX DE ALIMENTAÇÃO - 24 UNIDADES	165.014,33	4,25%	165.014,33	100,00%	999.548,50	
7	DRENAGEM	11.756,02	0,30%	11.756,02	100,00%	1.011.304,53	
8	ESPAÇO RODEIO (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	11.161,44	0,29%	11.161,44	100,00%	1.022.465,97	
9	PISO COMPENSADO	226.054,47	5,82%	226.054,47	100,00%	1.248.520,44	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.921,10	0,49%	18.921,10	100,00%	1.267.441,54	
11	PLANTÃO EXPO JURUÁ	13.064,32	0,34%	13.064,32	100,00%	1.280.505,86	
12	BOX INSTITUCIONAL - 10 UNIDADES	219.587,29	5,65%	219.587,29	100,00%	1.500.093,15	
13	ESPAÇO MAJORITÁRIO - GABINETE DA GOVERNADORA	360.456,41	9,28%	360.456,41	100,00%	1.860.549,56	
14	PAISAGISMO	78.670,84	2,03%	78.670,84	100,00%	1.939.220,40	
15	ESPAÇO INDUSTRIA	282.108,63	7,26%	282.108,63	100,00%	2.221.329,03	
16	ESPAÇO AGRO - BAIAS	149.566,99	3,85%	149.566,99	100,00%	2.370.896,02	
17	BOX DOS RESTAURANTES (21 UND) (3,00 M X 4,00 M)	425.969,53	10,97%	425.969,53	100,00%	2.796.865,55	
18	SECOM	61.307,24	1,58%	61.307,24	100,00%	2.858.172,79	
19	ESPAÇO DERACRE	42.466,19	1,09%	42.466,19	100,00%	2.900.638,98	
20	CASA DE FARINHA	1.430,70	0,04%	1.430,70	100,00%	2.902.069,68	
21	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS	16.966,80	0,44%	16.966,80	100,00%	2.919.036,48	
22	JARDINEIRAS	304,47	0,01%	304,47	100,00%	2.919.340,95	
23	SEFAZ E SAMU	113.738,18	2,93%	113.738,18	100,00%	3.033.079,13	
24	DECK PISCICULTURA	33.886,10	0,87%	33.886,10	100,00%	3.066.965,23	
25	DESMONTAGENS E RETIRADAS	33.833,06	0,87%	33.833,06	100,00%	3.100.798,29	
26	LIMPEZA FINAL	8.420,00	0,22%	8.420,00	100,00%	3.109.218,29	
27	PÓRTICO PRINCIPAL	52.277,29	1,35%	52.277,29	100,00%	3.161.495,58	
28	ESPAÇO PCD	10.155,47	0,26%	10.155,47	100,00%	3.171.651,05	
29	PALCO PRINCIPAL	59.593,28	1,53%	59.593,28	100,00%	3.231.244,33	
30	ESPAÇO TRE, COMUNICAÇÃO E SEJUSP	43.295,26	1,11%	43.295,26	100,00%	3.274.539,59	
31	SERVIÇOS DIVERSOS	9.373,01	0,24%	9.373,01	100,00%	3.283.912,60	
32	PLATAFORMA ELEVADA DE SEGURANÇA	2.759,00	0,07%	2.759,00	100,00%	3.286.671,60	
33	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - BAIXA TENSÃO	518.215,30	13,35%	518.215,30	100,00%	3.804.886,90	
34	SEMA E IMAC	57.703,14	1,49%	57.703,14	100,00%	3.862.590,04	
35	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	20.608,25	0,53%	20.608,25	100,00%	3.883.198,29	
TOTAL NO PERÍODO				3.883.198,29	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		3.883.198,29	100,00%	3.883.198,29	100,00%		

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026

ENGº CIVIL ISABELLE LIMA
CREA-24609 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora: FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 1
Placa da Obra

Local: Área externa



Imagem 2
Placa da Obra

Local: Área externa



Imagem 3
Execução de almoxarifado

Local: Área externa



Imagem 4
Execução do escritório

Local: Área externa



Imagem 5
Execução de Refeitório

Local: Área externa



Imagem 6
Execução de Refeitório



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 7

Execução de sanitário

Local: Área externa



Imagem 8

Execução de sanitário

Local: Área externa



Imagem 9

Execução de escritório

Local: Área externa



Imagem 10

Execução de escritório

Local: Área externa



Imagem 11

Entrada de energia

Local: Área externa



Imagem 12

Entrada de energia



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 13

Demolição de argamassa

Local: Área externa



Imagem 14

Demolição de argamassa

Local: Área externa



Imagem 15

ARGAMASSA

Local: Área externa



Imagem 16

ARGAMASSA

Local: Área externa



Imagem 17

ARGAMASSA

Local: Área externa



Imagem 18

ARGAMASSA



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 19

ARGAMASSA

Local: Área externa



Imagem 20

Lastro de concreto magro

Local: Área externa



Imagem 21

Lastro de concreto magro

Local: Área externa



Imagem 22

Lastro de concreto magro

Local: Área externa



Imagem 23

Lastro de concreto magro

Local: Área externa



Imagem 24

Lastro de concreto magro



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 25

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO

Local: Área externa



Imagem 26

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO

Local: Área externa



Imagem 27

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA

Local: Área externa



Imagem 28

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA

Local: Área externa



Imagem 29

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA

Local: Área externa



Imagem 30

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 31

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Local: Área externa



Imagem 32

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Local: Área externa



Imagem 33

ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ATERRO MANUAL

Local: Área externa



Imagem 34

ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ATERRO MANUAL

Local: Área externa



Imagem 35

Compactação de solo

Local: Área externa



Imagem 36

Compactação de solo



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 37

Recuperação de calçadas

Local: Área externa



Imagem 38

Recuperação de calçadas

Local: Área externa



Imagem 39

Recuperação de calçadas

Local: Área externa



Imagem 40

Recuperação de calçadas

Local: Área externa



Imagem 41

Execução de piso armado

Local: Área externa



Imagem 42

Execução de piso armado



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 43

Execução de piso armado

Local: Área externa



Imagem 44

Execução de piso não armado

Local: Área externa



Imagem 45

Execução de piso não armado

Local: Área externa



Imagem 46

Execução de piso não armado

Local: Área externa



Imagem 47

Execução de piso não armado

Local: Área externa



Imagem 48

Limpeza com vassoura



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 49

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA

Local: Área externa



Imagem 50

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA

Local: Área externa



Imagem 51

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 52

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 53

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 54

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 55

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 56

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 57

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 58

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 59

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA

Local: Área externa



Imagem 60

PAREDE EM CHAPAS COMPENSADO MADEIRA



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 61

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

Local: Área externa



Imagem 62

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA

Local: Área externa



Imagem 63

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

Local: Área externa



Imagem 64

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO

Local: Área externa



Imagem 65

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 66

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 67

ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

Local: Área externa



Imagem 68

ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

Local: Área externa



Imagem 69

ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"

Local: Área externa



Imagem 70

PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 71

PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 72

PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 73

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 74

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 75

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 76

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 77

FORRO EM DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 78

FORRO EM DRYWALL - INSTITUCIONAL



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 79

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 80

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 81

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER

Local: Área externa



Imagem 82

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER

Local: Área externa



Imagem 83

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES

Local: Área externa



Imagem 84

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 85

DEMOLIÇÃO DE PISO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa

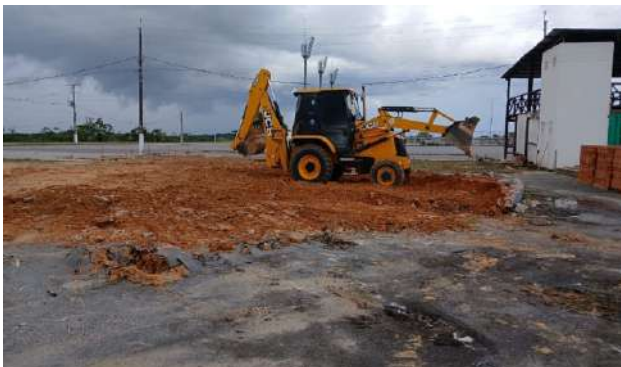


Imagem 86

DEMOLIÇÃO DE PISO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 87

Forma e concretagem da viga baldrame Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 88

Forma e concretagem da viga baldrame do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 89

Armação de pilares e vigas do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 90

Armação de pilares e vigas do Espaço Majoritário



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 91

Armação de pilares e vigas do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 92

Formas de pilares e vigas do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 93

Formas de pilares e vigas do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 94

Formas de pilares e vigas do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 95

Pilares e vigas do Espaço Majoritário

Local: Área externa



Imagem 96

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 97

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 98

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 99

REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 100

REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 101

CONTRAPISO EM ARGAMASSA DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 102

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 103

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 104

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 105

EXECUÇÃO DE PASSEIO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 106

EXECUÇÃO DE PASSEIO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 107

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E MASSA ÚNICO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 108

EXECUÇÃO DE EMBOÇO E MASSA ÚNICO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 109

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 110

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 111

FORRO EM PLACAS DE GESSO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 112

FORRO EM PLACAS DE GESSO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 113

FORRO EM PLACAS DE GESSO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 114

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 115

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 116

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 117

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 118

JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO

Local: Área externa



Imagem 119

JANELA DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO

Local: Área externa



Imagem 120

PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 121

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ

Local: Área externa



Imagem 122

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ

Local: Área externa



Imagem 123

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 124

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 125

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA

Local: Área externa



Imagem 126

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 127

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 128

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 129

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 130

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 131

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 132

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 133

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E DISJUNTORES DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 134

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 135

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO DO ESPAÇO MAJORITÁRIO

Local: Área externa



Imagem 136

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DO ESPAÇO INDÚSTRIA

Local: Área externa



Imagem 137

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DO ESPAÇO INDÚSTRIA

Local: Área externa



Imagem 138

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DO ESPAÇO INDÚSTRIA



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 139

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA NO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 140

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA NO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 141

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA NO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 142

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA NO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 143

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO DAS BAIAS

Local: Área externa



Imagem 144

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO DAS BAIAS



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 145

CAIBRO APARELHADO DO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 146

CAIBRO APARELHADO DO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 147

CAIBRO APARELHADO DO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 148

CAIBRO APARELHADO DO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 149

CAIBRO APARELHADO DO ESPAÇO INDUSTRIA

Local: Área externa



Imagem 150

PORTA COMPLETA DAS BAIAS



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 151

PORTA COMPLETA DAS BAIAS

Local: Área externa



Imagem 152

PORTA COMPLETA DAS BAIAS

Local: Área externa



Imagem 153

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO DO PORTAL AGRO

Local: Área externa



Imagem 154

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO DO PORTAL AGRO

Local: Área externa



Imagem 155

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES - 21 UNIDADES

Local: Área externa



Imagem 156

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES - 21 UNIDADES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 157

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES - 21 UNIDADES

Local: Área externa



Imagem 158

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES - 21 UNIDADES

Local: Área externa



Imagem 159

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS RESTAURANTES - 21 UNIDADES

Local: Área externa



Imagem 160

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO DO BOX DE RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 161

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO DO BOX DE RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 162

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO DO BOX DE RESTAURANTES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 163

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO DO BOX DE RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 164

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS - BOX DE RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 165

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS - BOX DE RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 166

PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 167

PERFIL U 100X50X3 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 168

ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25 - BOX RESTAURANTES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 169

ESTRUTURA EM PERFIL U 92X30X2.25 E PERFIL U 100X50X3 - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 170

PERFIL U 100X50X3 - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 171

CONTRAVENTAMENTO - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 172

CONTRAVENTAMENTO - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 173

PLACA DE BASE - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 174

PLACA DE BASE - BOX RESTAURANTES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 175

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 176

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 177

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 178

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 179

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 180

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO - BOX RESTAURANTE



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 181

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 182

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 183

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 184

CONCRETO FCK = 25MPa - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 185

CONCRETO FCK = 25MPa - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 186

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA - BOX RESTAURANTES



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 187

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 188

CONCRETO FCK = 25MPa - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 189

CONCRETO FCK = 25MPa - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 190

ESTACA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 191

ESTACA - BOX RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 192

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - 01 BOX RESTAURANTE



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 193

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES - 01 BOX RESTAURANTE

Local: Área externa



Imagem 194

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS - 01 BOX RESTAURANTE

Local: Área externa



Imagem 195

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 196

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 197

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 198

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 199

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 200

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 201

FORRO EM DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 202

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SECOM

Local: Área externa



Imagem 203

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA - SECOM

Local: Área externa



Imagem 204

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - SECOM



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 205

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SECOM

Local: Área externa



Imagem 206

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SECOM

Local: Área externa



Imagem 207

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA - ESPAÇO DERACRE

Local: Área externa



Imagem 208

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA - ESPAÇO DERACRE

Local: Área externa



Imagem 209

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA - CASA DE FARINHA

Local: Área externa



Imagem 210

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA - CASA DE FARINHA



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 211

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS - CASA DE FARINHA

Local: Área externa



Imagem 212

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS - CASA DE FARINHA

Local: Área externa



Imagem 213

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS

Local: Área externa



Imagem 214

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS

Local: Área externa



Imagem 215

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS

Local: Área externa



Imagem 216

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS STANDERS



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 217

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO - JARDINEIRAS

Local: Área externa



Imagem 218

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO - JARDINEIRAS

Local: Área externa



Imagem 219

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO - JARDINEIRAS

Local: Área externa



Imagem 220

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 221

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 222

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEFAZ



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 223

FORRO EM DRYWALL - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 224

FORRO EM DRYWALL - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 225

LOUÇAS E METAIS - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 226

LOUÇAS E METAIS - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 227

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 228

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA - SEFAZ



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 229

FORRO EM RÉGUAS DE PVC - PÓRTICO PRINCIPLA PORTAL

Local: Área externa



Imagem 230

FORRO EM RÉGUAS DE PVC - PÓRTICO PRINCIPLA PORTAL

Local: Área externa



Imagem 231

LETREIRO EM ACRILICO COM LED - PORTAL PRINCIPAL

Local: Área externa



Imagem 232

LETREIRO EM ACRILICO COM LED - PORTAL PRINCIPAL

Local: Área externa



Imagem 233

ESPAÇO PCD

Local: Área externa



Imagem 234

ESPAÇO PCD



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 235

ESPAÇO PCD

Local: Área externa



Imagem 236

ESPAÇO PCD

Local: Área externa



Imagem 237

TAPUME COM TELHA METÁLICA - PALCO PRINCIPAL

Local: Área externa



Imagem 238

TAPUME COM TELHA METÁLICA - PALCO PRINCIPAL

Local: Área externa



Imagem 239

TAPUME COM TELHA METÁLICA - PALCO PRINCIPAL

Local: Área externa



Imagem 240

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEJUSP



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 241

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEJUSP

Local: Área externa



Imagem 242

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEJUSP

Local: Área externa



Imagem 243

FORRO EM DRYWALL E ELÉTRICA- SEJUSP

Local: Área externa



Imagem 244

FORRO EM DRYWALL E ELÉTRICA- SEJUSP

Local: Área externa



Imagem 245

ESTRUTURA METÁLICA DOS RESTAURANTES

Local: Área externa



Imagem 246

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTITUCIONAL



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 247

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 248

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 249

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTITUCIONAL

Local: Área externa



Imagem 250

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TEDAS 10M X 10M

Local: Área externa



Imagem 251

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TEDAS 10M X 10M

Local: Área externa



Imagem 252

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SECOM



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 253

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SECOM

Local: Área externa



Imagem 254

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 255

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SEFAZ

Local: Área externa



Imagem 256

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESTAURANTE 21 UND

Local: Área externa



Imagem 257

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESTAURANTE 21 UND

Local: Área externa



Imagem 258

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESTAURANTE 21 UND



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 259

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RESTAURANTE 21 UND

Local: Área externa



Imagem 260

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 261

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 262

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 263

FORRO EM DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 264

FORRO EM DRYWALL - SEMA E IMAC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Local: Área externa



Imagem 265

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 266

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 267

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 268

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 269

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC

Local: Área externa



Imagem 270

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - SEMA E IMAC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. LOTE I.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Local: Área externa



Imagem 271

PAISAGISMO

Local: Área externa



Imagem 272

PAISAGISMO

Local: Área externa



Imagem 273

PAISAGISMO

Local: Área externa



Imagem 274

PAISAGISMO

Local: Área externa



Imagem 275

PAISAGISMO

Local: Área externa



Imagem 276

PAISAGISMO

Isabelle Lima
Engenheira Civil
CREA/AC 2 809D AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 6 - JUSTIFICATIVA DE ATRASO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cr**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Fonte de Recurso: **15000100**
Nº CT Construtora: **022/2026**
Fiscal da obra: **Eng. Civil Isabelle Lima e Silva**
Respons. Técnico: **Eng. Civil Weysser Coelho da Silva**

2 - Justificativa para atraso de obra

Obra segue de acordo com o croonograma.

3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026


ENGº CIVIL ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 8 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato:

Órgão Contratante:

Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Segurança	Admin. Obra	Nota
1ª Medição	2,00	2,00	1,50	1,00	0,50	1,00	1,00	9,00

Média Final: 9,00
Conceito: Muito boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	2	1	0
2.0 Atendimento a fiscalização	2	1	0
3.0 Qualidade dos serviços	2	1	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	2	1	0
5.0 Equipe técnica	2	1	0
6.0 Segurança do trabalho	2	1	0
7.0 Administração e instalação da obra	2	1	0

Conceito

Ruim - 0,00 a 4,99 Boa - 7,00 a 8,99
Razoável - 5,00 a 6,99 Muito Boa - 9,00 a 10,00


ENGº CIVIL ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026




ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha or**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **FIDELIS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado

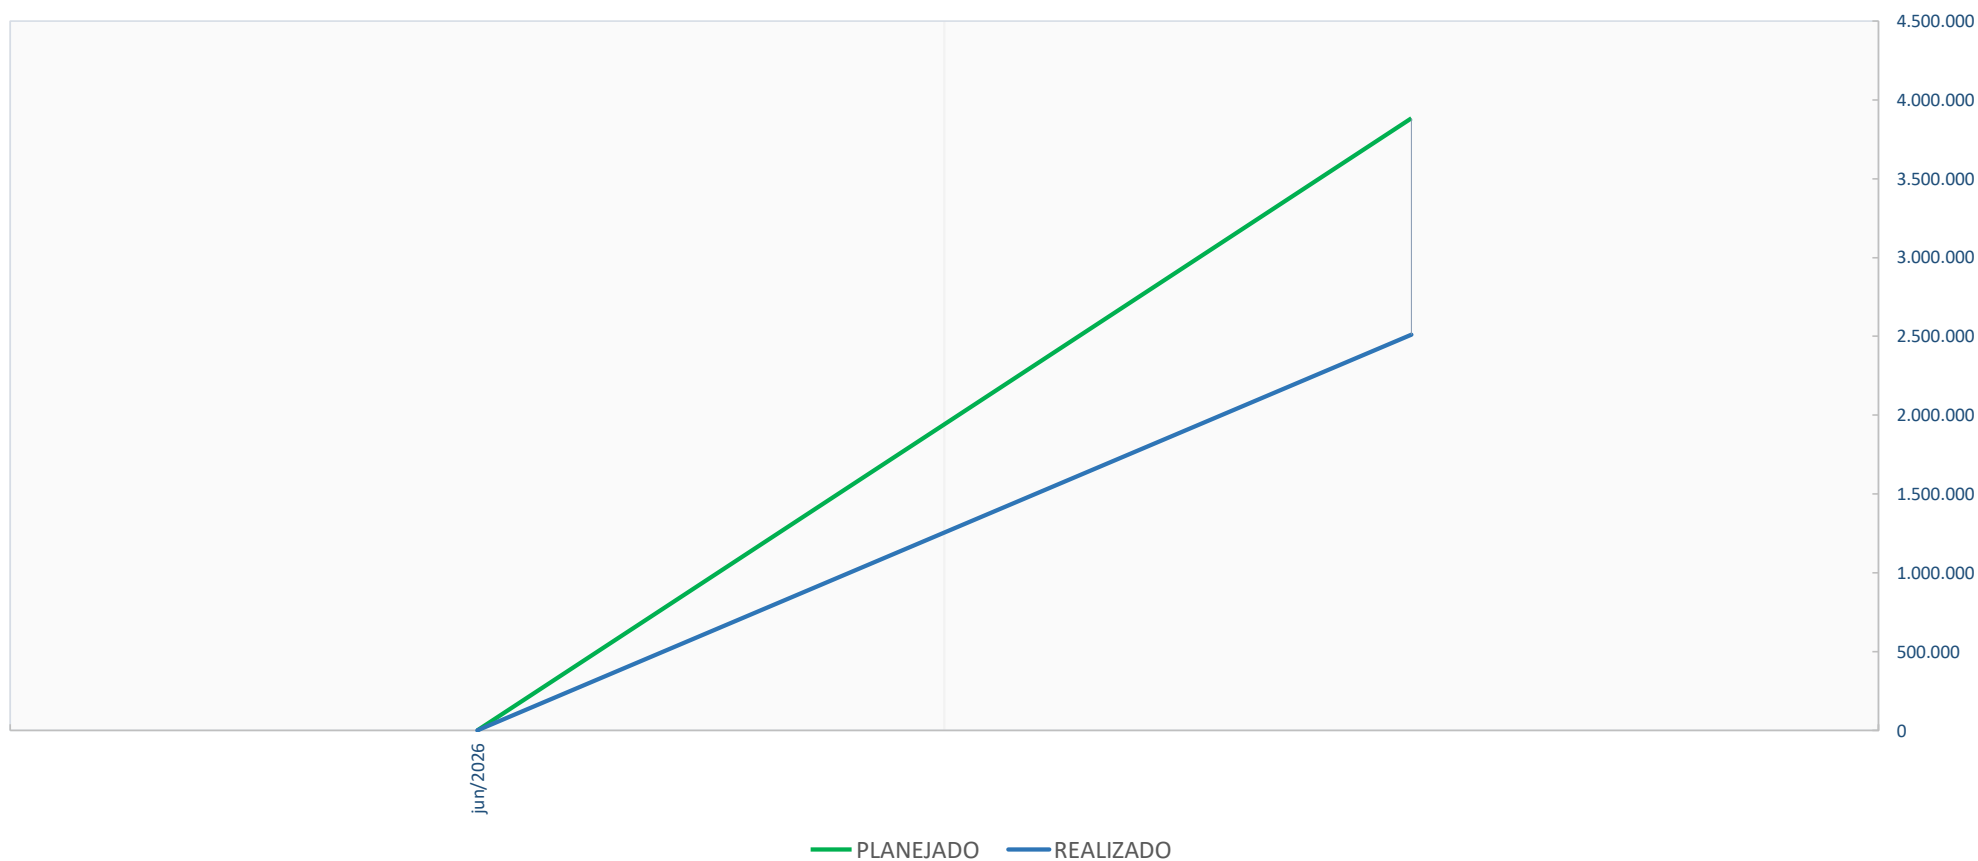

Rio Branco - Acre, 22 de junho de 2026

ENGº CIVIL  ISABELLE LIMA
CREA 21809 D/AC
