



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

CAPA

SEOP

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

Nº CT Construtora: 088/2025

Construtora: RAFAEL WICIUK LTDA

Número da medição: 1


Data da medição: 06/05/2026

Valor no período: R\$ 747.118,14

Período da medição: 16/01/2026 a 15/04/2026

PARECER:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.


ENGº CIVIL - OGINEY RIPARDO DA ROCHA
CREA - 20.449 D/AC

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

62,36% executado.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO



1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**
Fonte de Recurso: **1.500.0100 E 11.754.0500**
Nº CT Construtora: **088/2025**
Fiscal da obra: **ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20.449 D/AC, ENG.º DE SEGURANÇA NO TRABALHO THALIA PINTO DE NEGREIROS - CREA 21879 D/AC**
Respons. Técnico: **ENG.º CIVIL RAFAEL WICIUK - CREA 8512 AC**
Có - Respons. Téc.: **ENG.º CIVIL NALBERT ALBUQUERQUE VIANA - CREA 21863 D/AC**

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: **1ª**
Data da medição: **06/05/26**
Período da medição: **16/01/26 A 15/04/26**
Início da obra: **16/01/26**
Prazo Inicial da Obra: **4 MESES**
Prazo Reprogramado: **0 MESES**
Prazo Decorrido: **4 MESES**
Término da Obra: **16/05/2026**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	FONTE 100	1.071.215,02	745.697,82	745.697,82	69,6%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.194,00	39.407,77	39.407,77	62,4%
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.837,01	5.731,34	5.731,34	98,2%
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.315,84	8.756,80	8.756,80	84,9%
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	27.705,88	27.705,88	27.705,88	100,0%
1.5	REPAROS DE DRENAGEM URBANA SUPERFICIAL	11.482,14	-	-	0,0%
1.6	RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	773.194,68	621.198,07	621.198,07	80,3%
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	31.773,19	-	-	0,0%
1.8	OBRAS COMPLEMENTARES	147.712,28	42.897,96	42.897,96	29,0%
2	FONTE 200	126.784,80	1.420,32	1.420,32	1,1%
2.1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO T	2.663,10	1.420,32	1.420,32	53,3%
2.2	DRENAGEM PLUVIAL URBANA	23.069,18	-	-	0,0%
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.520,95	-	-	0,0%
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES	86.531,57	-	-	0,0%
TOTAL		1.197.999,82	747.118,14	747.118,14	62,36%

O valor da presente medição é:

(SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4 - Situação da obra

Execução física: 62,36%	Valor contrato inicial: 1.197.999,82
Situação do Cronograma Inicial: OBRA VIGENTE	Valor adequado: -
Nível Técnico da Empresa	Conceito da Empresa
☐ 0,00 a 4,99 ☐ 5,00 a 6,99 ☒ 7,00 a 8,99 ☐ 9,00 a 10,00	☐ Ruim ☐ Razoável ☒ Boa ☐ Muito boa

5 - Documentos anexos:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Boletim de Medição; | 5 - Relatório Fotográfico; |
| 2 - Memória de Cálculo; | 6 - Avaliação |
| 3 - Planta iluminada; | 7 - Gráfico - Previsto x Realizado; |
| 4 - Resumo do Cronograma; | 8 - Justificativa de atraso; |

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026


ENGº CIVIL - OGINEY RIPARDO DA ROCHA
CREA - 20.449 D/AC



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Fonte: **1.500.0100 E 11.754.0500**

Nº Contrato: **088/2025**

Fiscal: **ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20.449 D/AC, ENG.º DE SEGURANÇA NO TRABALHO THALIA PINTO DE NEGREIROS - CREA 21879 D/AC**

R.Técnico: **ENG.º CIVIL RAFAEL WICIUK - CREA 8512 AC**

Có-Res.Téc.: **ENG.º CIVIL NALBERT ALBUQUERQUE VIANA - CREA 21863 D/AC**

Nº. Medição: **1**

Data-base Orçamento: **SINAPI - 08/2024 / SICRO 3 - 07/2024 / DESONERADO**

Data da Medição: **06/05/2026**

Período da Medição: **16/01/2026 A 15/04/2026**

Prazo Inicial Obra: **4 MESES**

Início da Obra: **16/01/2026**

Término da Obra: **16/05/2026**

Situação da Obra: **EXECUÇÃO VIGENTE**

BDI: **28,14%** DESCONTO: **3,66%**

BDI DIFERENCIADO: **19,07%**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	FONTE 100												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	631,94	63.194,00	62,36	39.407,77	62,36	39.407,77	62,36%	37,64	23.786,23	37,64%
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS												
1.2.1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) Nº: PL-0615/2024	UN	1,00	323,23	323,23	1,00	323,23	1,00	323,23	100,00%	-	-	
1.2.2	EMIÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DEMOLIÇÃO	UN	1,00	105,67	105,67			-	-		1,00	105,67	100,00%
1.2.3	LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) PARA ATÉ 10 TRABALHADORES	UN	1,00	1.488,38	1.488,38	1,00	1.488,38	1,00	1.488,38	100,00%	-	-	
1.2.4	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO - PARA ATÉ 10 TRABALHADORES	UN	1,00	1.488,38	1.488,38	1,00	1.488,38	1,00	1.488,38	100,00%	-	-	
1.2.5	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)	UN	1,00	2.431,35	2.431,35	1,00	2.431,35	1,00	2.431,35	100,00%	-	-	
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	60,00	97,44	5.846,40	44,00	4.287,36	44,00	4.287,36	73,33%	16,00	1.559,04	26,67%
1.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	8,00	558,68	4.469,44	8,00	4.469,44	8,00	4.469,44	100,00%	-	-	
1.4	CANTEIRO DE OBRAS												
1.4.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016_REF SINAPI (93584)	M²	12,00	873,90	10.486,80	12,00	10.486,80	12,00	10.486,80	100,00%	-	-	
1.4.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016_REF SINAPI (93212)	M²	8,00	1.208,01	9.664,08	8,00	9.664,08	8,00	9.664,08	100,00%	-	-	
1.4.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016_REF SINAPI (93210)	M²	10,00	755,50	7.555,00	10,00	7.555,00	10,00	7.555,00	100,00%	-	-	
1.5	REPAROS DE DRENAGEM URBANA SUPERFICIAL												
1.5.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.511,27	10.045,08			-	-		4,00	10.045,08	100,00%
1.5.2	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESURA 7CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA_REF SINAPI (72183)	M²	2,31	159,71	368,93			-	-		2,31	368,93	100,00%
1.5.3	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M³	5,88	66,75	392,49			-	-		5,88	392,49	100,00%
1.5.4	MEIO FIO TIPO CHAPÉU, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024_REF SINAPI (94273)	UN	7,00	96,52	675,64			-	-		7,00	675,64	100,00%
1.6	RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS												
1.6.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3_REF SINAPI (83338)	M³	148,11	4,68	693,15	33,42	156,40	33,42	156,40	22,56%	114,69	536,75	77,44%
1.6.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)_REF SINAPI (72888)	M³	185,14	1,95	361,01	41,77	81,45	41,77	81,45	22,56%	143,37	279,56	77,44%
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ x KM	2.029,10	2,95	5.985,84	935,53	2.759,81	935,53	2.759,81	46,11%	1.093,57	3.226,03	53,89%
1.6.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C_REF SINAPI (72943)	M²	3.554,61	4,92	17.488,68	3.108,99	15.296,23	3.108,99	15.296,23	87,46%	445,62	2.192,45	12,54%
1.6.5	APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019_REF SINAPI (95995)	M³	148,11	158,48	23.472,47			-	-		148,11	23.472,47	100,00%
1.6.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	346,58	2.051,30	710.939,55	293,17	601.379,62	293,17	601.379,62	84,59%	53,41	109.559,93	15,41%
1.6.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	3.554,61	4,01	14.253,98	380,19	1.524,56	380,19	1.524,56	10,70%	3.174,42	12.729,42	89,30%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
1.7.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.185,49	8,19	17.899,16			-	-		2.185,49	17.899,16	100,00%
1.7.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO_REF SICRO (5213464)	UN	15,00	226,64	3.399,60			-	-		15,00	3.399,60	100,00%
1.7.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO_REF SICRO (5213440)	UN	1,00	175,23	175,23			-	-		1,00	175,23	100,00%
1.7.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	560,29	8.964,64			-	-		16,00	8.964,64	100,00%
1.7.5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,6MM	M²	31,55	42,30	1.334,56			-	-		31,55	1.334,56	100,00%
1.8	OBRAS COMPLEMENTARES												
1.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022_REF SINAPI (94990)	M³	54,78	1.749,98	95.863,90	16,12	28.209,67	16,12	28.209,67	29,43%	38,66	67.654,23	70,57%
1.8.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²	187,05	277,19	51.848,38	52,99	14.688,29	52,99	14.688,29	28,33%	134,06	37.160,09	71,67%
2	FONTE 200												
2.1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO												
2.1.1	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018_REF SINAPI (99060)	UN	15,00	177,54	2.663,10	8,00	1.420,32	8,00	1.420,32	53,33%	7,00	1.242,78	46,67%
2.2	DRENAGEM PLUVIAL URBANA												
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	3,00	31,79	95,37			-	-		3,00	95,37	100,00%
2.2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP_REF SINAPI (74151/001)	M³	3,75	5,84	21,90			-	-		3,75	21,90	100,00%
2.2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA_REF SINAPI (72887)	M³ x KM	45,00	1,86	83,70			-	-		45,00	83,70	100,00%
2.2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)_REF SINAPI (72881)	M³ x KM	14,55	2,47	35,93			-	-		14,55	35,93	100,00%
2.2.5	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 120CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO_REF SINAPI (73963/007)	UN	1,00	3.219,25	3.219,25			-	-		1,00	3.219,25	100,00%
2.2.6	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	816,39	2.449,17			-	-		3,00	2.449,17	100,00%
2.2.7	GUÍA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUÍA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024_INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M_REF SINAPI (94267) E (74237/001)	M	106,90	158,39	16.931,89			-	-		106,90	16.931,89	100,00%
2.2.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	106,90	2,17	231,97			-	-		106,90	231,97	100,00%
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
2.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO_REF SICRO (5213440)	UN	4,00	175,23	700,92			-	-		4,00	700,92	100,00%
2.3.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	560,29	2.241,16			-	-		4,00	2.241,16	100,00%
2.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,00	226,65	1.813,20			-	-		8,00	1.813,20	100,00%
2.3.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,00	505,01	4.040,08			-	-		8,00	4.040,08	100,00%
2.3.5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	76,80	42,30	3.248,64			-	-		76,80	3.248,64	100,00%
2.3.6	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	43,07	57,51	2.476,95			-	-		43,07	2.476,95	100,00%
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES												
2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022_REF SINAPI (94990)	M³	4,24	1.749,98	7.419,91			-	-		4,24	7.419,91	100,00%
2.4.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²	16,80	277,19	4.656,79			-	-		16,80	4.656,79	100,00%
2.4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	46,00	1.154,03	53.085,38			-	-		46,00	53.085,38	100,00%
2.4.4	RAMPA E CALÇADA DE ACESSO AOS LOTES_REF SINAPI (105004)	M²	93,07	183,45	17.073,69			-	-		93,07	17.073,69	100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
2.4.5	POSTE DE FERRO GALVANIZADO ø 3" COM PLANTA METYÁLICA (CAPA GALVANIZADA) PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (REF.: SINAPI_73916/002_01/2016)	UN	5,00	513,60	2.568,00			-	-		5,00	2.568,00	100,00%
2.4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (REF.: SINAPI_73916/002_01/2016)	UN	10,00	172,78	1.727,80			-	-		10,00	1.727,80	100,00%
TOTAL SIMPLES					1.197.999,82		62,36%	747.118,14	747.118,14 62,36%		450.881,68 37,64%		
TOTAL ACUMULADO							62,36%	747.118,14					
SALDO							37,64%	450.881,68					

O Valor da presente medição é:
(SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026


ENGº CIVIL - OGINEY RIPARDO DA ROCHA
CREA - 20.449 D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

Nº CT Construtora: 088/2025

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Fiscal da obra: ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20.449 D/AC, ENG.ª DE SEGURANÇA NO TRABALHO THALIA PINTO DE NEGREIROS - CREA 21879 D/AC

Construtora: RAFAEL WICIUK LTDA

Respons. Técnico: ENG.º CIVIL RAFAEL WICIUK - CREA 8512 AC
Có-Resp. Técnico: ENG.º CIVIL NALBERT ALBUQUERQUE VIANA - CREA 21863 D/AC

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00						62,36		ADMINISTRAÇÃO	62,36	62,36
	INFORMAÇÕES DO CONTRATO A PARTIR DA 2ª ADEQUAÇÃO (A) - TOTAL DO CONTRATO = R\$ 1.197.999,82 (B) - TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO = R\$ 63.194,00 (C) - TOTAL DO CONTRATO A SER CONSIDERADO PARA MEDIR ADMINISTRAÇÃO = 1.197.999,82 - 63.194,00 = R\$ 1.134.805,82 (D) - EVOLUÇÃO DO PERÍODO DA 1ª MEDIÇÃO = R\$ 707.710,37		1,00	707.710,37	1.134.805,82	100,00			62,36		CONFORME PROPORCIONALIDADE DA EVOLUÇÃO DA OBRA NA 1ª MEDIÇÃO ((707.710,37 + 1.134.805,82) x 100 = 62,3640060288024)		
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS												
1.2.1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA - ANEXO DA DECISÃO PLENÁRIA (PL) Nº: PL-0615/2024	UN	1,00						1,00		ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	1,00
1.2.2	EMIÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU DEMOLIÇÃO	UN	1,00						1,00		LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO	1,00	1,00
1.2.3	LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) PARA ATÉ 10 TRABALHADORES	UN	1,00						1,00		LTCAT	1,00	1,00
1.2.4	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO - PARA ATÉ 10 TRABALHADORES	UN	1,00						1,00		PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL	1,00	1,00
1.2.5	PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)	UN	1,00						1,00		PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	1,00	1,00
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M²	1,00						44,00		TAPUME	44,00	44,00
1.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	1,00			22,00		2,00	44,00		TAPUME DO CANTEIRO		
			1,00						8,00		PLACA DE OBRA	8,00	8,00
			1,00			3,00		2,00	6,00		PLACA PADRÃO GOVERNO / SEOP ESTADUAL		
			1,00			3,60		1,80	6,48		PLACA PADRÃO GOVERNO FEDERAL / CONVENIO		
									12,48		TOTAL		
									8,00		SALDO DO ITEM 1.3.2 E QUANTITATIVO MEDIDO		
									4,48		ADITAR		
1.4	CANTEIRO DE OBRAS												

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1.4.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016_REF SINAPI (93584)	M²	1,00						12,00		DEPÓSITO	12,00	12,00
			1,00	12,00					12,00		CONFORME CROQUIS PROJETADO		
1.4.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016_REF SINAPI (93212)	M²	1,00						8,00			8,00	8,00
			1,00	8,00					8,00		CONFORME CROQUIS PROJETADO		
1.4.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016_REF SINAPI (93210)	M²	1,00						10,00			10,00	10,00
			1,00	10,00					10,00		CONFORME CROQUIS PROJETADO		
1.5	REPAROS DE DRENAGEM URBANA SUPERFICIAL												
1.5.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN											
1.5.2	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA_REF SINAPI (72183)	M²											
1.5.3	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M³											
1.5.4	MEIO FIO TIPO CHAPÉU, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024_REF SINAPI (94273)	UN											
1.6	RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS												
1.6.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3_REF SINAPI (83338)	M³	1,00						33,42		ESCAVAÇÃO MECÂNICA	33,42	33,42
	PROFUNDIDADE MÉDIA		-			-	-	-	-		RUA GIRASSOL		
			1,00			4,00	2,20	0,02	0,17		TB 01		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			26,00	2,00	0,15	0,00		TB 02		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			7,80	6,00	0,09	0,00		TB 03		
			-			-	-	-	-		TB 04		
			-			-	-	-	-		TB 05		
			-			-	-	-	-		TB 06		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			3,30	2,00	0,05	0,00		RUA AZALÉIA		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			2,00	2,00	0,05	0,00		TB 01		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			3,80	2,00	0,08	0,00		TB 02		
			-			-	-	-	-		TB 03		
			-			-	-	-	-		TB 04		
			-			-	-	-	-		TB 05		
			-			-	-	-	-		TB 06		
			-			-	-	-	-		TB 07		
			-			-	-	-	-		TB 08		
			-			-	-	-	-		TB 09		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			-	-	-	-		RUA PRIMAVERA		
			-			-	-	-	-		TB 01		
			1,00			6,20	2,40	0,15	0,00		TB 02		
			-			-	-	-	-		TB 03		
			1,00			2,00	1,20	0,03	0,07		RUA DOS CRAVOS		
			1,00			1,20	1,10	0,03	0,03		TB 01		
			1,00			1,00	0,80	0,03	0,02		TB 02		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			15,90	1,90	0,20	0,00		TB 03		
			-			-	-	-	-		TB 04		
			1,00			14,00	1,60	0,03	0,67		TB 05		
			1,00			2,60	1,80	0,03	0,14		TB 06		
			1,00			6,60	2,10	0,03	0,41		TB 07		
			1,00			5,50	1,50	0,03	0,24		TB 08		
			-			-	-	-	-		TB 09		
			-			-	-	-	-		TB 10		
			-			-	-	-	-		RUA AÇUCENAS		
			-			-	-	-	-		TB 01		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			17,00	2,39	0,18	0,00		RUA DAS TULIPAS		
			1,00			4,00	4,00	0,04	0,64		TB 01		
			-			-	-	-	-		TB 02		
			-			-	-	-	-		TB 03		
											TB 04		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			3,00	2,30	0,18	0,00		RUA DAS CAMÉLIAS		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			2,00	2,00	0,18	0,00		TB 01		
			1,00			8,00	1,60	0,04	0,51		TB 02		
			1,00			5,20	2,20	0,04	0,45		TB 03		
			1,00			4,40	0,90	0,04	0,15		TB 04		
											TB 05		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			9,00	2,20	0,18	0,00		RUA DAS ORQUÍDEAS		
			1,00			3,00	2,20	0,03	0,19		TB 01		
			-			-	-	-	-		TB 02		
			-			-	-	-	-		TB 03		
			-			-	-	-	-		TB 04		
			-			-	-	-	-		TB 05		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			2,60	1,80	0,15	0,00		TB 06		
			-			-	-	-	-		TB 07		
			-			-	-	-	-		TB 08		
			-			-	-	-	-		TB 09		
			-			-	-	-	-		RUA MARGARIDA		
			-			-	-	-	-		TB 01		
			-			-	-	-	-		TB 02		
			-			-	-	-	-		TB 03		
			1,00			12,00	0,80	0,025	0,24		TB 04		
			1,00			7,50	2,50	0,025	0,46		TB 05		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			4,40	1,50	0,18	0,00		RUA DAS ADÁLIAS		
			1,00			6,30	1,20	0,025	0,18		TB 01		
			-			-	-	-	-		TB 02		
											TB 03		
			-			-	-	-	-		RUA DAS MARGARIDAS		
			-			-	-	-	-		TB 01		
			-			-	-	-	-		TB 02		
			-			-	-	-	-		TB 03		
			1,00			2,00	1,70	0,03	0,10		RUA DAS VIOLETAS		
			1,00			7,30	1,40	0,03	0,30		TB 01		
			1,00			6,20	1,40	0,03	0,26		TB 02		
			1,00			31,70	2,10	0,03	1,99		TB 03		
			1,00			6,50	2,19	0,04	0,56		TB 04		
			1,00			2,00	1,09	0,04	0,08		TB 05		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		0,00			20,00	1,09	0,13	0,00		TB 06		
											TB 07		
	((11,2+6,5)*5,7)/2 = 50,45		1,00	50,45				0,04	2,02		RUA IBISCOS		
			1,00			5,80	2,10	0,03	0,36		TB 01		
			1,00			5,20	2,20	0,03	0,34		TB 02		
			1,00			8,50	2,50	0,03	0,63		TB 03		
			1,00			10,70	1,90	0,03	0,60		TB 04		
			1,00			23,20	2,19	0,03	1,52		TB 05		
			1,00			7,50	1,40	0,03	0,31		TB 06		
			-			-	-	-	-		TB 07		
											TB 08		
			1,00			5,40	1,50	0,05	0,40		RUA HORTÊNCIAS		
			1,00			4,30	1,70	0,05	0,36		TB 01		
											TB 02		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1.6.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)_REF SINAPI (72888)	M³	1,00			2,20	1,20	0,04	0,10		TB 03		
			-			-	-	-	-		TB 04		
			1,00			6,40	2,77	0,04	0,70		TB 05		
			1,00			9,30	0,60	0,04	0,22		TB 06		
			1,00			21,50	2,20	0,13	5,91		TB 07		
			1,00			5,40	2,20	0,04	0,47		TB 08		
			1,00			1,30	1,60	0,04	0,08		TB 09		
			1,00			4,40	1,80	0,04	0,31		TB 10		
			1,00			4,70	2,70	0,04	0,50		TB 11		
			1,00			4,30	3,30	0,04	0,56		TB 12		
			1,00			6,30	1,76	0,04	0,44		TB 13		
			1,00			2,30	2,10	0,04	0,19		TB 14		
			1,00			22,30	1,50	0,04	1,33		TB 15		
			1,00			11,10	1,50	0,04	0,66		TB 16		
			-			-	-	-	-		TB 17		
			-			-	-	-	-		TB 18		
			-			-	-	-	-		TB 19		
			1,00			13,50	2,20	0,04	1,18		TB 20		
			1,00			3,00	1,70	0,04	0,20		TB 21		
											RUA DAS ROSAS		
			1,00			6,50	2,80	0,04	0,72		TB 01		
			-			-	-	-	-		TB 02		
			1,00			12,40	1,80	0,04	0,89		TB 03		
			BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)			7,50	2,10	0,04	0,00		TB 04		
			BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)			3,10	6,00	0,06	0,00		TB 05		
			1,00			5,00	1,80	0,04	0,36		TB 06		
			1,00			5,70	1,90	0,04	0,43		TB 07		
			BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)			17,80	1,80	0,05	1,60		TB 08		
			-			-	-	-	-		TB 09		
			1,00			1,70	1,50	0,04	0,10		TB 10		
			-			-	-	-	-		TB 11		
			-			-	-	-	-		TB 12		
			1,00			4,80	2,60	0,03	0,37		TB 13		
			-			-	-	-	-		TB 14		
			1,00			0,80	0,80	0,04	0,02		TB 15		
			1,00			2,50	1,70	0,04	0,17		TB 16		
			1,00			1,60	1,30	0,04	0,08		TB 17		
			-			-	-	-	-		TB 18		
			1,00			1,00	0,90	0,04	0,03		TB 19		
			1,00			1,20	1,00	0,04	0,04		TB 20		
			1,00			1,30	0,90	0,04	0,04		TB 21		
			1,00			3,90	1,60	0,04	0,24		TB 22		
			1,00			22,60	1,60	0,03	1,08		TB 23		
			-			-	-	-	-		TB 24		
			-			-	-	-	-		TB 25		
			-			-	-	-	-		TB 26		
			-			-	-	-	-		TB 27		
			-			-	-	-	-		TB 28		
			-			-	-	-	-		TB 29		
			-			-	-	-	-		TB 30		
			-			-	-	-	-		TB 31		
			-			-	-	-	-		TB 32		
			1,00						41,77		CARGA, MANOBRAS E DESCARGA	41,77	41,77
			1,00	33,42	1,25				41,77		ITEM 1.6.1 X TAXA DE EXPANSÃO		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ x KM	1,00						935,53		TRANSPORTE	935,53	935,53
			1,00	41,77	6,80				284,03		BOTA FORA		
			1,00	125,29	5,20				651,50		ITEM 1.6.2 X DMT		
			1,00								CBUQ		
1.6.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C_REF SINAPI (72943)	M²	1,00						3.108,99		ITEM 1.6.5 X DMT		
			1,00								APLICAÇÃO DE CONCRETO	3.108,99	3.108,99
			1,00								ASFÁLTICO		
			1,00								RUA GIRASSOL		
			1,00			6,50	3,70		24,05		TB 01		
			1,00			4,00	2,20		8,80		TB 02		
			2,00			4,00	0,10		0,80		TB 02 - BORDA		
			2,00			2,40	0,10		0,48		TB 02 - BORDA		
			1,00			31,10	3,40		105,74		TB 03		
			1,00			32,40	0,10		3,24		TB 03 - BORDA		
			2,00			3,40	0,10		0,68		TB 03 - BORDA		
			1,00			7,80	6,00		46,80		TB 04		
			1,00			9,00	2,10		18,90		TB 05		
			1,00			4,60	3,00		13,80		TB 06		
			1,00			11,20	3,60		40,32		TB 07		
			1,00								RUA AZALÉIA		
			1,00			3,30	2,00		6,60		TB 01		
			2,00			2,00	0,60		2,40		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,00	2,00		4,00		TB 02		
			1,00			3,70	0,20		0,74		TB 02 - BORDA		
			2,00			2,00	0,85		3,40		TB 02 - BORDA		
			1,00			3,80	2,00		7,60		TB 03		
			2,00			2,00	0,40		1,60		TB 03 - BORDA		
			1,00			5,10	0,40		2,04		TB 03 - BORDA		
			1,00			7,80	2,60		20,28		TB 04		
			1,00			4,20	2,80		11,76		TB 05		
			1,00			14,90	3,00		44,70		TB 06		
			1,00			13,70	4,00		54,80		TB 07		
			1,00			12,50	2,50		31,25		TB 08		
			1,00			19,20	2,60		49,92		TB 09		
			1,00								RUA PRIMAVERA		
			1,00			7,00	2,50		17,50		TB 01		
			1,00			6,20	2,40		14,88		TB 02		
			1,00			6,20	0,40		2,48		TB 02 - BORDA		
			2,00			2,80	0,55		3,08		TB 02 - BORDA		
			1,00			7,60	2,10		15,96		TB 03		
			1,00								RUA DOS CRAVOS		
			1,00			2,00	1,20		2,40		TB 01		
			2,00			2,20	0,95		4,18		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,00	1,00		2,00		TB 01 - BORDA		
			1,00			1,20	1,10		1,32		TB 02		
			2,00			1,20	0,40		0,96		TB 02 - BORDA		
			2,00			1,90	0,45		1,71		TB 02 - BORDA		
			1,00			1,90	0,80		1,52		TB 03		
			1,00			2,20	0,40		0,88		TB 03 - BORDA		
			2,00			0,80	0,20		0,32		TB 03 - BORDA		
			1,00			15,90	1,90		30,21		TB 04		
			2,00			0,55	2,20		2,42		TB 04 - BORDA		
			1,00			15,90	0,30		4,77		TB 04 - BORDA		
			1,00			6,40	3,10		19,84		TB 05		
			1,00			14,00	1,60		22,40		TB 06		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			14,00	0,90		12,60		TB 06 - BORDA		
			2,00			0,20	2,50		1,00		TB 06 - BORDA		
			1,00			2,60	1,80		4,68		TB 07		
			1,00			4,90	0,60		2,94		TB 07 - BORDA		
			2,00			1,80	1,15		4,14		TB 07 - BORDA		
			1,00			6,60	2,10		13,86		TB 08		
			1,00			6,60	0,60		3,96		TB 08 - BORDA		
			1,00			5,50	1,50		8,25		TB 09		
			1,00			5,50	1,20		6,60		TB 09 - BORDA		
			1,00			5,10	2,70		13,77		ENTRE TB 08 E TB 09		
			1,00			4,80	4,50		21,60		TB 10		
											RUA AÇUCENAS		
			1,00			4,70	2,10		9,87		TB 01		
											RUA DAS TULIPAS		
			1,00			17,00	2,39		40,63		TB 01		
			1,00			4,00	4,00		16,00		TB 02		
			1,00			7,90	4,00		31,60		TB 02 - BORDA		
			1,00			10,10	4,00		40,40		TB 03		
			1,00			18,70	2,90		54,23		TB 03		
											RUA DAS CAMÉLIAS		
			1,00			3,00	2,30		6,90		TB 01		
			1,00			2,30	0,60		1,38		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,00	2,00		4,00		TB 02		
			1,00			2,00	0,60		1,20		TB 02 - BORDA		
			1,00			8,00	1,60		12,80		TB 03		
			1,00			1,90	0,90		1,71		TB 03 - BORDA		
			1,00			8,00	0,30		2,40		TB 03 - BORDA		
			1,00			1,90	0,10		0,19		TB 03 - BORDA		
			1,00			6,20	1,00		6,20		ENTRE TB 01 E TB 02		
			1,00			5,20	2,20		11,44		TB 04		
			2,00			6,00	0,25		3,00		TB 04 - BORDA		
			1,00			0,60	0,40		0,24		TB 04 - BORDA		
			2,00			2,20	0,40		1,76		TB 04 - BORDA		
			1,00			4,40	0,90		3,96		TB 05		
			1,00			4,40	0,25		1,10		TB 05 - BORDA		
			1,00			4,40	0,45		1,98		TB 05 - BORDA		
			1,00			0,90	0,40		0,36		TB 05 - BORDA		
											RUA DAS ORQUÍDEAS		
			1,00			9,00	2,20		19,80		TB 01		
			2,00			2,20	0,55		2,42		TB 01 - BORDA		
			1,00			10,10	0,40		4,04		TB 01 - BORDA		
			1,00			3,00	2,20		6,60		TB 02		
			2,00			2,20	0,60		2,64		TB 02 - BORDA		
			2,00			4,20	0,50		4,20		TB 02 - BORDA		
			1,00			5,20	1,20		6,24		TB 03		
			1,00			2,80	2,80		7,84		TB 04		
			2,00			3,50	1,60		11,20		TB 05		
			1,00			2,60	1,80		4,68		TB 06		
			2,00			3,50	0,30		2,10		TB 06 - BORDA		
			2,00			1,80	0,45		1,62		TB 06 - BORDA		
			1,00			3,90	1,90		7,41		TB 07		
			1,00			10,80	1,40		15,12		TB 08		
			1,00			5,10	2,00		10,20		TB 09		
											RUA MARGARIDA		
			1,00			10,90	2,70		29,43		TB 01		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			5,20	2,90		15,08		TB 02		
			1,00			7,60	2,60		19,76		TB 03		
			1,00			25,30	3,30		83,49		TB 04		
			1,00			49,40	5,30		261,82		TB 05		
											RUA DAS ADÁLIAS		
			1,00			4,40	1,70		7,48		TB 01		
			2,00			5,40	0,20		2,16		TB 01 - BORDA		
			2,00			1,70	0,50		1,70		TB 01 - BORDA		
			1,00			1,00	0,90		0,90		TB 02		
			1,00			7,50	1,80		13,50		TB 03		
											RUA DAS MARGARIDAS		
			1,00			12,90	5,00		64,50		TB 01		
			1,00			16,40	2,70		44,28		TB 02		
			1,00			16,90	2,30		38,87		TB 03		
											RUA DAS VIOLETAS		
			1,00			2,00	1,70		3,40		TB 01		
			1,00			2,90	0,20		0,58		TB 01 - BORDA		
			2,00			1,80	0,45		1,62		TB 01 - BORDA		
			1,00			7,30	1,40		10,22		TB 02		
			1,00			8,20	0,30		2,46		TB 02 - BORDA		
			2,00			1,40	0,45		1,26		TB 02 - BORDA		
			1,00			6,20	1,40		8,68		TB 03		
			1,00			6,80	0,50		3,40		TB 03 - BORDA		
			2,00			1,40	0,30		0,84		TB 03 - BORDA		
			1,00			31,70	2,10		66,57		TB 04		
			1,00			35,80	0,80		28,64		TB 04 - BORDA		
			2,00			2,10	2,05		8,61		TB 04 - BORDA		
			1,00			6,50	2,19		14,24		TB 05		
			1,00			2,19	0,25		0,55		TB 05 - BORDA		
			1,00			9,00	0,21		1,89		BORDA TB 05 / TB 06		
			1,00			2,00	1,09		2,18		TB 06		
			1,00			1,09	0,25		0,27		TB 06 - BORDA		
			1,00			20,00	1,09		21,80		TB 07		
			1,00			21,10	0,70		14,77		TB 07 - BORDA		
			2,00			2,00	0,55		2,20		TB 07 - BORDA		
											RUA IBISCOS		
			1,00	50,45					50,45		TB 01		
			1,00			5,80	2,40		13,92		TB 02		
			1,00			6,50	0,10		0,65		TB 02 - BORDA		
			1,00			2,40	0,70		1,68		TB 02 - BORDA		
			1,00			5,20	2,20		11,44		TB 03		
			1,00			5,40	0,10		0,54		TB 03 - BORDA		
			1,00			2,20	0,20		0,44		TB 03 - BORDA		
			1,00			8,50	2,50		21,25		TB 04		
			1,00			8,90	0,10		0,89		TB 04 - BORDA		
			2,00			2,50	0,20		1,00		TB 04 - BORDA		
			1,00			10,70	1,90		20,33		TB 05		
			1,00			10,80	0,10		1,08		TB 05 - BORDA		
			2,00			1,90	0,05		0,19		TB 05 - BORDA		
			1,00			23,20	2,19		50,81		TB 06		
			1,00			23,30	0,10		2,33		TB 06 - BORDA		
			1,00			2,19	0,10		0,22		TB 06 - BORDA		
			1,00			7,00	1,40		9,80		TB 07		
			1,00			7,80	0,10		0,78		TB 07 - BORDA		
			1,00			1,40	0,80		1,12		TB 07 - BORDA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			2,90	1,70		4,93		TB 08		
			1,00			5,40	1,50		8,10		RUA DAS HORTÊNCIAS		
			1,00			1,50	0,20		0,30		TB 01		
			1,00			4,30	1,90		8,17		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,20	1,20		2,64		TB 02		
			2,00			1,20	0,30		0,72		TB 03		
			2,00			2,90	0,15		0,87		TB 03 - BORDA		
			1,00			6,90	2,90		20,01		TB 04		
			1,00			6,40	2,77		17,73		TB 05		
			2,00			2,77	0,50		2,77		TB 05 - BORDA		
			1,00			9,30	0,60		5,58		TB 06		
			1,00			21,50	2,50		53,75		TB 07		
			1,00			23,20	0,30		6,96		TB 07 - BORDA		
			2,00			2,20	0,85		3,74		TB 07 - BORDA		
			1,00			6,00	2,40		14,40		TB 08		
			1,00			1,30	1,60		2,08		TB 09		
			1,00			1,40	0,10		0,14		TB 09 - BORDA		
			2,00			1,60	0,05		0,16		TB 09 - BORDA		
			1,00			4,40	1,80		7,92		TB 10		
			1,00			4,40	0,05		0,22		TB 10 - BORDA		
			1,00			3,05	0,05		0,15		TB 10 - BORDA		
			1,00			4,70	2,70		12,69		TB 11		
			1,00			5,20	0,50		2,60		TB 11 - BORDA		
			1,00			4,30	3,30		14,19		TB 12		
			1,00			4,40	0,05		0,22		TB 12 - BORDA		
			1,00			2,64	0,05		0,13		TB 12 - BORDA		
			1,00			6,30	1,76		11,09		TB 13		
			1,00			6,30	0,05		0,32		TB 13 - BORDA		
			1,00			6,25	0,49		3,06		TB 13 - BORDA		
			1,00			2,30	2,10		4,83		TB 14		
			1,00			3,00	0,60		1,80		TB 14 - BORDA		
			1,00			3,90	0,30		1,17		TB 14 - BORDA		
			1,00			1,81	0,90		1,63		TB 14 - BORDA		
			1,00			2,30	0,90		2,07		TB 14 - BORDA		
			1,00			22,80	2,20		50,16		TB 15		
			2,00			22,80	0,20		9,12		TB 15 - BORDA		
			2,00			1,90	0,20		0,76		TB 15 - BORDA		
			1,00			11,10	1,50		16,65		TB 16		
			1,00			11,10	0,20		2,22		TB 16 - BORDA		
			1,00			1,90	0,20		0,38		TB 16 - BORDA		
			1,00			10,70	0,80		8,56		TB 17		
			1,00			6,00	0,40		2,40		TB 18		
			1,00			2,00	0,90		1,80		TB 19		
			1,00			13,50	2,20		29,70		TB 20		
			1,00			14,40	0,20		2,88		TB 20 - BORDA		
			2,00			2,20	0,25		1,10		TB 20 - BORDA		
			1,00			3,00	1,70		5,10		TB 21		
			1,00			3,50	0,20		0,70		TB 21 - BORDA		
			2,00			1,70	0,25		0,85		TB 21 - BORDA		
			0,00			0,00	0,00		0,00		RUA DAS ROSAS		
			1,00			6,50	2,80		18,20		TB 01		
			1,00			6,50	0,73		4,75		TB 01 - BORDA		
			1,00			26,80	1,50		40,20		TB 33 - FINAL DA RUA/CAMPO DE FUTEBOL (LD)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			20,30	3,60		73,08		TB 02		
			1,00			12,40	1,80		22,32		TB 03		
			1,00			12,60	0,70		8,82		TB 03 - BORDA		
			1,00			1,80	0,20		0,36		TB 03 - BORDA		
			1,00			5,00	2,50		12,50		TB 03 - AFUNDAMENTO		
			1,00			7,50	2,10		15,75		TB 04		
			1,00			7,50	1,20		9,00		TB 04 - BORDA		
			1,00			3,10	6,00		18,60		TB 05		
			1,00			4,10	2,70		11,07		TB 05 - AFUNDAMENTO		
			1,00			5,00	1,80		9,00		TB 06		
			1,00			5,00	0,20		1,00		TB 06 - BORDA		
			1,00			5,70	1,90		10,83		TB 07		
			1,00			5,70	1,00		5,70		TB 07 - BORDA		
			1,00			35,60	2,90		103,24		TB 07 - AFUNDAMENTO		
			1,00			17,80	1,80		32,04		TB 08		
			1,00			17,80	1,10		19,58		TB 08 - BORDA		
			1,00			1,70	1,60		2,72		TB 09		
			2,00			2,80	0,10		0,56		TB 09 - BORDA		
			2,00			1,70	0,60		2,04		TB 09 - BORDA		
			1,00			1,70	1,50		2,55		TB 10		
			1,00			1,70	1,60		2,72		TB 10 - AFUNDAMENTO		
			1,00			6,00	3,10		18,60		TB 10 - AFUNDAMENTO		
			1,00			2,70	1,90		5,13		TB 11		
			1,00			20,60	3,80		78,28		TB 12		
			1,00			4,80	2,60		12,48		TB 13		
			2,00			0,70	2,60		3,64		TB 13 - BORDA		
			1,00			2,00	1,90		3,80		TB 14		
			2,00			2,70	0,50		2,70		TB 14 - BORDA		
			2,00			1,90	0,35		1,33		TB 14 - BORDA		
			1,00			0,80	0,80		0,64		TB 15		
			2,00			1,60	0,35		1,12		TB 15 - BORDA		
			2,00			0,80	0,40		0,64		TB 15 - BORDA		
			1,00			2,50	1,70		4,25		TB 16		
			2,00			3,30	0,40		2,64		TB 16 - BORDA		
			2,00			1,70	0,40		1,36		TB 16 - BORDA		
			1,00			1,60	1,30		2,08		TB 17		
			2,00			2,20	0,20		0,88		TB 17 - BORDA		
			2,00			1,30	0,30		0,78		TB 17 - BORDA		
			1,00			2,60	2,20		5,72		TB 18		
			1,00			1,00	0,90		0,90		TB 19		
			2,00			1,70	0,40		1,36		TB 19 - BORDA		
			2,00			0,90	0,35		0,63		TB 19 - BORDA		
			1,00			1,20	1,00		1,20		TB 20		
			1,00			1,40	1,05		1,47		TB 20 - BORDA		
			1,00			1,00	0,20		0,20		TB 20 - BORDA		
			1,00			1,30	0,90		1,17		TB 21		
			1,00			1,40	1,05		1,47		TB 21 - BORDA		
			1,00			0,90	0,10		0,09		TB 21 - BORDA		
			1,00			5,80	3,80		22,04		TB 21 - A FUNDAMENTO		
			1,00			3,90	1,60		6,24		TB 22		
			2,00			4,30	0,20		1,72		TB 22 - BORDA		
			2,00			1,60	0,20		0,64		TB 22 - BORDA		
			1,00			7,90	2,00		15,80		TB 22 - AFUNDAMENTO		
			1,00			22,60	1,80		40,68		TB 23		
			1,00			24,00	0,67		16,08		TB 23 - BORDA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			2,00			1,87	0,70		2,62		TB 23 - BORDA		
			-			-	-		0,00		TB 24		
			-			-	-		0,00		TB 25		
			-			-	-		0,00		TB 26		
			-			-	-		0,00		TB 27		
			-			-	-		0,00		TB 28		
			-			-	-		0,00		TB 29		
			-			-	-		0,00		TB 30		
			-			-	-		0,00		TB 31		
			-			-	-		0,00		TB 32		
1.6.5	APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019_REF SINAPI (95995)	M³											
1.6.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1,00						293,17		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	293,17	293,17
	PROFUNDIDADE MÉDIA												
			1,00			6,50	3,70	0,050	1,20		RUA GIRASSOL		
			1,00			4,00	2,20	0,050	0,44		TB 01		
			2,00			4,00	0,10	0,025	0,02		TB 02 - BORDA		
			2,00			2,40	0,10	0,025	0,012		TB 02 - BORDA		
			1,00			31,10	3,40	0,050	5,29		TB 03		
			1,00			32,40	0,10	0,025	0,08		TB 03 - BORDA		
			2,00			3,40	0,10	0,025	0,02		TB 03 - BORDA		
			1,00			7,80	6,00	0,050	2,34		TB 04		
			1,00			9,00	2,10	0,050	0,95		TB 05		
			1,00			4,60	3,00	0,050	0,69		TB 06		
			1,00			11,20	3,60	0,040	1,61		TB 07		
											RUA AZALÉIA		
			1,00			3,30	2,00	0,050	0,33		TB 01		
			2,00			2,00	0,60	0,025	0,06		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,00	2,00	0,050	0,20		TB 02		
			1,00			3,70	0,20	0,025	0,02		TB 02 - BORDA		
			2,00			2,00	0,85	0,025	0,09		TB 02 - BORDA		
			1,00			3,80	2,00	0,050	0,38		TB 03		
			2,00			2,00	0,40	0,025	0,04		TB 03 - BORDA		
			1,00			5,10	0,40	0,025	0,05		TB 03 - BORDA		
			1,00			7,80	2,60	0,040	0,81		TB 04		
			1,00			4,20	2,80	0,040	0,47		TB 05		
			1,00			14,90	3,00	0,040	1,79		TB 06		
			1,00			13,70	4,00	0,040	2,19		TB 07		
			1,00			12,50	2,50	0,040	1,25		TB 08		
			1,00			19,20	2,60	0,040	2,00		TB 09		
											RUA PRIMAVERA		
			1,00			7,00	2,50	0,040	0,70		TB 01		
			1,00			6,20	2,40	0,050	0,74		TB 02		
			1,00			6,20	0,40	0,025	0,06		TB 02 - BORDA		
			2,00			2,80	0,55	0,030	0,09		TB 02 - BORDA		
			1,00			7,60	2,10	0,040	0,64		TB 03		
											RUA DOS CRAVOS		
			1,00			2,00	1,20	0,050	0,12		TB 01		
			2,00			2,20	0,95	0,025	0,10		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,00	1,00	0,025	0,05		TB 01 - BORDA		
			1,00			1,20	1,10	0,040	0,05		TB 02		
			2,00			1,20	0,40	0,025	0,02		TB 02 - BORDA		
			2,00			1,90	0,45	0,025	0,04		TB 02 - BORDA		
			1,00			1,90	0,80	0,040	0,06		TB 03		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			2,20	0,40	0,025	0,02		TB 03 - BORDA		
			2,00			0,80	0,20	0,025	0,008		TB 03 - BORDA		
			1,00			15,90	1,90	0,050	1,51		TB 04		
			2,00			0,55	2,20	0,030	0,07		TB 04 - BORDA		
			1,00			15,90	0,30	0,030	0,14		TB 04 - BORDA		
			1,00			6,40	3,10	0,040	0,79		TB 05		
			1,00			14,00	1,60	0,040	0,90		TB 06		
			1,00			14,00	0,90	0,030	0,38		TB 06 - BORDA		
			2,00			0,20	2,50	0,025	0,03		TB 06 - BORDA		
			1,00			2,60	1,80	0,040	0,19		TB 07		
			1,00			4,90	0,60	0,030	0,09		TB 07 - BORDA		
			2,00			1,80	1,15	0,030	0,12		TB 07 - BORDA		
			1,00			6,60	2,10	0,040	0,55		TB 08		
			1,00			6,60	0,60	0,030	0,12		TB 08 - BORDA		
			1,00			5,50	1,50	0,040	0,33		TB 09		
			1,00			5,50	1,20	0,030	0,20		TB 09 - BORDA		
			1,00			5,10	2,70	0,030	0,41		ENTRE TB 08 E TB 09		
			1,00			4,80	4,50	0,040	0,86		TB 10		
											RUA AÇUCENAS		
			1,00			4,70	2,10	0,030	0,30		TB 01		
											RUA DAS TULIPAS		
			1,00			17,00	2,39	0,050	2,03		TB 01		
			1,00			4,00	4,00	0,050	0,80		TB 02		
			1,00			7,90	4,00	0,025	0,79		TB 02 - BORDA		
			1,00			10,10	4,00	0,040	1,62		TB 03		
			1,00			18,70	2,90	0,040	2,17		TB 03		
											RUA DAS CAMÉLIAS		
			1,00			3,00	2,30	0,040	0,28		TB 01		
			1,00			2,30	0,60	0,025	0,03		TB 01 - BORDA		
			1,00			2,00	2,00	0,040	0,16		TB 02		
			1,00			2,00	0,60	0,025	0,03		TB 02 - BORDA		
			1,00			8,00	1,60	0,050	0,64		TB 03		
			1,00			1,90	0,90	0,025	0,04		TB 03 - BORDA		
			1,00			8,00	0,30	0,025	0,06		TB 03 - BORDA		
			1,00			1,90	0,10	0,025	0,005		TB 03 - BORDA		
			1,00			6,20	1,00	0,025	0,16		ENTRE TB 01 E TB 02		
			1,00			5,20	2,20	0,050	0,57		TB 04		
			2,00			6,00	0,25	0,025	0,08		TB 04 - BORDA		
			1,00			0,60	0,40	0,025	0,006		TB 04 - BORDA		
			2,00			2,20	0,40	0,025	0,04		TB 04 - BORDA		
			1,00			4,40	0,90	0,050	0,20		TB 05		
			1,00			4,40	0,25	0,025	0,03		TB 05 - BORDA		
			1,00			4,40	0,45	0,025	0,05		TB 05 - BORDA		
			1,00			0,90	0,40	0,025	0,009		TB 05 - BORDA		
											RUA DAS ORquíDEAS		
			1,00			9,00	2,20	0,050	0,99		TB 01		
			2,00			2,20	0,55	0,025	0,06		TB 01 - BORDA		
			1,00			10,10	0,40	0,025	0,10		TB 01 - BORDA		
			1,00			3,00	2,20	0,040	0,26		TB 02		
			2,00			2,20	0,60	0,025	0,07		TB 02 - BORDA		
			2,00			4,20	0,50	0,025	0,11		TB 02 - BORDA		
			1,00			5,20	1,20	0,030	0,19		TB 03		
			1,00			2,80	0,025	0,025	0,20		TB 04		
			2,00			3,50	1,60	0,025	0,28		TB 05		
			1,00			2,60	1,80	0,050	0,23		TB 06		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			2,00			3,50	0,30	0,025	0,05		TB 06 - BORDA		
			2,00			1,80	0,45	0,025	0,04		TB 06 - BORDA		
			1,00			3,90	1,90	0,040	0,30		TB 07		
			1,00			10,80	1,40	0,040	0,60		TB 08		
			1,00			5,10	2,00	0,040	0,41		TB 09		
											RUA MARGARIDA		
			1,00			10,90	2,70	0,030	0,88		TB 01		
			1,00			5,20	2,90	0,030	0,45		TB 02		
			1,00			7,60	2,60	0,030	0,59		TB 03		
			1,00			25,30	3,30	0,030	2,50		TB 04		
			1,00			49,40	5,30	0,030	7,85		TB 05		
											RUA DAS ADÁLIAS		
			1,00			4,40	1,70	0,040	0,30		TB 01		
			2,00			5,40	0,20	0,025	0,05		TB 01 - BORDA		
			2,00			1,70	0,50	0,025	0,04		TB 01 - BORDA		
			1,00			1,00	0,90	0,030	0,03		TB 02		
			1,00			7,50	1,80	0,040	0,54		TB 03		
											RUA DAS MARGARIDAS		
			1,00			12,90	5,00	0,030	1,94		TB 01		
			1,00			16,40	2,70	0,030	1,33		TB 02		
			1,00			16,90	2,30	0,040	1,55		TB 03		
											RUA DAS VIOLETAS		
			1,00			2,00	1,70	0,040	0,14		TB 01		
			1,00			2,90	0,20	0,025	0,01		TB 01 - BORDA		
			2,00			1,80	0,45	0,025	0,04		TB 01 - BORDA		
			1,00			7,30	1,40	0,040	0,41		TB 02		
			1,00			8,20	0,30	0,025	0,06		TB 02 - BORDA		
			2,00			1,40	0,45	0,025	0,03		TB 02 - BORDA		
			1,00			6,20	1,40	0,040	0,35		TB 03		
			1,00			6,80	0,50	0,025	0,09		TB 03 - BORDA		
			2,00			1,40	0,30	0,025	0,02		TB 03 - BORDA		
			1,00			31,70	2,10	0,040	2,66		TB 04		
			1,00			35,80	0,80	0,030	0,86		TB 04 - BORDA		
			2,00			2,10	2,05	0,025	0,215		TB 04 - BORDA		
			1,00			6,50	2,19	0,040	0,57		TB 05		
			1,00			2,19	0,25	0,025	0,01		TB 05 - BORDA		
			1,00			9,00	0,21	0,030	0,06		BORDA TB 05 / TB 06		
			1,00			2,00	1,09	0,040	0,09		TB 06		
			1,00			1,09	0,25	0,025	0,007		TB 06 - BORDA		
			1,00			20,00	1,09	0,050	1,09		TB 07		
			1,00			21,10	0,70	0,030	0,44		TB 07 - BORDA		
			2,00			2,00	0,55	0,025	0,06		TB 07 - BORDA		
											RUA IBISCOS		
			1,00	50,45				0,050	2,52		TB 01		
			1,00			5,80	2,40	0,040	0,56		TB 02		
			1,00			6,50	0,10	0,025	0,02		TB 02 - BORDA		
			1,00			2,40	0,70	0,025	0,042		TB 02 - BORDA		
			1,00			5,20	2,20	0,040	0,46		TB 03		
			1,00			5,40	0,10	0,025	0,01		TB 03 - BORDA		
			1,00			2,20	0,20	0,025	0,011		TB 03 - BORDA		
			1,00			8,50	2,50	0,040	0,85		TB 04		
			1,00			8,90	0,10	0,025	0,02		TB 04 - BORDA		
			2,00			2,50	0,20	0,025	0,03		TB 04 - BORDA		
			1,00			10,70	1,90	0,040	0,81		TB 05		
			1,00			10,80	0,10	0,025	0,03		TB 05 - BORDA		

((11,2+6,5)*5,7)/2 = 50,45

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			2,00			1,90	0,05	0,025	0,005		TB 05 - BORDA		
			1,00			23,20	2,19	0,040	2,03		TB 06		
			1,00			23,30	0,10	0,030	0,07		TB 06 - BORDA		
			1,00			2,19	0,10	0,025	0,005		TB 06 - BORDA		
			1,00			7,00	1,40	0,040	0,39		TB 07		
			1,00			7,80	0,10	0,025	0,02		TB 07 - BORDA		
			1,00			1,40	0,80	0,025	0,028		TB 07 - BORDA		
			1,00			2,90	1,70	0,030	0,15		TB 08		
											RUA DAS HORTÊNCIAS		
			1,00			5,40	1,50	0,050	0,41		TB 01		
			1,00			1,50	0,20	0,025	0,008		TB 01 - BORDA		
			1,00			4,30	1,90	0,050	0,41		TB 02		
			1,00			2,20	1,20	0,050	0,13		TB 03		
			2,00			1,20	0,30	0,025	0,02		TB 03 - BORDA		
			2,00			2,90	0,15	0,025	0,02		TB 03 - BORDA		
			1,00			6,90	2,90	0,040	0,80		TB 04		
			1,00			6,40	2,77	0,050	0,89		TB 05		
			2,00			2,77	0,50	0,025	0,07		TB 05 - BORDA		
			1,00			9,30	0,60	0,050	0,28		TB 06		
			1,00			21,50	2,50	0,050	2,69		TB 07		
			1,00			23,20	0,30	0,030	0,21		TB 07 - BORDA		
			2,00			2,20	0,85	0,025	0,09		TB 07 - BORDA		
			1,00			6,00	2,40	0,040	0,58		TB 08		
			1,00			1,30	1,60	0,050	0,10		TB 09		
			1,00			1,40	0,10	0,025	0,004		TB 09 - BORDA		
			2,00			1,60	0,05	0,025	0,004		TB 09 - BORDA		
			1,00			4,40	1,80	0,050	0,40		TB 10		
			1,00			4,40	0,05	0,025	0,006		TB 10 - BORDA		
			1,00			3,05	0,05	0,025	0,004		TB 10 - BORDA		
			1,00			4,70	2,70	0,050	0,63		TB 11		
			1,00			5,20	0,50	0,025	0,07		TB 11 - BORDA		
			1,00			4,30	3,30	0,050	0,71		TB 12		
			1,00			4,40	0,05	0,025	0,006		TB 12 - BORDA		
			1,00			2,64	0,05	0,025	0,003		TB 12 - BORDA		
			1,00			6,30	1,76	0,050	0,55		TB 13		
			1,00			6,30	0,05	0,025	0,008		TB 13 - BORDA		
			1,00			6,25	0,49	0,025	0,077		TB 13 - BORDA		
			1,00			2,30	2,10	0,050	0,24		TB 14		
			1,00			3,00	0,60	0,030	0,05		TB 14 - BORDA		
			1,00			3,90	0,30	0,025	0,03		TB 14 - BORDA		
			1,00			1,81	0,90	0,025	0,04		TB 14 - BORDA		
			1,00			2,30	0,90	0,025	0,05		TB 14 - BORDA		
			1,00			22,80	2,20	0,050	2,51		TB 15		
			2,00			22,80	0,20	0,030	0,27		TB 15 - BORDA		
			2,00			1,90	0,20	0,030	0,02		TB 15 - BORDA		
			1,00			11,10	1,50	0,050	0,83		TB 16		
			1,00			11,10	0,20	0,030	0,07		TB 16 - BORDA		
			1,00			1,90	0,20	0,030	0,011		TB 16 - BORDA		
			1,00			10,70	0,80	0,030	0,26		TB 17		
			1,00			6,00	0,40	0,050	0,12		TB 18		
			1,00			2,00	0,90	0,050	0,09		TB 19		
			1,00			13,50	2,20	0,050	1,49		TB 20		
			1,00			14,40	0,20	0,030	0,09		TB 20 - BORDA		
			2,00			2,20	0,25	0,030	0,03		TB 20 - BORDA		
			1,00			3,00	1,70	0,050	0,26		TB 21		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			1,00			3,50	0,20	0,030	0,021		TB 21 - BORDA		
			2,00			1,70	0,25	0,030	0,03		TB 21 - BORDA		
											RUA DAS ROSAS		
			1,00			6,50	2,80	0,050	0,91		TB 01		
			1,00			6,50	0,73	0,030	0,14		TB 01 - BORDA		
			1,00			26,80	1,50	0,050	2,01		TB 33 - FINAL DA RUA/CAMPO DE FUTEBOL (LD)		
			1,00			20,30	3,60	0,050	3,65		TB 02		
			1,00			12,40	1,80	0,050	1,12		TB 03		
			1,00			12,60	0,70	0,030	0,26		TB 03 - BORDA		
			1,00			1,80	0,20	0,030	0,011		TB 03 - BORDA		
			1,00			5,00	2,50	0,040	0,50		TB 03 - AFUNDAMENTO		
			1,00			7,50	2,10	0,045	0,71		TB 04		
			1,00			7,50	1,20	0,040	0,36		TB 04 - BORDA		
			1,00			3,10	6,00	0,050	0,93		TB 05		
			1,00			4,10	2,70	0,040	0,44		TB 05 - AFUNDAMENTO		
			1,00			5,00	1,80	0,050	0,45		TB 06		
			1,00			5,00	0,20	0,030	0,03		TB 06 - BORDA		
			1,00			5,70	1,90	0,050	0,54		TB 07		
			1,00			5,70	1,00	0,030	0,17		TB 07 - BORDA		
			1,00			35,60	2,90	0,050	5,16		TB 07 - AFUNDAMENTO		
			1,00			17,80	1,80	0,050	1,60		TB 08		
			1,00			17,80	1,10	0,030	0,59		TB 08 - BORDA		
			1,00			1,70	1,60	0,050	0,14		TB 09		
			2,00			2,80	0,10	0,025	0,014		TB 09 - BORDA		
			2,00			1,70	0,60	0,025	0,05		TB 09 - BORDA		
			1,00			1,70	1,50	0,050	0,13		TB 10		
			1,00			1,70	1,60	0,030	0,08		TB 10 - AFUNDAMENTO		
			1,00			6,00	3,10	0,030	0,56		TB 10 - AFUNDAMENTO		
			1,00			2,70	1,90	0,040	0,21		TB 11		
			1,00			20,60	3,80	0,050	3,91		TB 12		
			1,00			4,80	2,60	0,035	0,44		TB 13		
			2,00			0,70	2,60	0,030	0,11		TB 13 - BORDA		
			1,00			2,00	1,90	0,050	0,19		TB 14		
			2,00			2,70	0,50	0,025	0,07		TB 14 - BORDA		
			2,00			1,90	0,35	0,025	0,03		TB 14 - BORDA		
			1,00			0,80	0,80	0,050	0,03		TB 15		
			2,00			1,60	0,35	0,025	0,03		TB 15 - BORDA		
			2,00			0,80	0,40	0,025	0,02		TB 15 - BORDA		
			1,00			2,50	1,70	0,050	0,21		TB 16		
			2,00			3,30	0,40	0,025	0,07		TB 16 - BORDA		
			2,00			1,70	0,40	0,025	0,03		TB 16 - BORDA		
			1,00			1,60	1,30	0,050	0,10		TB 17		
			2,00			2,20	0,20	0,025	0,022		TB 17 - BORDA		
			2,00			1,30	0,30	0,025	0,020		TB 17 - BORDA		
			1,00			2,60	2,20	0,030	0,17		TB 18		
			1,00			1,00	0,90	0,050	0,05		TB 19		
			2,00			1,70	0,40	0,025	0,03		TB 19 - BORDA		
			2,00			0,90	0,35	0,025	0,016		TB 19 - BORDA		
			1,00			1,20	1,00	0,050	0,06		TB 20		
			1,00			1,40	1,05	0,025	0,04		TB 20 - BORDA		
			1,00			1,00	0,20	0,025	0,005		TB 20 - BORDA		
			1,00			1,30	0,90	0,050	0,06		TB 21		
			1,00			1,40	1,05	0,025	0,04		TB 21 - BORDA		
			1,00			0,90	0,10	0,025	0,002		TB 21 - BORDA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1.6.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	1,00			5,80	3,80	0,040	0,88		TB 21 - A FUNDAMENTO		
			1,00			3,90	1,60	0,050	0,31		TB 22		
			2,00			4,30	0,20	0,025	0,04		TB 22 - BORDA		
			2,00			1,60	0,20	0,025	0,016		TB 22 - BORDA		
			1,00			7,90	2,00	0,040	0,63		TB 22 - AFUNDAMENTO		
			1,00			22,60	1,80	0,040	1,63		TB 23		
			1,00			24,00	0,67	0,030	0,48		TB 23 - BORDA		
			2,00			1,87	0,70	0,025	0,07		TB 23 - BORDA		
			-			-	-	-	-		TB 24		
			-			-	-	-	-		TB 25		
			-			-	-	-	-		TB 26		
			-			-	-	-	-		TB 27		
			-			-	-	-	-		TB 28		
			-			-	-	-	-		TB 29		
			-			-	-	-	-		TB 30		
			-			-	-	-	-		TB 31		
			-			-	-	-	-		TB 32		
									125,29		TOTAL		
			1,00	125,29	2,34				293,17		TOTAL X PESO ESPECÍFICO		
			1,00						380,19		COMPACTAÇÃO MECÂNICA	380,19	380,19
			-			-	-		-		RUA GIRASSOL		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		26,00	2,00		52,00		TB 03		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		7,80	6,00		46,80		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		3,30	2,00		6,60		RUA AZALÉIA		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		2,00	2,00		4,00		TB 01		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		3,80	2,00		7,60		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
			-			-	-		-		TB 07		
			-			-	-		-		TB 08		
			-			-	-		-		TB 09		
			-			-	-		-		RUA PRIMAVERA		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		6,20	2,40		14,88		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		RUA DOS CRAVOS		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS	1,00		15,90	1,90		30,21		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
			-			-	-		-		TB 07		
			-			-	-		-		TB 08		
			-			-	-		-		TB 09		
			-			-	-		-		TB 10		
											RUA AÇUCENAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			-			-	-		-		TB 01		
											RUA DAS TULIPAS		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			17,00	2,39		40,63		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
											RUA DAS CAMÉLIAS		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			3,00	2,30		6,90		TB 01		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			2,00	2,00		4,00		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
											RUA DAS ORQUÍDEAS		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			9,00	2,20		19,80		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			2,60	1,80		4,68		TB 06		
			-			-	-		-		TB 07		
			-			-	-		-		TB 08		
			-			-	-		-		TB 09		
											RUA MARGARIDA		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
											RUA DAS ADÁLIAS		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			4,40	1,50		6,60		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
											RUA DAS MARGARIDAS		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
											RUA DAS VIOLETAS		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
	COMPACTAÇÃO DO FUNDO DA VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS		1,00			20,00	1,09		21,80		TB 07		
			-			-	-		-		RUA IBISCOS		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
			-			-	-		-		TB 07		
			-			-	-		-		TB 08		
											RUA HORTÊNCIAS		
			-			-	-		-		TB 01		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
			-			-	-		-		TB 04		
			-			-	-		-		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		1,00			21,50	2,20		47,30		TB 07		
			-			-	-		-		TB 08		
			-			-	-		-		TB 09		
			-			-	-		-		TB 10		
			-			-	-		-		TB 11		
			-			-	-		-		TB 12		
			-			-	-		-		TB 13		
			-			-	-		-		TB 14		
			-			-	-		-		TB 15		
			-			-	-		-		TB 16		
			-			-	-	-	-		TB 17		
			-			-	-	-	-		TB 18		
			-			-	-	-	-		TB 19		
			-			-	-		-		TB 20		
			-			-	-		-		TB 21		
			-			-	-		-		RUA DAS ROSAS		
			-			-	-		-		TB 01		
			-			-	-		-		TB 02		
			-			-	-		-		TB 03		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		1,00			7,50	2,10		15,75		TB 04		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		1,00			3,10	6,00		18,60		TB 05		
			-			-	-		-		TB 06		
			-			-	-		-		TB 07		
	BGS (ADEQUAR ESCAVAÇÃO)		1,00			17,80	1,80		32,04		TB 08		
			-			-	-		-		TB 09		
			-			-	-		-		TB 10		
			-			-	-		-		TB 11		
			-			-	-		-		TB 12		
			-			-	-		-		TB 13		
			-			-	-		-		TB 14		
			-			-	-		-		TB 15		
			-			-	-		-		TB 16		
			-			-	-		-		TB 17		
			-			-	-		-		TB 18		
			-			-	-		-		TB 19		
			-			-	-		-		TB 20		
			-			-	-		-		TB 21		
			-			-	-		-		TB 22		
			-			-	-		-		TB 23		
			-			-	-	-	-		TB 24		
			-			-	-	-	-		TB 25		
			-			-	-	-	-		TB 26		
			-			-	-	-	-		TB 27		
			-			-	-	-	-		TB 28		
			-			-	-	-	-		TB 29		
			-			-	-	-	-		TB 30		
			-			-	-	-	-		TB 31		
			-			-	-	-	-		TB 32		
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1.7.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M											
1.7.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO_REF SICRO (5213464)	UN											
1.7.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO_REF SICRO (5213440)	UN											
1.7.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN											
1.7.5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA 0,6MM	M²											
1.8	OBRAS COMPLEMENTARES												
1.8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022_REF SINAPI (94990)	M³	1,00						16,12		CALÇADA	16,12	16,12
	L = 1,50		1,00			130,00	1,25	0,07	11,38		RUA MARGARIDA - L.D.		
	NOS POSTE 1, DESCONSIDERADO VOLUME DO POSTE		1,00			1,00	0,90	0,07	0,06	(0,004)	RUA MARGARIDA - L.D.		
	NOS POSTE 2, DESCONSIDERADO VOLUME DO POSTE		1,00			0,90	0,75	0,07	0,04	(0,004)	RUA MARGARIDA - L.D.		
	NOS POSTE 2, DESCONSIDERADO VOLUME DO POSTE		1,00			1,37	0,25	0,07	0,02		RUA MARGARIDA - L.D.		
	L = 1,20		1,00			69,40	0,95	0,07	4,62		RUA MARGARIDA - L.E.		
1.8.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²	1,00						52,99		PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL	52,99	52,99
	L = 1,50		1,00			142,58	0,25		35,64		RUA MARGARIDA - L.D.		
	L = 1,20		1,00			69,40	0,25		17,35		RUA MARGARIDA - L.E.		
2	FONTE 200												0,00
2.1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO												
2.1.1	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018_REF SINAPI (99060)	UN	1,00						8,00		CAVALETE	8,00	8,00
			8,00						8,00		CAVALETE DE SINALIZAÇÃO		
2.2	DRENAGEM PLUVIAL URBANA												
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³											
2.2.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP_REF SINAPI (74151/001)	M³											
2.2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA_REF SINAPI (72887)	M³ x KM											
2.2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)_REF SINAPI (72881)	M³ x KM											
2.2.5	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 120CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO_REF SINAPI (73963/007)	UN											
2.2.6	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN											
2.2.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024_INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M_REF SINAPI (94267) E (74237/001)	M											
2.2.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M											
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
2.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO_REF SICRO (5213440)	UN											
2.3.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN											
2.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN											
2.3.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN											
2.3.5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M²											

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
2.3.6	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²											
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES												
2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022_REF SINAPI (94990)	M³											
2.4.2	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M²											
2.4.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN											
2.4.4	RAMPA E CALÇADA DE ACESSO AOS LOTES_REF SINAPI (105004)	M²											
2.4.5	POSTE DE FERRO GALVANIZADO ø 3" COM PLANTA METYÁLICA (CAPA GALVANIZADA) PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (REF.: SINAPI_73916/002_01/2016)	UN											
2.4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS (REF.: SINAPI_73916/002_01/2016)	UN											

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO

COE1: COEFICIENTE

COE2: COEFICIENTE

DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO

LARG: LARGURA OU DIÂMETRO

ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026



ENGº CIVIL - OGINEY RIPARDO DA ROCHA

CREA - 20.449 D/AC



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE / BOTA FORA (OBRA X ATERRO DE INERTES)


21/01/2025, 10:07

de Jardim Primavera a Floresta Sul, Rio Branco - AC - Google Maps

Google Maps

de Jardim Primavera, Rio Branco - AC a
Floresta Sul, Rio Branco - AC

De carro 6,8 km, 11 min

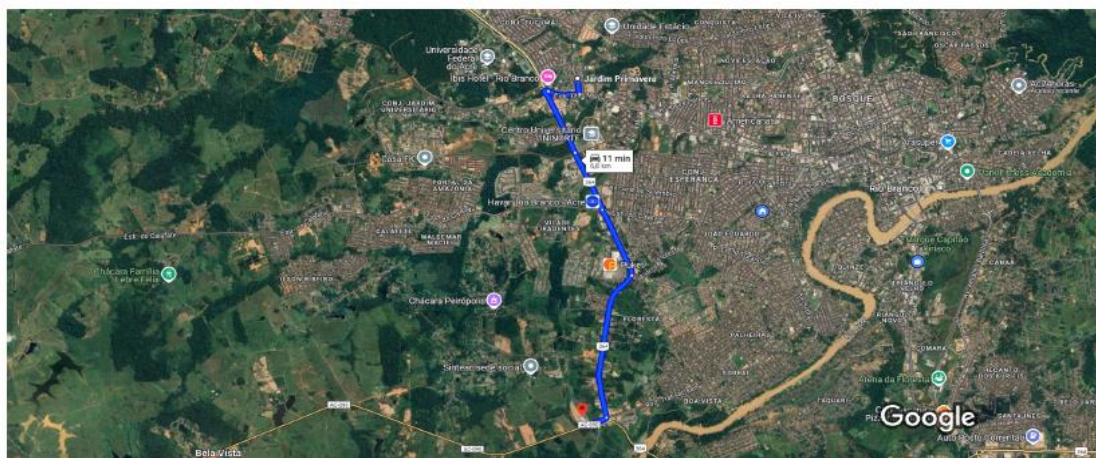

Imagens ©2025 Airbus, CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2025 Google 1 km



via BR-364

11 min

Trajetos mais rápidos, com trânsito
normal

6,8 km

Conheça Floresta Sul



Restauran-
tes



Hotéis




Postos de
gasolina



Estaciona-
mentos




Mais



21/01/2025, 10:12 de Alameda Sabiá, 901 - Cj Universitario, Rio Branco - AC, 69917-770 a R. das Acucenas, 59-1 - Jardim Primavera, Rio Bran...

de Alameda Sabiá, 901 - Cj Universitario, De carro 5,2 km, 9 min
Rio Branco - AC, 69917-770 a R. das Açucenas, 59-1 - Jardim
Primavera, Rio Branco - AC

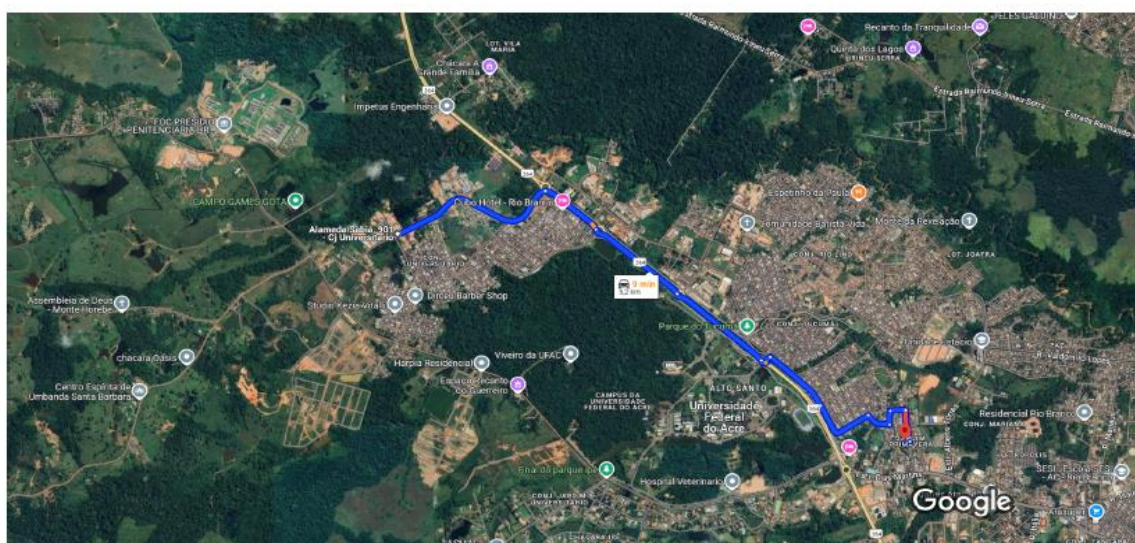

Imagens ©2025 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do mapa ©2025 Google 500 m



9 min

Trajetos mais rápidos, apesar de haver trânsito	5,2 km
---	--------

Conheça locais próximos a R. das Açucenas,
59-1 - Jardim Primavera

Restauran-
tes

Hotéis

Postos de gasolina

Estaciona- mentos

Mais



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA DAS ROSAS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA DAS ROSAS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA DAS ROSAS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA GIRASSOL, RUA AZALÉIA E RUA PRIMAVERA





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA HORTÊNCIAS





ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

SEOP

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA HORTÊNCIAS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA DAS TULIPAS E RUA DOS CRAVOS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA CAMÉLIAS, RUA DOS CRAVOS E RUA DAS AÇUCENAS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA DAS ORQUÍDEAS, DAS ADÁLIAS E RUA DAS MARGARIDAS





Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA MARGARIDA





ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

SEOP

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

RECUPERAÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO) - RUA DAS VIOLETAS E RUA IBISCOS






Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

BARRACÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

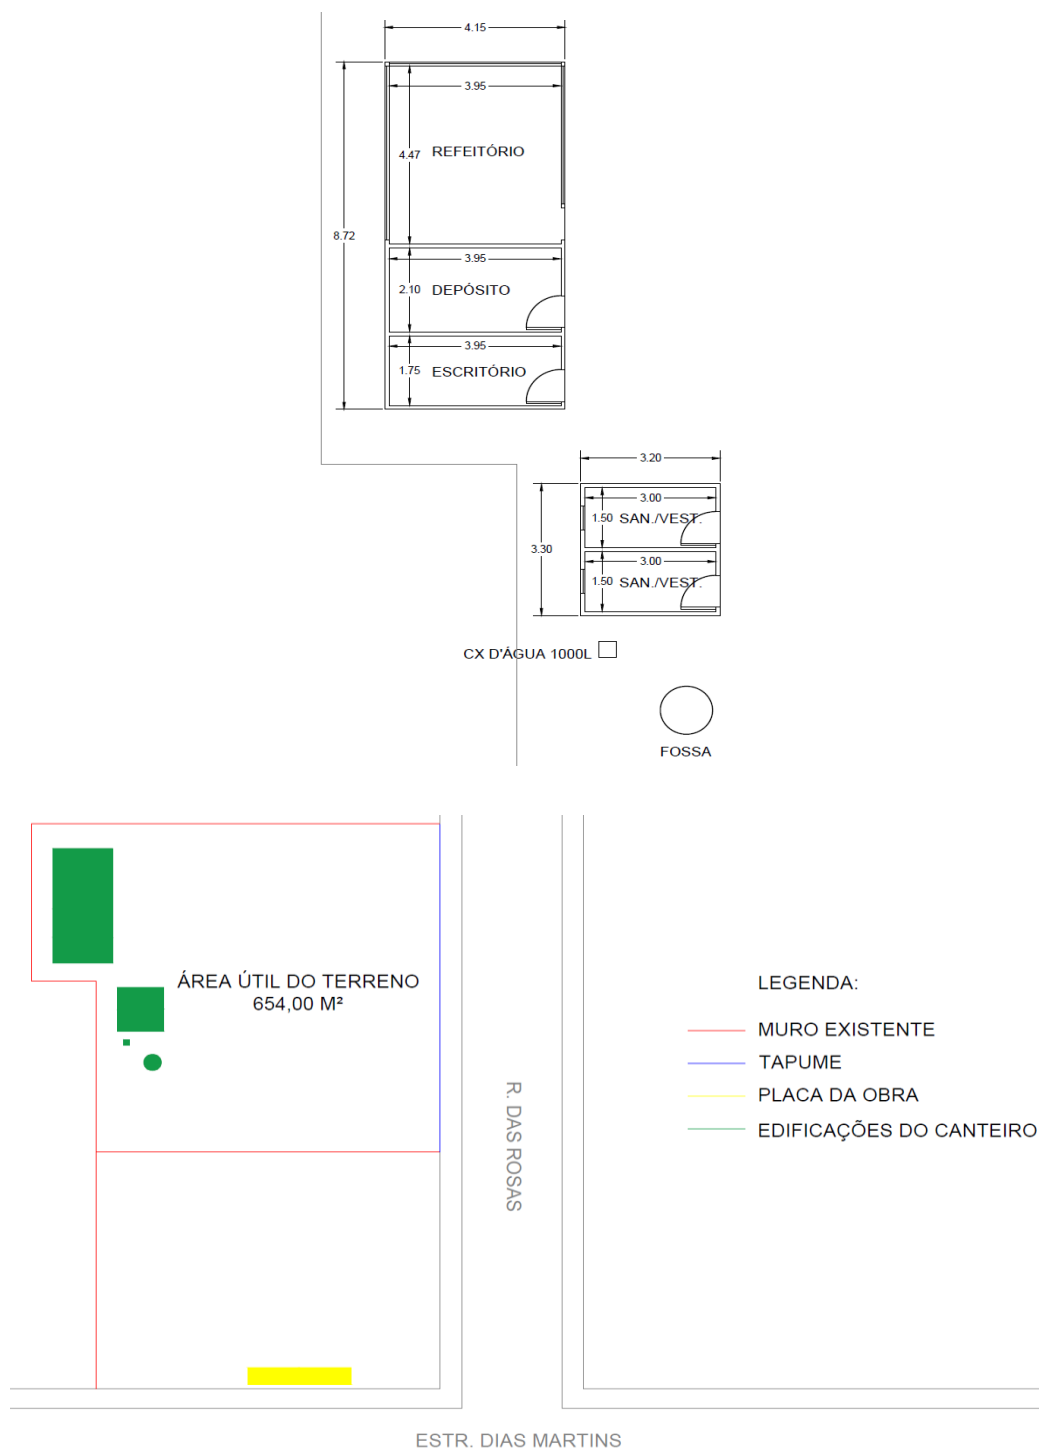




Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

CALÇADA EM CONCRETO E PISO TÁTIL - RUA MARGARIDA

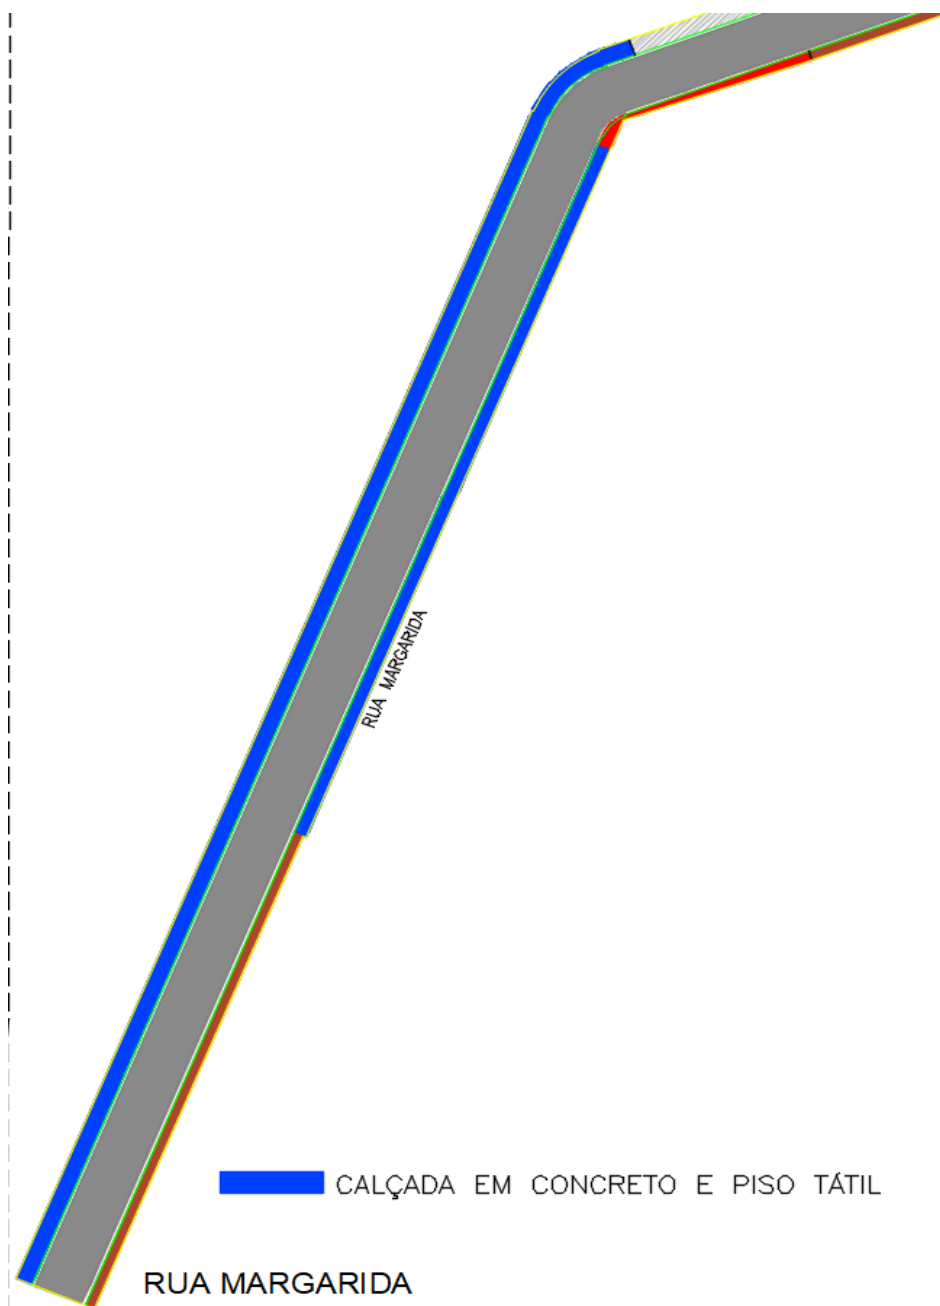


Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil
CREA 20.449-D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO				TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%	VALOR
1	FONTE 100	1.071.215,02							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.194,00	5,27%	20.203,12 31,97%	17.624,81 27,89%	16.714,81 26,45%	8.651,26 13,69%	5,27%	63.194,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.837,01	0,49%	5.837,01 100,00%				0,49%	5.837,01
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.315,84	0,86%	10.315,84 100,00%				0,86%	10.315,84
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	27.705,88	2,31%	27.705,88 100,00%				2,31%	27.705,88
1.5	REPAROS DE DRENAGEM URBANA SUPERFICIAL	11.482,14	0,96%	3.903,93 34,00%	3.903,93 34,00%	3.674,28 32,00%		0,96%	11.482,14
1.6	RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	773.194,68	64,54%	262.886,19 34,00%	262.886,19 34,00%	247.422,30 32,00%		64,54%	773.194,68
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	31.773,19	2,65%				31.773,19 100,00%	2,65%	31.773,19
1.8	OBRAS COMPLEMENTARES	147.712,28	12,33%	36.928,07 25,00%	36.928,07 25,00%	36.928,07 25,00%	36.928,07 25,00%	12,33%	147.712,28
2	FONTE 200	126.784,80							
2.1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	2.663,10	0,22%	2.663,10 100,00%					
2.2	DRENAGEM PLUVIAL URBANA	23.069,18	1,93%	7.843,52 34,00%	7.843,52 34,00%	7.382,14 32,00%		1,93%	23.069,18
2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.520,95	1,21%	4.937,12 34,00%	4.937,12 34,00%	4.646,70 32,00%		1,21%	14.520,95
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES	86.531,57	7,22%				86.531,57 100,00%	7,22%	86.531,57
TOTAL NO PERÍODO		-		383.223,78 31,99%	334.123,64 27,89%	316.768,31 26,44%	163.884,09 13,68%		
TOTAL ACUMULADO		1.197.999,82 100,00%		383.223,78 31,99%	717.347,42 59,88%	1.034.115,73 86,32%	1.197.999,82 100,00%		

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026


Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil
CREA 20.449-D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 1
PLACA DA OBRA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 2
PLACA DA OBRA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 3
PLACA DA OBRA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC | **ART OBRA / SERVIÇO**
Nº AC20260127747

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico	
RAFAEL WICIUK	RNP: 0100719600
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 8512AC
Empresa contratada: RAFAEL WICIUK EIRELI	
Registro: 000000880-AC	
2. Dados do Contrato	
Contratante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CPF/CNPJ: 03.123.324/0001-05
VIA CHICO MENDES	Nº: 806
Complemento: SEGUNDO DISTRITO	CEP: 69906150
Cidade: RIO BRANCO	Bairro: TRIÂNGULO
UF: AC	UF: AC
Contrato: 088/2025	Celebrado em: 22/12/2025
Valor: R\$ 1.197.999,82	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros	
3. Dados da Obra/Serviço	
RUA DAS VIOLETAS	Nº: SN
Complemento:	Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Cidade: RIO BRANCO	UF: AC
Data de Início: 15/01/2026	Previsão de término: 15/05/2026
Finalidade: Infraestrutura	Coordenadas Geográficas: 0,0
Proprietário: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Código: Não Especificado
	CPF/CNPJ: 03.123.324/0001-05

Imagem 4
ART

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC | **ART OBRA / SERVIÇO**
Nº AC20260131371

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à AC20260127747

1. Responsável Técnico	
NALBERT ALBUQUERQUE VIANA	RNP: 0119332061
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 21863 DIAC AC
Empresa contratada: VERSATIL ENGENHARIA LTDA	
Registro: 000000880-AC	
2. Dados do Contrato	
Contratante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CPF/CNPJ: 03.123.324/0001-05
VIA CHICO MENDES	Nº: 806
Complemento: SEGUNDO DISTRITO	CEP: 69906150
Cidade: RIO BRANCO	Bairro: TRIÂNGULO
UF: AC	UF: AC
Contrato: 088/2025	Celebrado em: 22/12/2025
Valor: R\$ 1.197.999,82	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros	
3. Dados da Obra/Serviço	
RUA DAS VIOLETAS	Nº: SN
Complemento:	Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Cidade: RIO BRANCO	UF: AC
Data de Início: 15/01/2026	Previsão de término: 15/05/2026
Finalidade: Infraestrutura	Coordenadas Geográficas: 0,0
Proprietário: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Código: Não Especificado
	CPF/CNPJ: 03.123.324/0001-05

Imagem 5
ART

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 6
EXECUÇÃO DE TAPUME



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 7
EXECUÇÃO DE TAPUME

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 8
EXECUÇÃO DE TAPUME

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 9
EXECUÇÃO DE TAPUME

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 10
TAPUME

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 11
TAPUME

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 12
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO, DEPÓSITO E VESTIÁRIO



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 13
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 14
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO, DEPÓSITO E VESTIÁRIO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 15
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 16
SANITÁRIO, REFEITÓRIO, DEPÓSITO E VESTIÁRIO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 17
SANITÁRIO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 18
SANITÁRIO, REFEITÓRIO, DEPÓSITO E VESTIÁRIO



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 19

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 20

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 21

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 22

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 23

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 24

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

RAFAEL WICIUK LTDA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 25

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 26

ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE BOTA FORA E COMPOACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 27

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 28

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 29

ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE BOTA FORA E COMPOACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA PARA EXECUÇÃO DE BGS

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 30

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 31

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 32

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 33

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 34

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 35

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 36

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 37

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 38

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 39

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 40

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 41

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 42

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

RAFAEL WICIUK LTDA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 43

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 44

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 45

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA + BGS

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 46

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA EXECUTADO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 47

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE BOTA FORA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 48

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEOP
SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 49

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 50

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 51

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 52

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 53

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 54

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEOP
SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 55

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 56

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 57

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 58

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

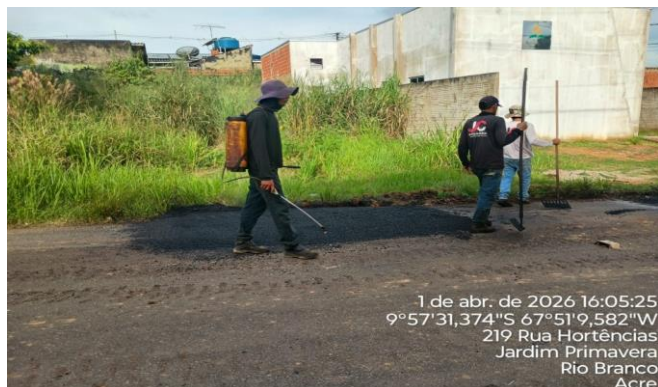


Imagem 59

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 60

TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 61

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 62

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

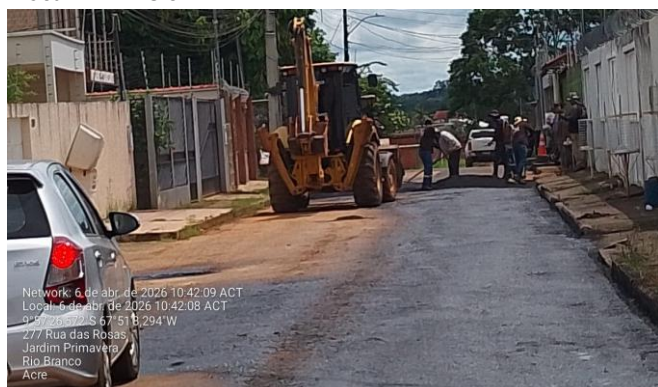


Imagem 63

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 64

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 65

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 66

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

RAFAEL WICIUK LTDA

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Network: 7 de abr. de 2026 10:45:48 ACT
Local: 7 de abr. de 2026 10:45:47 ACT
9°57'38.388"S 67°51'9.148"W
170 Rua Hortênsias
Jardim Primavera
Rio Branco
Acre

Imagem 67

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Network: 7 de abr. de 2026 10:55:06 ACT
Local: 7 de abr. de 2026 10:55:05 ACT
9°57'36.288"S 67°51'8.868"W
88 Rua Hortênsias
Jardim Primavera
Rio Branco
Acre

Imagem 68

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Network: 7 de abr. de 2026 10:25:49 ACT
Local: 7 de abr. de 2026 10:25:49 ACT
9°57'35.907"S 67°51'11.517"W
49 Rua Ibiapaba
Jardim Primavera
Rio Branco
Acre

Imagem 69

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Network: 5 de mar. de 2026 12:43:26 ACT
Local: 5 de mar. de 2026 12:43:25 ACT
9°57'35.988"S 67°51'10.717"W
67 Rua das Violetas
Jardim Primavera
Rio Branco
Acre

Imagem 70

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Network: 7 de abr. de 2026 10:10:29 ACT
Local: 7 de abr. de 2026 10:10:29 ACT
9°57'31.567"S 67°51'14.947"W
103 Rua das Camélias
Jardim Primavera
Rio Branco
Acre

Imagem 71

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Network: 7 de abr. de 2026 10:42:22 ACT
Local: 7 de abr. de 2026 10:42:21 ACT
9°57'32.978"S 67°51'9.13 W
170 Rua Hortênsias
Jardim Primavera
Rio Branco
Acre

Imagem 72

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 73

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 74

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 75

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 76

ELETRODUTOS RÍGIDO E FLEXÍVEL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 77

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 78

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 79

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 80

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 81

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 82

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 83

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 84

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEOP
SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 85

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 86

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 87

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 88

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 89

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 90

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 91

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 92

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 93

PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 94

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 95

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 96

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 97

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 98

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 99

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 100

CALÇADA EM CONCRETO + PISO TÁTIL

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 101

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 102

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 103

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 104

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 105

PINTURA DE LIGAÇÃO + TRANSPORTE CBUQ + CBUQ

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 106

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 107

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 108

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEOP

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 109

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO

Local:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA



Imagem 110

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO


Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026

CREA 20.449-D/AC



ESTADO DO ACRE

#REF!

ANEXO 6 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Construtora:

RAFAEL WICIUK LTDA

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Segurança	Admin. Obra	Nota
1ª Medição	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00
2ª Medição								
3ª Medição								
4ª Medição								
5ª Medição								
6ª Medição								
7ª Medição								
8ª Medição								
9ª Medição								
10ª Medição								
11ª Medição								
12ª Medição								
13ª Medição								
14ª Medição								
15ª Medição								
16ª Medição								
17ª Medição								
18ª Medição								
19ª Medição								

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Média Final: 7,00
Conceito: Boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	2	1	0
2.0 Atendimento a fiscalização	2	1	0
3.0 Qualidade dos serviços	2	1	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	2	1	0
5.0 Equipe técnica	2	1	0
6.0 Segurança do trabalho	2	1	0
7.0 Administração e instalação da obra	2	1	0

Conceito

Ruim - 0,00 a 4,99 Boa - 7,00 a 8,99
Razoável - 5,00 a 6,99 Muito Boa - 9,00 a 10,00


Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil
CREA 20.449-D/AC


Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 7 - AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**
Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**
Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado

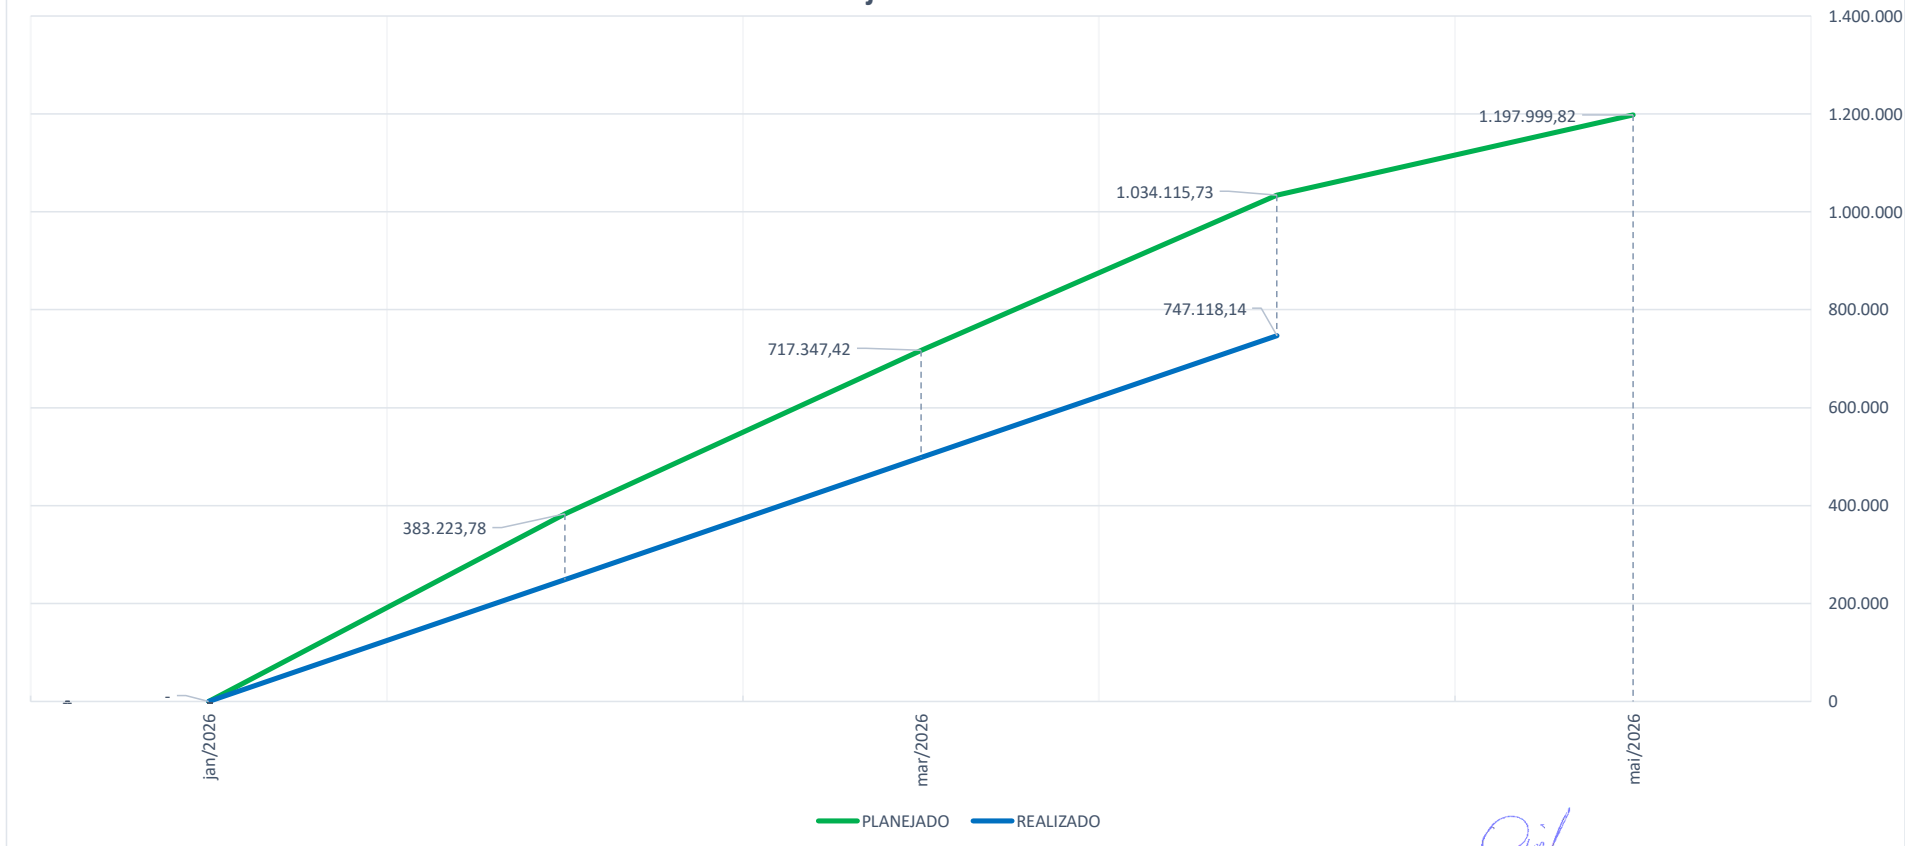


Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil
CREA 20.449-D/AC

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026



#REF!

#REF!

ANEXO 8 - JUSTIFICATIVA DE ATRASO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA EM RIO BRANCO/AC.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP**

Construtora: **RAFAEL WICIUK LTDA**

Fonte de Recurso: **1.500.0100 E 11.754.0500**

Nº CT Construtora: **088/2025**

Fiscal da obra: **ENG.º CIVIL OGINEY RIPARDO DA ROCHA - CREA 20.449 D/AC, ENG.ª DE SEGURANÇA NO TRABALHO THALIA PINTO DE NEGREIROS - CREA 21879 D/AC**

Respons. Técnico: **ENG.º CIVIL RAFAEL WICIUK - CREA 8512 AC**

Có-Resp. Técnico: **ENG.º CIVIL NALBERT ALBUQUERQUE VIANA - CREA 21863 D/AC**

2 - Justificativa para atraso de obra

PERÍODO DE CHUVAS INTENSAS NO INÍCIO DO ANO. ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS.

3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

A PLANILHA DEVERÁ SER REPROGRAMADA.

4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2026


Oginey Ripardo da Rocha
Engenheiro Civil
CREA 20.449-D/AC
