



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Nº CT Construtora: 023/2026

Construtora: QUEIROZ & SANTOS LTDA

Número da medição: 1

Data da medição: 17/07/2026

Valor no período: R\$ 391.788,66

Período da medição: 02/06/2026 a 30/06/2026

PARECER:

Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações técnicas, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada para providências quanto ao pagamento.

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
CREA - 22399 D/AC

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

97,54% executado.



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
RESUMO - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP
Construtora: QUEIROZ & SANTOS LTDA
Fonte de Recurso: 15000100 - RP
Nº CT Construtora: 023/2026
Fiscal da obra: GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
Respons. Técnico: JAILSON DOS SANTOS QUEIROZ

2 - Temporalidade da Medição

Número da medição: 1ª
Data da medição: 17/07/26
Período da medição: 02/06/26 A 30/06/26
Início da obra: 02/06/26

Prazo Inicial da Obra: 1 MESES
Prazo Reprogramado: 0 MESES
Prazo Decorrido: 2 MESES
Término da Obra: 02/07/2026
Situação da Obra: EXECUÇÃO EXPIRADA

3 - Resumo da Medição

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
		CONTRATADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA- 30 DIAS- 8 HORAS/DIA	23.612,91	21.913,93	21.913,93	92,8%
2	ART E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.526,19	4.526,19	4.526,19	100,0%
3	CANTEIRO DE OBRAS	44.876,96	44.876,96	44.876,96	100,0%
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.042,60	318.042,60	318.042,60	100,0%
5	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2026 8 HORAS/DIA	9.137,84	2.428,98	2.428,98	26,6%
6	REMOÇÃO DOS MATERIAIS	1.462,50	-	-	0,0%
TOTAL		401.659,00	391.788,66	391.788,66	97,54%

O valor da presente medição é:

Trezentos e noventa e um mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos

4 - Situação da obra

Execução física: 97,54%	Valor contrato inicial: 401.659,00
Situação do Cronograma Inicial: OBRA VIGENTE	Valor adequado:
Nível Técnico da Empresa	Conceito da Empresa
☐ 0,00 a 4,99 ☐ 5,00 a 6,99 ☒ 7,00 a 8,99 ☐ 9,00 a 10,00	☐ Ruim ☐ Razoável ☒ Boa ☐ Muito boa
Observações: Atestamos, que os serviços constantes da presente medição, foram executados de acordo com as especificações, estando todos os valores e quantitativos corretos, podendo a presente fatura ser liberada.	

5 - Documentos anexos:

- 1 - Boletim de Medição;
2 - Memória de Cálculo;
3 - Planta iluminada;
4 - Resumo do Cronograma;
- 5 - Relatório Fotográfico;
6 - Justificativa de atraso;
7 - Avaliação;
8 - Gráfico - Previsto x Realizado.

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
CREA - 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 1 - BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**
Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**
Fonte: **15000100 - RP**
Nº Contrato: **023/2026**
Fiscal: **GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ**
R.Técnico: **JAILSON DOS SANTOS QUEIROZ**

Data-base Orçamento: **03/2026**

Data da Medição: **17/07/2026**
Período da Medição: **02/06/2026 A 30/06/2026**
Prazo Inicial Obra: **1 MESES**
Início da Obra: **02/06/2026**
Término da Obra: **02/07/2026**
Situação da Obra: **EXECUÇÃO EXPIRADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA- 30 DIAS- 8 HORAS/DIA												
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF.: SINAPI (90779 - 03/2026)	H	65,00	106,53	6.924,45	60,06	6.398,19	60,06	6.398,19	92,40%	4,94	526,26	7,60%
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	33,10	7.944,00	221,76	7.340,26	221,76	7.340,26	92,40%	18,24	603,74	7,60%
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	21,90	5.256,00	221,76	4.856,54	221,76	4.856,54	92,40%	18,24	399,46	7,60%
1.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	29,74	2.230,50	69,30	2.060,98	69,30	2.060,98	92,40%	5,70	169,52	7,60%
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,00	314,49	1.257,96	4,00	1.257,96	4,00	1.257,96	100,00%	-	-	
2	ART E SEGURANÇA DO TRABALHO												
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00	324,17	324,17	1,00	324,17	1,00	324,17	100,00%	-	-	
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00	1.137,24	1.137,24	1,00	1.137,24	1,00	1.137,24	100,00%	-	-	
2.3	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00	1.021,59	1.021,59	1,00	1.021,59	1,00	1.021,59	100,00%	-	-	
2.4	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,00	1.021,59	1.021,59	1,00	1.021,59	1,00	1.021,59	100,00%	-	-	
2.5	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00	1.021,60	1.021,60	1,00	1.021,60	1,00	1.021,60	100,00%	-	-	
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	CANTEIRO DE OBRAS COMPLETO C/ VESTIÁRIO/BANHEIRO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO (CONFORME NR-18 E NR-24)	m²	58,58	766,08	44.876,96	58,58	44.876,96	58,58	44.876,96	100,00%	-	-	0,00
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
4.1	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	300,00	26,89	8.067,00	300,00	8.067,00	300,00	8.067,00	100,00%	-	-	
4.2	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101550 - 03/2026)	UND	3.000,00	26,36	79.080,00	3.000,00	79.080,00	3.000,00	79.080,00	100,00%	-	-	
4.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	10,00	257,35	2.573,50	10,00	2.573,50	10,00	2.573,50	100,00%	-	-	
4.4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	50,00	44,79	2.239,50	50,00	2.239,50	50,00	2.239,50	100,00%	-	-	
4.5	REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	100,00	257,38	25.738,00	100,00	25.738,00	100,00	25.738,00	100,00%	-	-	
4.6	REFLETOR DE 200W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - REF: SINAPI (105921 - 09/2025)	UN	250,00	186,96	46.740,00	250,00	46.740,00	250,00	46.740,00	100,00%	-	-	
4.7	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 REF.: SINAPI (100602 - 03/2026)	UN	10,00	1.557,95	15.579,50	10,00	15.579,50	10,00	15.579,50	100,00%	-	-	
4.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00	826,21	8.262,10	10,00	8.262,10	10,00	8.262,10	100,00%	-	-	
4.9	REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	150,00	238,65	35.797,50	150,00	35.797,50	150,00	35.797,50	100,00%	-	-	
4.10	REFLETOR LED DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - REF: SINAPI (105921 - 03/2026)	UN	250,00	211,92	52.980,00	250,00	52.980,00	250,00	52.980,00	100,00%	-	-	
4.11	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	500,00	18,05	9.025,00	500,00	9.025,00	500,00	9.025,00	100,00%	-	-	
4.12	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021-REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	150,00	60,21	9.031,50	150,00	9.031,50	150,00	9.031,50	100,00%	-	-	
4.13	LUMINÁRIA REFLETOR LED RGB 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105920 - 03/2026)	UN	20,00	164,48	3.289,60	20,00	3.289,60	20,00	3.289,60	100,00%	-	-	
4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 REF.: SINAPI (92986 - 03/2026)	M	300,00	35,08	10.524,00	300,00	10.524,00	300,00	10.524,00	100,00%	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	TOTAL	%	QUANT.	TOTAL	%
4.15	REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	10,00	911,54	9.115,40	10,00	9.115,40	10,00	9.115,40	100,00%	-	-	
5	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2026 8 HORAS/DIA												
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	20,38	978,24	6,00	122,28	6,00	122,28	12,50%	42,00	855,96	87,50%
5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	20,38	978,24	6,00	122,28	6,00	122,28	12,50%	42,00	855,96	87,50%
5.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	20,38	978,24	6,00	122,28	6,00	122,28	12,50%	42,00	855,96	87,50%
5.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	20,38	978,24	6,00	122,28	6,00	122,28	12,50%	42,00	855,96	87,50%
5.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	16,49	791,52	6,00	98,94	6,00	98,94	12,50%	42,00	692,58	87,50%
5.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	16,49	791,52	6,00	98,94	6,00	98,94	12,50%	42,00	692,58	87,50%
5.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	16,49	791,52	6,00	98,94	6,00	98,94	12,50%	42,00	692,58	87,50%
5.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	16,49	791,52	6,00	98,94	6,00	98,94	12,50%	42,00	692,58	87,50%
5.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	8,00	257,35	2.058,80	6,00	1.544,10	6,00	1.544,10	75,00%	2,00	514,70	25,00%
6	REMOÇÃO DOS MATERIAIS												
6.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	750,00	1,95	1.462,50			-	-		750,00	1.462,50	100,00%
TOTAL SIMPLES			401.659,00			97,54%	391.788,66	391.788,66 97,54%			9.870,34 2,46%		
TOTAL ACUMULADO						97,54%	391.788,66						
SALDO						2,46%	9.870,34						

O Valor da presente medição é:
TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA
CREA - 22399 D/AC



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Jurua, para realização da EXPOACRE JURUA 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**

Nº CT Construtora: **023/2026**

Fiscal da obra: **GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ**

Respons. Técnico: **JAILSON DOS SANTOS QUEIROZ**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA- 30 DIAS- 8 HORAS/DIA												
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF.: SINAPI (90779 - 03/2026)	H	60,06								Valor pago proporcionalmente à primeira medição da obra que corresponde a 92,36%, $\frac{65}{x} \times \frac{100\%}{92,40\%}$	60,06	60,06
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	221,76								Valor pago proporcionalmente à primeira medição da obra que corresponde a 92,36%, $\frac{240}{x} \times \frac{100\%}{92,40\%}$	221,76	221,76
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	221,76								Valor pago proporcionalmente à primeira medição da obra que corresponde a 92,36%, $\frac{240}{x} \times \frac{100\%}{92,40\%}$	221,76	221,76
1.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	69,30								Valor pago proporcionalmente à primeira medição da obra que corresponde a 92,36%, $\frac{75}{x} \times \frac{100\%}{92,40\%}$	69,30	69,30
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,00									4,00	4,00
2	ART E SEGURANÇA DO TRABALHO												
2.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART- CREA	UN	1,00								ART DA OBRA.	1,00	1,00
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA.	1,00	1,00
2.3	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA.	1,00	1,00
2.4	LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT (ATÉ 40 OPERARIOS)	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA.	1,00	1,00
2.5	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO (ATÉ 40 OPERÁRIOS)	UN	1,00								PROGRAMAS DE SEGURANÇA.	1,00	1,00
3	CANTEIRO DE OBRAS												
3.1	CANTEIRO DE OBRAS COMPLETO C/ VESTIÁRIO/BANHEIRO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO E DEPÓSITO (CONFORME NR-18 E NR-24)	m²	58,58								CANTEIRO DE OBRAS.	58,58	58,58
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
4.1	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W COM BASE SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 RE.: SINAPI (101632 - 03/2026)	UN	300,00								INSTALADO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	300,00	300,00
4.2	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (101550 - 03/2026)	UND	3.000,00								INSTALADO PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS.	3.000,00	3.000,00
4.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	10,00								UTILIZADO PARA SERVIÇOS ENVOLVENDO INSTALAÇÃO DE POSTES, MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS INSTALADAS EM POSTES.	10,00	10,00
4.4	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	50,00								INSTALADA PARA FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS EM POSTES OU ESTRUTURAS METÁLICAS.	50,00	50,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	REP.	COEFICIENTE		DIMENSÕES			ÁREA	DESC.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL
				COE ₁	COE ₂	COMP.	LARG.	ALT.					
4.5	REFLETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	100,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO DA EXPOACRE JURUÁ.	100,00	100,00
4.6	REFLETOR DE 200W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - REF: SINAPI (105921 - 09/2025)	UN	250,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO DA EXPOACRE JURUÁ.	250,00	250,00
4.7	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 REF.: SINAPI (100602 - 03/2026)	UN	10,00								ASSENTAMENTO DE POSTE.	10,00	10,00
4.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO DA EXPOACRE JURUÁ.	10,00	10,00
4.9	REFLETOR DE LED PARA CAMPO QUADRA 400W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	150,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO DA EXPOACRE JURUÁ.	150,00	150,00
4.10	REFLETOR LED DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 - REF: SINAPI (105921 - 03/2026)	UN	250,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO DA EXPOACRE JURUÁ.	250,00	250,00
4.11	CABO ALUMÍNIO TRIPLEX 2X16,00 MM² + NEUTRO NÚ 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI (91935)	M	500,00								INSTALADO PARA ALIMENTAÇÃO DE TENDAS E/OU RESTAURANTES.	500,00	500,00
4.12	CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO DE 70 MM² + NEUTRO NU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021- REF: SINAPI (92990 - 09/2025)	M	150,00								INSTALADO PARA ALIMENTAÇÃO DE TENDAS E/OU RESTAURANTES.	150,00	150,00
4.13	LUMINÁRIA REFLETOR LED RGB 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105920 - 03/2026)	UN	20,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ESPAÇO DA EXPOACRE JURUÁ.	20,00	20,00
4.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 REF.: SINAPI (92986 - 03/2026)	M	300,00								INSTALADO PARA ALIMENTAÇÃO DE TENDAS E/OU RESTAURANTES.	300,00	300,00
4.15	REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 REF.: SINAPI (105919 - 03/2026)	UN	10,00								INSTALADO PARA ILUMINAÇÃO NA ARENA DE RODEIO.	10,00	10,00
5	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2026 8 HORAS/DIA												
5.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.7	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.8	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00								EQUIPE DE PLANTÃO EXPOACRE JURUÁ	6,00	6,00
5.9	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	6,00								UTILIZADO PARA PLANTÃO NAS NOITES DE EXPOACRE JURUÁ.	6,00	6,00
6	REMOÇÃO DOS MATERIAIS												
6.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN											

LEGENDA:

REP: REPETIÇÃO
COE1: COEFICIENTE
COE2: COEFICIENTE
DESC.: DESCONTO

COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO
LARG: LARGURA OU DIÂMETRO
ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

CREA - 22399 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP
Construtora: QUEIROZ & SANTOS LTDA



Clique aqui para ampliar a imagem




ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 3 - PLANTA ILUMINADA

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP
Construtora: QUEIROZ & SANTOS LTDA

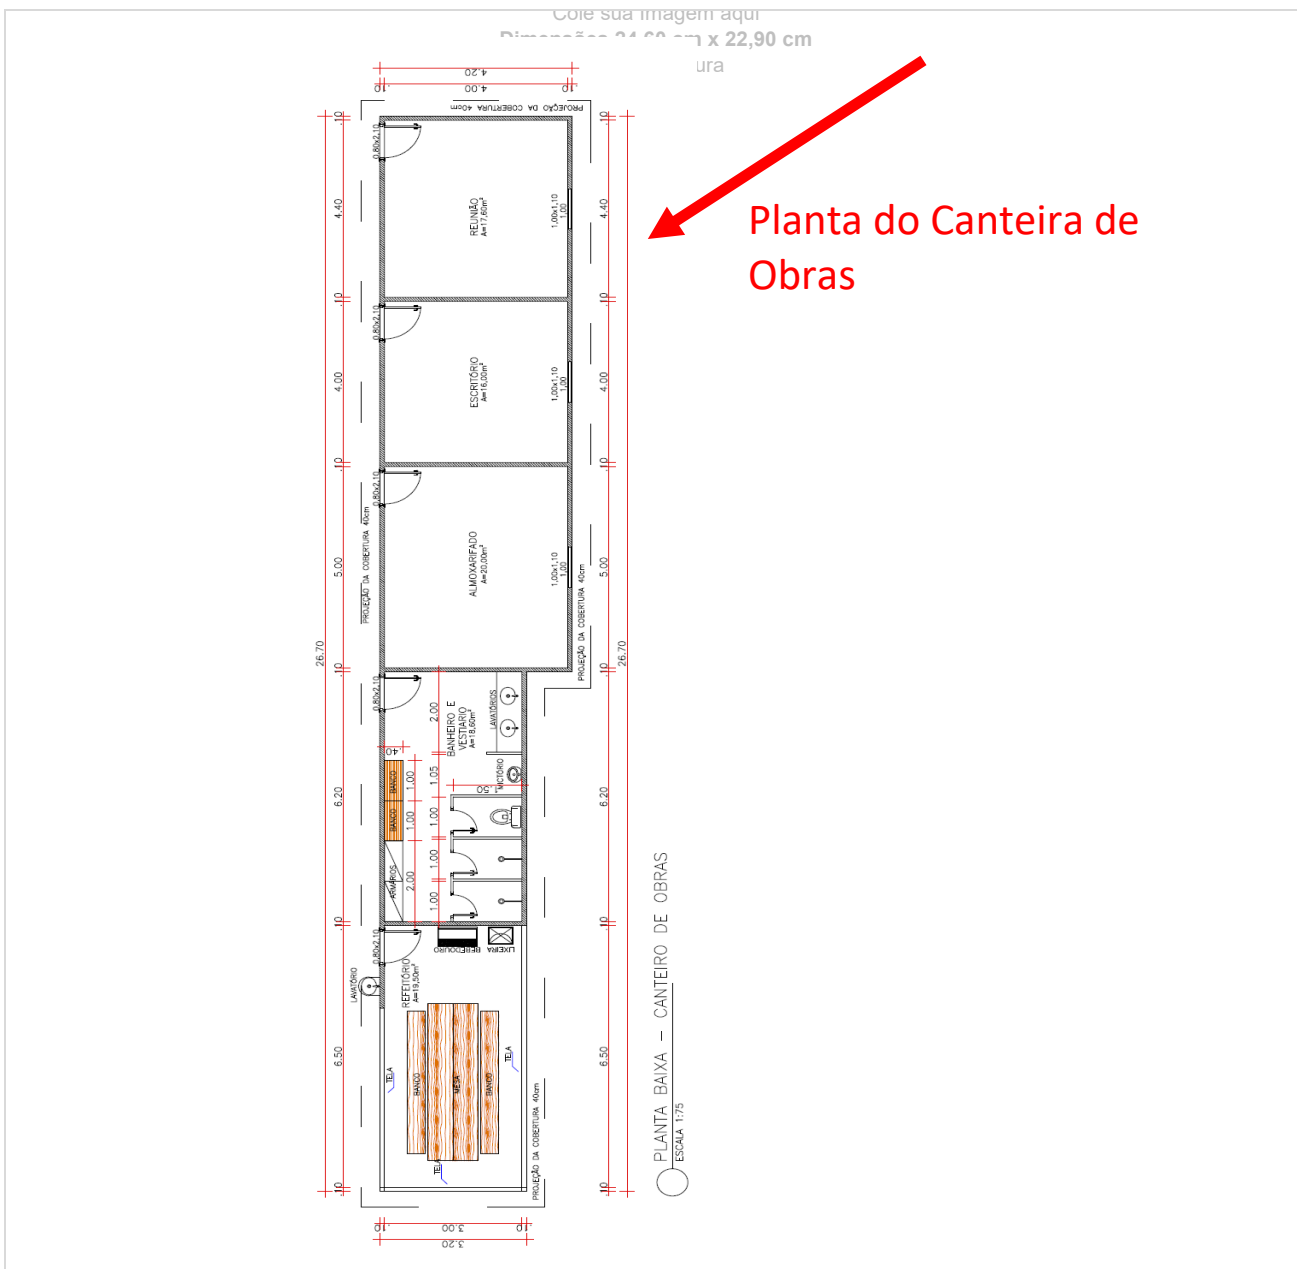

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

CREA - 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP

Construtora: QUEIROZ & SANTOS LTDA

02/06/2026

02/07/2026

EXECUÇÃO EXPIRADA

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO		TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	06/2026		%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA- 30 DIAS- 8 HORAS/DIA	23.612,91	5,88%	23.612,91	100,00%	5,88%	23.612,91
2	ART E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.526,19	1,13%	4.526,19	100,00%	7,01%	28.139,10
3	CANTEIRO DE OBRAS	44.876,96	11,17%	44.876,96	100,00%	18,18%	73.016,06
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	318.042,60	79,18%	318.042,60	100,00%	97,36%	391.058,66
5	EQUIPE DE PLANTÃO PARA EXPOACRE JURUÁ 2026 8 HORAS/DIA	9.137,84	2,28%	9.137,84	100,00%	99,64%	400.196,50
6	REMOÇÃO DOS MATERIAIS	1.462,50	0,36%	1.462,50	100,00%	100,00%	401.659,00
TOTAL NO PERÍODO				401.659,00	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		401.659,00	100,00%	401.659,00	100,00%		

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

CREA - 22399 D/AC



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**

Local: Arena do Juruá



Imagem 1

ITEM: 1.5 - INSTALAÇÃO DE PLACA DA OBRA

Local: Arena do Juruá



Imagem 2

ITEM: 3.1 - CANTEIRO OBRAS

Local: Arena do Juruá



Imagem 3

ITEM: 3.1 - CANTEIRO OBRAS

Local: Arena do Juruá



Imagem 4

ITEM: 3.1 - CANTEIRO OBRAS

Local: Arena do Juruá



Imagem 5

ITEM: 3.1 - CANTEIRO OBRAS

Local: Arena do Juruá



Imagem 6

ITEM: 3.1 - CANTEIRO OBRAS

Local: Arena do Juruá

Local: Arena do Juruá



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**

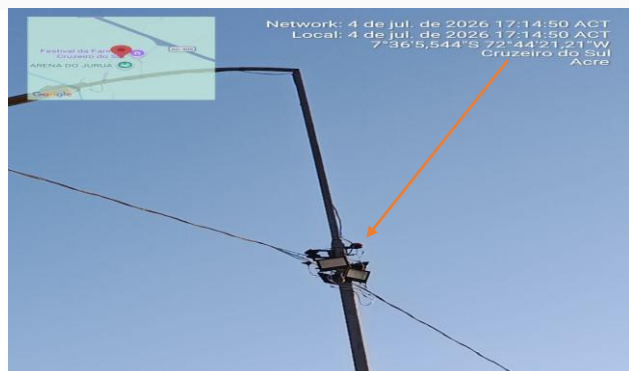


Imagem 7

ITEM: 4.1 - INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO



Imagem 8

ITEM: 4.1 - INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO

Local: Arena do Juruá



Imagem 9

ITEM: 4.2 - INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE

Local: Arena do Juruá



Imagem 10

ITEM: 4.3 - SERVIÇO DE HUINDALTO PARA IMPLANTAR POSTE

Local: Arena do Juruá



Imagem 11

ITEM: 4.4 - INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA

Local: Arena do Juruá



Imagem 12

ITEM: 4.4 - INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA

Local: Arena do Juruá



Local: Arena do Juruá





ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**



Imagem 13

ITEM: 4.5 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 600 W



Imagem 14

ITEM: 4.5 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 600 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 15

ITEM: 4.6 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 200 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 16

ITEM: 4.6 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 200 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 17

ITEM: 4.7 - INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO T


Local: Arena do Juruá



Imagem 18

ITEM: 4.7 - INSTALAÇÃO DE POSTE DUPLO T

Local: Arena do Juruá



Local: Arena do Juruá





ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**



Imagem 19

ITEM: 4.8 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA



Imagem 20

ITEM: 4.9 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 400 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 21

ITEM: 4.9 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 400 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 22

ITEM: 4.10 -INSTALAÇÃO DE REFLETOR 300 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 23

ITEM: 4.10 -INSTALAÇÃO DE REFLETOR 300 W

Local: Arena do Juruá

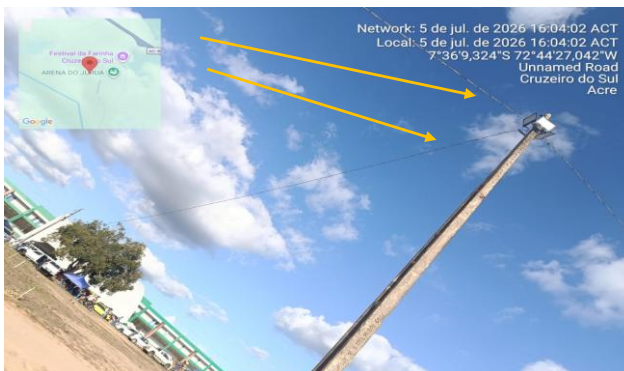



Imagem 24

ITEM: 4.11 - INSTALAÇÃO DE CABO TRIPLEX 16MM

Local: Arena do Juruá



Local: Arena do Juruá

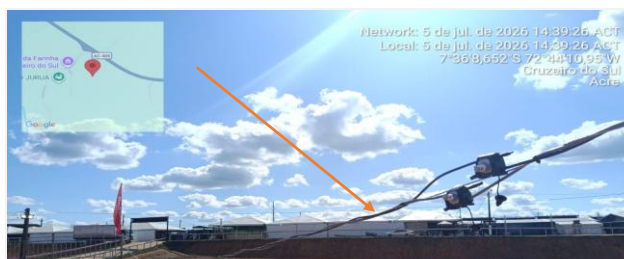



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**



Imagem 25

ITEM: 4.11 - INSTALAÇÃO DE CABO TRIPLEX 16MM

Local: Arena do Juruá

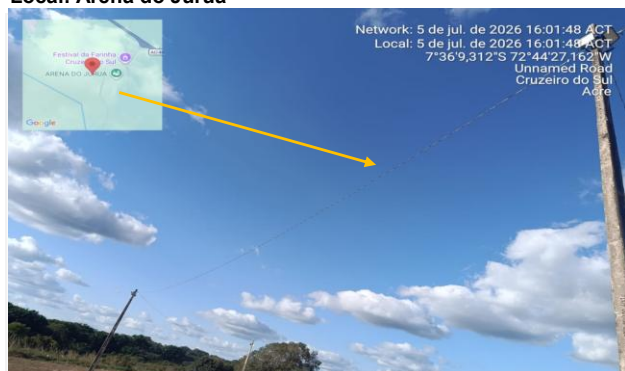


Imagem 27

ITEM: 4.11 - INSTALAÇÃO DE CABO TRIPLEX 16MM

Local: Arena do Juruá



Imagem 29

ITEM: 4.13 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR RGB 50 W

Local: Arena do Juruá

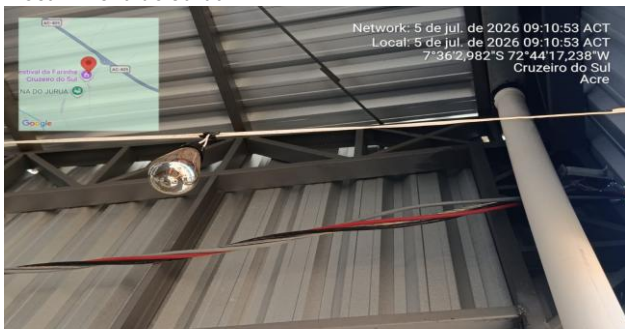


Imagem 26

ITEM: 4.11 - INSTALAÇÃO DE CABO TRIPLEX 16MM

Local: Arena do Juruá



Imagem 28

ITEM: 4.12 - INSTALAÇÃO DE CABO QUADRUPLIX 70MM

Local: Arena do Juruá



Imagem 30

ITEM: 4.14 - INSTALAÇÃO DE QUADRUPLIX 35MM

Local: Arena do Juruá





ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
ANEXO 5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP

Construtora: QUEIROZ & SANTOS LTDA



Imagem 31

ITEM: 4.14 - INSTALAÇÃO DE QUADRUPLIX 35MM



Imagem 32

ITEM: 4.15 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR 1000 W

Local: Arena do Juruá



Imagem 33

ITEM: 5-8 - EQUIPE DE PLANTÃO

Local: Arena do Juruá



Imagem 34

ITEM: 5-8 - EQUIPE DE PLANTÃO

Local: Arena do Juruá



Imagem 35

ITEM: 5.9 - PLANTÃO MUNCK

Local: Arena do Juruá



Imagem 36

Cole sua Imagem aqui
Dimensões 7 cm x 11 cm
altura x largura

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

CREA - 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 6 - JUSTIFICATIVA DE ATRASO

1 - Dados do Contrato

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**

Fonte de Recurso: **15000100 - RP**

Nº CT Construtora: **023/2026**

Fiscal da obra: **GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ**

Respons. Técnico: **JAILSON DOS SANTOS QUEIROZ**

2 - Justificativa para atraso de obra

Não houve atraso na obra.

3 - Providências a serem tomadas visando recuperar os dias de atraso

4 - Penalidades que serão impostas à empresa caso esta seja responsável pelo atraso

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

CREA - 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026



ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP

ANEXO 8 - AVALIAÇÃO

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.

Órgão Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP

Construtora:

QUEIROZ & SANTOS LTDA

Avaliação	Cronog.	Atend. Fisc.	Qualid.	Equipam.	Equipe	Segurança	Admin. Obra	Nota
1ª Medição	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00
2ª Medição								
3ª Medição								
4ª Medição								
5ª Medição								
6ª Medição								
7ª Medição								
8ª Medição								
9ª Medição								
10ª Medição								
11ª Medição								
12ª Medição								
13ª Medição								
14ª Medição								
15ª Medição								
16ª Medição								
17ª Medição								
18ª Medição								
19ª Medição								
20ª Medição								
21ª Medição								
22ª Medição								
23ª Medição								
24ª Medição								
25ª Medição								
26ª Medição								
							Média Final:	9,00
							Conceito:	Muito boa

Itens	Critério para Nota		
	Atende totalmente	Atende parcialmente	Não atende
1.0 Cronograma físico-financeiro	2	1	0
2.0 Atendimento a fiscalização	2	1	0
3.0 Qualidade dos serviços	2	1	0
4.0 Equipamentos, insumos e técnica	2	1	0
5.0 Equipe técnica	2	1	0
6.0 Segurança do trabalho	2	1	0
7.0 Administração e instalação da obra	2	1	0

Conceito

Ruim -	0,00 a 4,99	Boa -	7,00 a 8,99
Razoável -	5,00 a 6,99	Muito Boa -	9,00 a 10,00

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ

CREA - 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026




ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP
AVANÇO ACUMULADO FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto do Contrato: **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Reforma e Adequação do Espaço Arena do Juruá, para realização da EXPOACRE JURUÁ 2026 no município de Cruzeiro do Sul/AC, nos termos da planilha orçamentária em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, LOTE II.**

Órgão Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICA - SEOP**

Construtora: **QUEIROZ & SANTOS LTDA**

Acumulado Planejado x Acumulado Realizado

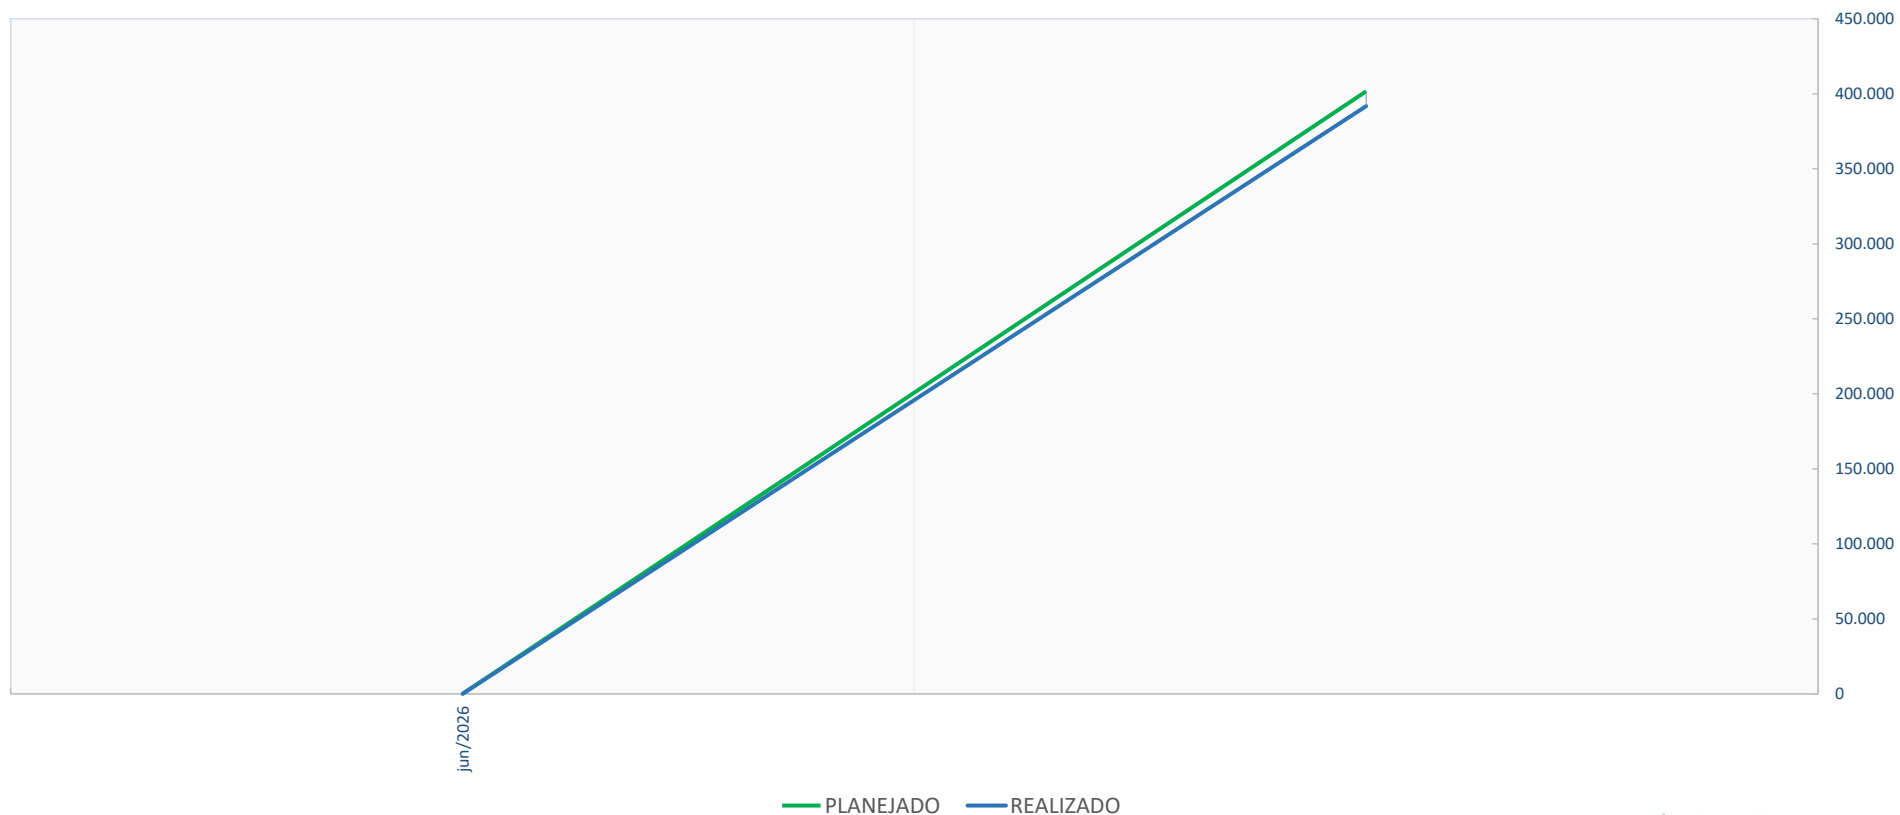

Gutierly Antonio Gouveia Diniz

ENGº ELETRICISTA - GUTIERLY ANTONIO GOUVEIA DINIZ
CREA - 22399 D/AC

Rio Branco - Acre, 17 de julho de 2026
